

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse: 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1

CP - Ville : 53000 LAVAL

Référence client : __00009000010000300024_

Date du repérage : 13/06/2017

Désignation : Appartement n° 24 de type 4 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.









Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe: Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du	
nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

Α	Design	ation de l'immeuble	B Propriétaire / Donneur d'ordre					
Adresse :		143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 53000 LAVAL	Propriétaire : HABITAT	O.P.H. MAYENNE	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT			
Référence client : Désignation :		_00009000010000300024_ Appartement n° 24 de type 4 situé au 03 ème étage		RUE AUGUSTE CS 62039 53020 EX 9	Adresse: 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9			
Date de cons	truction :							









C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Nom : PALLUEL Matthieu

Accompagnateur : D.JOUSSELIN (0 800 400 100)

Date de repérage 13/06/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016 norme NF 46-020

D

Nom:

Date du rapport : 05/07/2017 A Riorges, le 05/07/2017

MORA Denis

Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

Pièces visitées

Liste des locaux visités :									
Appartement n°24 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)								
Appartement n°24 - Vol 3 (W.C)	Appartement n°24 - Vol 4 (Cellier)								
Appartement n°24 - Vol 5 (Cuisine)	Appartement n°24 - Vol 6 (Chambre 3)								
Appartement n°24 - Vol 7 (Séjour)	Appartement n°24 - Vol 8 (Chambre 2)								
Appartement n°24 - Vol 9 (Chambre 1)									





Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	Н	Objectif de la mission
Ensemble du	u logement (garage et balcon non compris)	contenant de	a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits e l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°24	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cellier) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°24	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cellier) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1)	
Revêtement de sol	Appartement n°24	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cellier) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1)	
Revêtement de mur	Appartement n°24	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°24	Vol 5 (Cuisine)	





K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L

Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes





Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Travaux





Conclusions

Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification				
Vol 5 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		menuiseries PVC				
Vol 6 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		menuiseries PVC				
Vol 7 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		menuiseries PVC				
Vol 8 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		menuiseries PVC				
Vol 9 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		menuiseries PVC				
Vol 2 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		menuiseries PVC				
Vol 5 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.				
Vol 6 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.				
Vol 7 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.				
Vol 8 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
1/ 10 /01 1 1)	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.				
Vol 9 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
\/-14 (E(-/-)	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.				
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
\/-I.0.(0DD)	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.				
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
\/-\ \ (\A\ \O\)	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.				
Vol 3 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
\(\alpha \) \(\begin{align*} \text{Val.F.} \(\O_{\alpha} \) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.				
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur				
		l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et				
\/al 0 (0DD)	Manatin dannaladitd	équipements divers				
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur				
		l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et				
Val F (Ovisina)	la inta	équipements divers				
Vol 5 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client				
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client				
Vol 9 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client				
Vol 8 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client				
Vol 7 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client				
Vol 6 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client				

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26



Travaux





Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S27

Q

Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 11 logements réalisés dans le groupe 9 :

Matériaux amiantés :

- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 colle de plinthe est amiantée sur les 12 prélevées, le prélèvement positif ayant été réalisé sur une plinthe collée sur des parois dont les enduits sont revenus amiantés il pourrait s'agir d'une pollution, des prélèvement complémentaires pourront être réalisés afin de confirmer ou non les résultats obtenus dans ce logement.
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les cloisons des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides est amianté sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduit plâtre sur les cloisons des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés

L'ensemble des prélèvements d'enduits plâtres revenus amiantés ont été prélevés dans deux logements, logement 3 (rapport 002LQ001327) et logement 4 (rapport 002LQ001328). Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans ces logements afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus, à défaut l'ensembles des cloisons, porteurs et plafonds des pièces sèches et humides devront être considérés comme amiantés. Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R

Locaux ou partie de locaux non visités







Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Appartement n°24	Moyen investigation non mis a disposition	Volume sous la baignoire Impossible de démonter le tablier sans l'endommager.

Note: En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.









Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits
- Plafond et faux-plafonds
- Revêtement de sol
- Revêtement de mur
- Equipements divers et accessoires



Amiante Travaux





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action menée				Laboratoire		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°24	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S22							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°24	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	13			13 - 1 - 13 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°24	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	13			13 - 1 - 13 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 5 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	14							Aucun
n°24											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	14							Aucun
n°24											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 9 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	14							Aucun
n°24											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 8 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	14							Aucun
n°24											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 7 (Séjour)	Radiateurs	Joints	14							Aucun
n°24											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 6 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	14							Aucun
n°24											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°24	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 33 n°1 - 1 - 002LQ0013 33 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LQ0013 33 n°1 - 1 - 002LQ0013 33 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 33 n°2 - 1 - 002LQ0013 33 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 33 n°2 - 1 - 002LQ0013 33 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 33 n°7 - 1 - 002LQ0013 33 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 9 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ0013 33 n°7 - 1 - 002LQ0013 33 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P8	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 33 n°8 - 1 - 002LQ0013 33 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P8 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LQ0013 33 n°8 - 1 - 002LQ0013 33 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'act	tion menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 4 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un		002LQ0013	P10	Enduit compact gris +	Négatif	Négatif sur
n°24			(porteur)		prélevement		33 n°10 - 1		peinture non séparable		analyse
							-				
							002LQ0013				
							33 n°10 - 2				
Appartement	Vol 3 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier	P13	Réalisation d'un		002LQ0013	P13	Matériau beige en vrac +	Négatif	Négatif sur
n°24			(Menuiseries bois)		prélevement		33 n°13 - 1		peintures multiples non		analyse
							-		séparable		
							002LQ0013				
A	V-14 (E-4-(-)	Menuiseries	1 1 1 11/1 1 / 11/1	S21			33 n°13 - 2				h14 425
Appartement n°24	Vol 1 (Entrée)	ivieriuiseries	Joints d'étanchéïté	321							Négatif sur document cf.
11 24			(porte d'entrée)								prélèvement
											n°10 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											5
Appartement	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°24											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
			DV0 4/40/4	14			14 4				PVC
	Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	l1			l1 - 1				Aucun
n°24											prélèvement réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
											FVC







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée cosant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref I				Laboratoire		Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°24	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries
											PVC
n°24	Vol 8 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°24	Vol 9 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	l1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°24	Vol 2 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

					Descriptif de l'ac	ction menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Canalysian
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion Négatif sur
Appartement	Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un		002LQ0013	P3	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°24			(plafonds pièces		prélevement		33 n°3 - 1 -		vrac		analyse
			humides)				002LQ0013				
							33 n°3 - 2				
Appartement	Vol 3 (W.C) - Vol 5	Plafonds	Enduit plâtre	S5 - S6	Sondage et extension de		002LQ0013	P3	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°24	(Cuisine)		(plafonds pièces		la zone homogène du		33 n°3 - 1 -		vrac		analyse
			humides)		prélèvement P3		002LQ0013				
							33 n°3 - 2				
Appartement	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un		002LQ0013	P6	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°24			(plafonds pièces		prélevement		33 n°6 - 1 -		vrac		analyse
			sèches)				002LQ0013				
							33 n°6 - 2				
Appartement	Vol 9 (Chambre 1) -	Plafonds	Enduit plâtre	S13 - S14	Sondage et extension de		002LQ0013	P6	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°24	Vol 8 (Chambre 2) -		(plafonds pièces	- S15 -	la zone homogène du		33 n°6 - 1 -		vrac		analyse
	Vol 7 (Séjour) - Vol 6		sèches)	S16	prélèvement P6		002LQ0013				
	(Chambre 3)						33 n°6 - 2				
Appartement	Vol 4 (Cellier)	Plafonds	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un		002LQ0013	P11	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur
n°24			(plafond)		prélevement		33 n°11 - 1				analyse
							-				
							002LQ0013				
							33 n°11 - 2				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P4	Réalisation d'un			P4	Colle beige + papier non	Négatif	Négatif sur
n°24			(faïence blanche		prélevement			Phase 1	séparable + peintures		analyse
			sdb)						multiples non séparable		
Appartement	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P5	Réalisation d'un		002LQ0013	P5	Colle grise + couche	Négatif	Négatif sur
n°24			(plinthe)		prélevement		33 n°5 - 1 -	Phase 1	plâtreuse blanche non		analyse
							002LQ0013		séparable		
							33 n°5 - 2				







				Descriptif de l'action menée		Laboratoire			Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°24	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0013 33 n°5 - 1 - 002LQ0013 33 n°5 - 2	P5 Phase 1	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P9	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 33 n°9 - 1 - 002LQ0013 33 n°9 - 2	Phase 1	Colle grise + joint cassant beige non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LQ0013 33 n°9 - 1 - 002LQ0013 33 n°9 - 2	Phase 1	Colle grise + joint cassant beige non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°24	Vol 4 (Cellier)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P12	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 33 n°12 - 1 - 002LQ0013		Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S23			33 n°12 - 2				Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132







				Descriptif de l'action menée			Laboratoire				Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S23							Négatif sur
n°24											document cf.
											prélèvement
											n°15 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											5
Appartement	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S23							Négatif sur
n°24											document cf.
											prélèvement
											n°15 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											5
	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S23							Négatif sur
n°24											document cf.
											prélèvement
											n°15 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											5





					Descriptif de l'acti	on menée		Laboratoire Ref Prél. Descriptif Résultat			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°24	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S23							Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°24	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P14	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 33 n°14 - 1 - 002LQ0013 33 n°14 - 2	Phase 2	Colle grise + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002LQ0013 33 n°14 - 1 - 002LQ0013 33 n°14 - 2	Phase 2	Colle grise + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26	Résalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132







					Descriptif de l'action	on menée		Laboratoire Descriptif Résultat		Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°24	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°24	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°24	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132





					Descriptif de l'action	on menée		Laboratoire Descriptif Résultat		Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°24	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°24	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S27	Résalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°24	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S27	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S27						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°24	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S27	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S27						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°24	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S27	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S27						9 Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°24	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S27	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S27						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°24	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	12			12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.









					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°24	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	12			l2 - 1				Aucun prélèvement
			+ ragréage								réalisé à la
			supplémentaire								demande du client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Annartement	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°24	(00)00.7		avec sous-couche								prélèvement
			+ ragréage								réalisé à la
			supplémentaire								demande du
		- Cuppellion and								client sur les	
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			I2 - 1				Aucun
n°24			avec sous-couche								prélèvement
			+ ragréage								réalisé à la
			supplémentaire								demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
Annortoment	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	l 4a mlaatinaa	12			I2 - 1				d'origines. Aucun
Appartement n°24	voi 9 (Chambre 1)	Revelement de soi	Lés plastiques avec sous-couche	12			12 - 1				prélèvement
11 24			+ ragréage								réalisé à la
			supplémentaire								demande du
			Supplementane								client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°24	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	12			12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°24	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	12			12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°24	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	12			12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.







ANNEXE: Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
Арр	partement n°24	Appartement n°24 - Plan de repérage - Actions menées
Арр	partement n°24	Appartement n°24 - MPCA Toutes catégories confondues

Iravaux

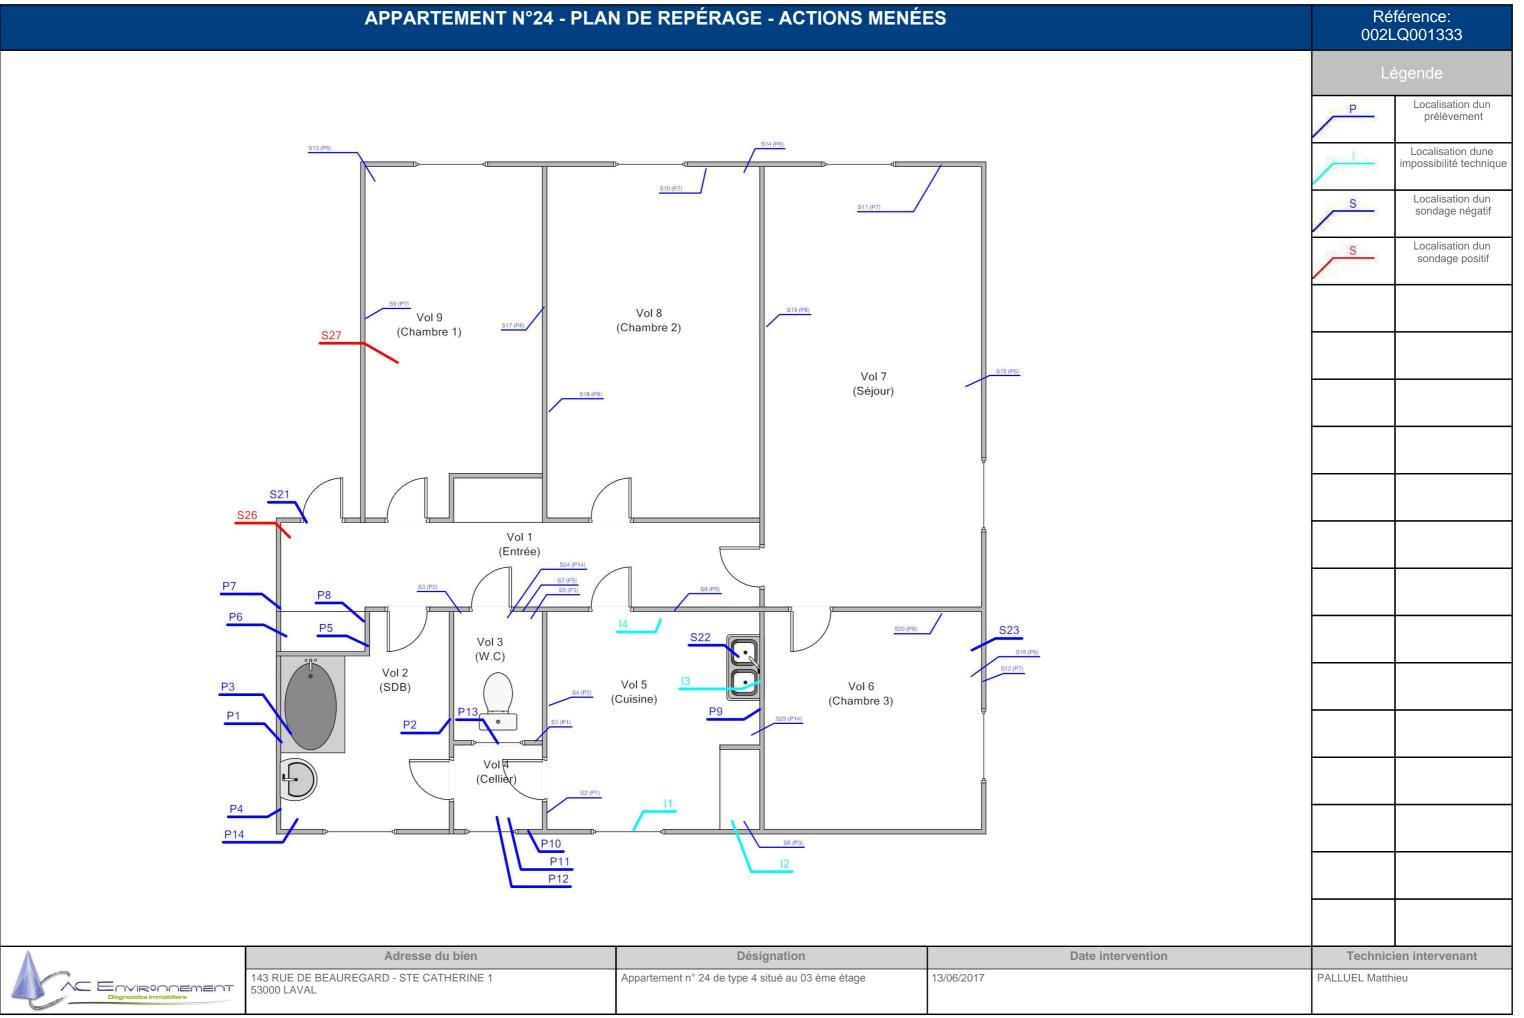

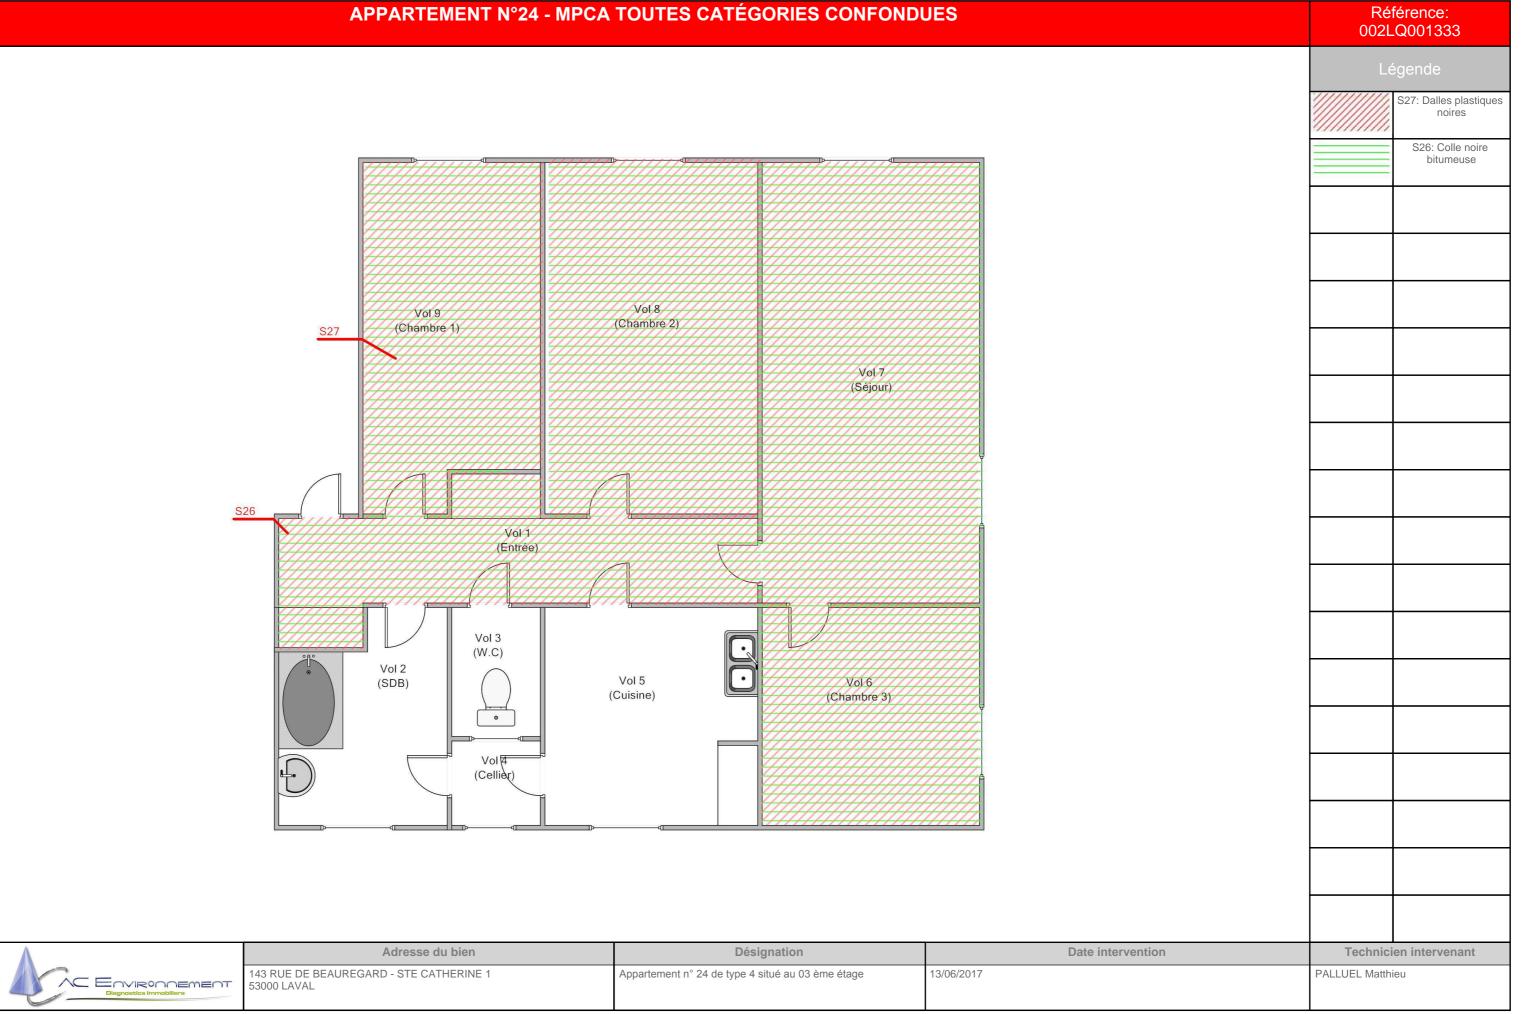



ANNEXE: Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001333 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°24 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°24 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°24 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°24 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°24 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°24 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°24 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°24 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°24 - Vol 4 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°24 - Vol 4 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°24 - Vol 4 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°24 - Vol 4 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°24 - Vol 4 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°24 - Vol 4 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°24 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°24 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001333 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°24 - Vol 5 (Cuisine)	I1
	Appartement n°24 - Vol 5 (Cuisine)	12
	Appartement n°24 - Vol 5 (Cuisine)	13
	Appartement n°24 - Vol 5 (Cuisine)	13







002LQ001333 n°1 - 1 (P1)



002LQ001333 n°2 - 1 (P2)



002LQ001333 n°3 - 1 (P3)



002LQ001333 n°1 - 2 (P1)



002LQ001333 n°2 - 2 (P2)



002LQ001333 n°3 - 2 (P3)





002LQ001333 n°5 - 1 (P5)



002LQ001333 n°6 - 1 (P6)



002LQ001333 n°7 - 1 (P7)



002LQ001333 n°5 - 2 (P5)



002LQ001333 n°6 - 2 (P6)



002LQ001333 n°7 - 2 (P7)





002LQ001333 n°8 - 1 (P8)



002LQ001333 n°9 - 1 (P9)



002LQ001333 n°10 - 1 (P10)



002LQ001333 n°8 - 2 (P8)



002LQ001333 n°9 - 2 (P9)



002LQ001333 n°10 - 2 (P10)







002LQ001333 n°11 - 1 (P11)



002LQ001333 n°12 - 1 (P12)



002LQ001333 n°13 - 1 (P13)



002LQ001333 n°11 - 2 (P11)



002LQ001333 n°12 - 2 (P12)



002LQ001333 n°13 - 2 (P13)







002LQ001333 n°14 - 1 (P14)



11 - 1



I3 - 1



002LQ001333 n°14 - 2 (P14)



I2 - 1



13 - 2





ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Reférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	
P4 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	
P5 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac	Appartement n°24 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°24 - Vol 1 (Entrée)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°24 - Vol 1 (Entrée)	
P9 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + joint cassant beige non séparable + peinture non séparable	Appartement n°24 - Vol 5 (Cuisine)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + peinture non séparable	Appartement n°24 - Vol 4 (Cellier)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac	Appartement n°24 - Vol 4 (Cellier)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac -	Appartement n°24 - Vol 4 (Cellier)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable	Appartement n°24 - Vol 3 (W.C)	
P14 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + joint cassant gris non séparable	Appartement n°24 - Vol 2 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr Accréditation n° 1-5967



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60183 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client: AC ENVIRONNEMENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES
Réf. Commande ITGA: IT0717-60183
Réf. Commande Client: 002LQ001333

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

mecaniqu

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s):

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client :	_000090001000030002 143 RUE DE BEAUREGAF - 53000 LAVAL Appartement n° 24 de typ étage	PD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49143
Réf échantillon client : 002LQ001333001 / Parc et enduits / Murs et clois (porteur pièces humides) (SDB)		ons / Enduit plâtre	Description ITGA	c: Enduit plâ	itreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux bla	nc en vrac +	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -
peinture non sépara	able				
Réf dossier client :0000900001000030002 143 RUE DE BEAUREGAI - 53000 LAVAL Appartement n° 24 de typ étage		PD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49144
Réf échantillon client : 002LQ001333002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces humides) / Vol 2 (SDB)			Description ITGA	: Enduit plâ	itreux blanc en vrac
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac		META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60183 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction a	nalysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante		
Réf dossier client :000090001000300024_			Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49145		
Réf échantillon client :	chantillon client : 002LQ001333003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plafonds pièces humides) / Vol 2 (SDB)			: Enduit plâ	itreux blanc en vrac		
▶ Enduit plâtreux bland	en vrac	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -		
Réf dossier client :00009000010000300024_ 143 RUE DE BEAUREGARD - - 53000 LAVAL Appartement n° 24 de type 4 s étage		D - STE CATHERINE 1 e 4 situé au 03 ème					
Réf échantillon client :	tement de mur / e de carrelage 2	Description ITGA	: Colle beig	ge / Papier / Peintures multiples / Carrelage			
Colle beige + papier ı	non séparable +	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -		
peintures multiples n Carrelage	on séparable				Non analysé		
Réf dossier client :00009000010000300024_ 143 RUE DE BEAUREGARD - - 53000 LAVAL Appartement n° 24 de type 4 étage		D - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49147		
Réf échantillon client :	002LQ001333005 / Revê Revêtement de mur / Coll (plinthe) / Vol 2 (SDB)		Description ITGA	: Colle grise	e / Couche plâtreuse blanche / Carrelage		
Colle grise + couche	plâtreuse	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -		
blanche non séparab Carrelage	le				Non analysé		
Réf dossier client :0000900010000300024_ 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 24 de type 4 situé au 03 ème étage		Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49148			
Réf échantillon client :	nd et faux-plafonds / lafonds pièces	Description ITGA	: Enduit plâ	itreux blanc en vrac			
▶ Enduit plâtreux bland	en vrac	META	2	30/06/2017	Amiante non détecté / -		

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60183 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction a	nalysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante	
Réf dossier client :000090001000300024_ 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 24 de type 4 situé au 03 ème étage			Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49149	
Réf échantillon client :				: Enduit plâ	àtreux blanc en vrac / Peinture	
Enduit plâtreux blanc peinture non séparab		МЕТА	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :00009000010000300024_			Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49150	
Réf échantillon client : 002LQ001333008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)			Description ITGA	: Enduit plâ	àtreux blanc en vrac / Peinture	
Enduit plâtreux blanc peinture non séparab		МЕТА	2	30/06/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	_0000900001000030002 143 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 24 de typ étage	D - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49151	
Réf échantillon client :	002LQ001333009 / Revê Revêtement de mur / Coll· (faïence blanche cuisine) / (Cuisine)	e de carrelage	Description ITGA	: Colle grise	e / Joint cassant beige / Peinture / Carrelage	
▶ Colle grise + joint cas séparable + peinture	=	МЕТА	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -	
Carrelage					Non analysé	
Réf dossier client :0000900010000300024_		D - STE CATHERINE 1	Réf échantillon ITGA : IT071706-49152			
Réf échantillon client : 002LQ001333010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (porteur) / Vol 4 (Cellier)			Description ITGA : Enduit compact gris / Peinture			
▶ Enduit compact gris + séparable	peinture non	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60183 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction a	nnalysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante		
Réf dossier client :	_0000900001000030002 143 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 24 de typ étage	RD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49153		
Réf échantillon client :	002LQ001333011 / Plafo Plafonds / Enduit ciment ((Cellier)	Description ITGA : Enduit gris en vrac					
▶ Enduit gris en vrac		META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -		
Réf dossier client :00009000010000300024_ 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 24 de type 4 situé au 03 ème étage			Réf échantillon ITGA : IT071706-49154				
Réf échantillon client :	002LQ001333012 / Revê Revêtement de sol / Chap ciment) / Vol 4 (Cellier)		Description ITGA	: Matériau	gris en vrac		
Matériau gris en vra	С	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -		
Réf dossier client :	_0000900001000030002 143 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 24 de typ étage	RD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49155		
Réf échantillon client :	002LQ001333013 / Paro et enduits / Menuiseries / (Menuiseries bois) / Vol 3 (W.C)		Description ITGA	: Matériau	beige en vrac / Peintures multiples		
 Matériau beige en vi multiples non sépara 	•	МЕТА	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -		
Réf dossier client :00009000010000300024_ 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 24 de type 4 situé au 03 ème étage		Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49156			
Réf échantillon client : 002LQ001333014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (SDB)			Description ITGA : Colle grise / Joint cassant gris / Carrelage				
Carrelage					Non analysé		
Colle grise + joint ca	ssant gris non	META	2	30/06/2017	Amiante non détecté / -		
