Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LES GRANDS PRES
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_0005500007_
Date du repérage :	10/04/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Présence d'amiante	Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	LES GRANDS PRES 53600 EVRON
Référence client :	_0005500007_
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	PALLUEL Matthieu
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)
Date de repérage	10/04/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 3879 V2
Délivré le : 28/04/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 26/04/2017
A Riorges, le 26/04/2017



Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

CAGE ESCALIER 37 - Vol 1 (Sas 1)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 2 (Extérieur 1)
CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 4 (Extérieur 2)
CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 6 (PC R+1)
CAGE ESCALIER 37 - Vol 7 (Pc r+ 3)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 8 (Pc rdc 2)
CAGE ESCALIER 39 - Vol 9 (Pc r+ 2)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 10 (Pc r+ 4)
Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Sous sol - Vol 12 (Local poubelle 1)
Sous sol - Vol 14 (Local poubelle 2)	Sous sol - Vol 16 (Vs 1)
Sous sol - Vol 17 (Vs 2)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)
Masse - Vol 20 (Toiture)	Masse - Vol 21 (Masse)
Combles cage 39 - Vol 22 (Comble 2)	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)
Pignon gauche - Vol 24 (Pignon 1)	Façade arrière - Vol 25 (Façade 2)
Pignon droit - Vol 26 (Pignon 2)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment.

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	CAGE ESCALIER 37	Vol 1 (Sas 1) - Vol 2 (Extérieur 1) - Vol 5 (Pc rdc 1) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	
Plafond et faux-plafonds	CAGE ESCALIER 37	Vol 1 (Sas 1) - Vol 5 (Pc rdc 1) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	
Revêtement de mur	CAGE ESCALIER 37	Vol 1 (Sas 1) - Vol 5 (Pc rdc 1) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	
Revêtement de sol	CAGE ESCALIER 37	Vol 1 (Sas 1) - Vol 5 (Pc rdc 1) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	
Façades	CAGE ESCALIER 37	Vol 2 (Extérieur 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	CAGE ESCALIER 39	Vol 3 (Sas 2) - Vol 4 (Extérieur 2) - Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4)	
Plafond et faux-plafonds	CAGE ESCALIER 39	Vol 3 (Sas 2) - Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4)	
Revêtement de mur	CAGE ESCALIER 39	Vol 3 (Sas 2) - Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4)	

Revêtement de sol	CAGE ESCALIER 39	Vol 3 (Sas 2) - Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4)	
Façades	CAGE ESCALIER 39	Vol 4 (Extérieur 2)	
Conduits, canalisations et équipements	Sous sol	Vol 11 (PC R-1) - Vol 12 (Local poubelle 1) - Vol 14 (Local poubelle 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol	Vol 11 (PC R-1) - Vol 12 (Local poubelle 1) - Vol 14 (Local poubelle 2) - Vol 16 (Vs 1) - Vol 17 (Vs 2)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol	Vol 11 (PC R-1) - Vol 12 (Local poubelle 1) - Vol 14 (Local poubelle 2) - Vol 16 (Vs 1) - Vol 17 (Vs 2)	
Revêtement de sol	Sous sol	Vol 11 (PC R-1) - Vol 12 (Local poubelle 1) - Vol 14 (Local poubelle 2)	
Conduits, canalisations et équipements	Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	
Plafond et faux-plafonds	Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	
Toiture et étanchéité	Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	
Toiture et étanchéité	Masse	Vol 20 (Toiture)	
Revêtement de sol	Masse	Vol 21 (Masse)	
Voies et réseaux divers	Masse	Vol 21 (Masse)	
Conduits, canalisations et équipements	Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	
Plafond et faux-plafonds	Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	
Toiture et étanchéité	Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	
Façades	Façade avant	Vol 23 (Façade 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade avant	Vol 23 (Façade 1)	
Revêtement de sol	Façade avant	Vol 23 (Façade 1)	
Façades	Pignon gauche	Vol 24 (Pignon 1)	
Façades	Façade arrière	Vol 25 (Façade 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade arrière	Vol 25 (Façade 2)	
Façades	Pignon droit	Vol 26 (Pignon 2)	

K — Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L — Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 11 (PC R-1)	Panneaux vissés	Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs
Vol 12 (Local poubelle 1)	Panneaux vissés	Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs
Vol 14 (Local poubelle 2)	Panneaux vissés	Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs
Vol 10 (Pc r+ 4)	sky dome	Impossibilité d'acceder à la menuiserie sans échaffaudage
Vol 7 (Pc r+ 3)	sky dome	Impossibilité d'acceder à la menuiserie sans échaffaudage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 3 (Sas 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002FH002020 n°4
Vol 8 (Pc rdc 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002FH002020 n°4
Vol 9 (Pc r+ 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002FH002020 n°4
Vol 10 (Pc r+ 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002FH002020 n°4
Vol 1 (Sas 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002FH002020 n°4
Vol 5 (Pc rdc 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002FH002020 n°4
Vol 6 (PC R+1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002FH002020 n°4
Vol 7 (Pc r+ 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002FH002020 n°4
Vol 11 (PC R-1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	P9
Vol 12 (Local poubelle 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	P9
Vol 14 (Local poubelle 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	P9
Vol 19 (Comble 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S107
Vol 19 (Comble 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S108
Vol 19 (Comble 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S109
Vol 19 (Comble 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S110
Vol 19 (Comble 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S111
Vol 19 (Comble 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S112
Vol 22 (Comble 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S121
Vol 22 (Comble 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S122
Vol 22 (Comble 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S123
Vol 22 (Comble 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S124
Vol 22 (Comble 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S125
Vol 22 (Comble 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S126

Q Réserves / Commentaires

Cartographie amiante LES GRAND PRES / EVRON / Groupe 55 :

Liste des bâtiments concernés :

- Bâtiment 2 / 31 RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 3 / 33 et 35 RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 4 / 2 PROMENADE GRANDS PRES
- Bâtiment 5 / 4 PROMENADE GRANDS PRES
- Bâtiment 6 / 6 PROMENADE GRANDS PRES
- Bâtiment 7 / 37 et 39 RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 8 / 20, 22, 24, et 26, RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 9 / 18 RUE DU MONTAIGU

Interprétation des résultats :

- Colle des plinthes intérieures :
3 des 8 colles de plinthes intérieures sont revenues amiantées. Il est nécessaire de réaliser des prélèvements complémentaires sur les colles revenues non amiantées pour confirmer ou non les premiers résultats obtenus. (Bâtiments 3 / 4 / 5 / 8 / 9)

- Joint entre panneaux fibralith vissés :
2 des 8 joints entre panneaux fibralith au sous-sol sont revenus amiantés. Au vu de l'incohérence des résultats obtenus, des prélèvements complémentaires sont nécessaires afin de cartographier avec précisions les joints amiantés

- Calorifugeage :
Sur l'ensemble des calorifugeages prélevés, un seul est revenu amianté. Le prélèvement revenu amianté ayant été réalisé à proximité des joints entre panneaux fibralith amianté on suppose qu'il s'agit d'une pollution. Des analyses complémentaires devront être réalisées afin de confirmer l'hypothèse de la pollution.
- Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.
Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :
Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.
Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.
Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.
Les matériaux présents sous le bardage bois présent en façade.
Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.
Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.
Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées…)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sous sol - Vol 13 (Local commun 1)	Moyen investigation non mis a disposition	Clé non fournie
Vol 16 (Vs 1) - Sous sol	Risque sanitaire ou physique avéré	Visite non exhaustive du local, repérage depuis la trappe
Vol 20 (Toiture) - Masse	Moyen investigation non mis a disposition	Visite non exhaustive du volume Inaccessible sans nacelle
Sous sol - Vol 15 (Local commun 2)	Moyen investigation non mis a disposition	Clé non fournie
Sous sol - Vol 18 (Local commun 3)	Moyen investigation non mis a disposition	Clé non fournie
Vol 17 (Vs 2) - Sous sol	Risque sanitaire ou physique avéré	Visite non exhaustive du local, repérage depuis la trappe

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 11 (PC R-1)	Conduit eau	Calorifugeage	P15	Réalisation d'un prélevement	Laine marron	002FH002020-1 n°15 - 1 - 002FH002020-1 n°15 - 2	P15	Matériau fibreux multicolore avec poussières + matériau fibreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1) - Vol 14 (Local poubelle 2) - Vol 12 (Local poubelle 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P15 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Laine marron	002FH002020-1 n°15 - 1 - 002FH002020-1 n°15 - 2	P15	Matériau fibreux multicolore avec poussières + matériau fibreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1)	Conduit eau	Calorifugeage	P16	Réalisation d'un prélevement	Enduit, blanc	002FH002020-1 n°16 - 1 - 002FH002020-1 n°16 - 2	P16	Matériau noir en mousse + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1) - Vol 12 (Local poubelle 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P16 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Enduit, blanc	002FH002020-1 n°16 - 1 - 002FH002020-1 n°16 - 2	P16	Matériau noir en mousse + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S107	Résalisation d'un sondage		S107 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S108	Résalisation d'un sondage		S108 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S109	Résalisation d'un sondage		S109 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S110	Résalisation d'un sondage		S110 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S111	Résalisation d'un sondage		S111 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S112	Résalisation d'un sondage		S112 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S121	Résalisation d'un sondage		S121 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S122	Résalisation d'un sondage		S122 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S123	Résalisation d'un sondage		S123 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S124	Résalisation d'un sondage		S124 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S125	Résalisation d'un sondage		S125 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S126	Résalisation d'un sondage		S126 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 39	Vol 4 (Extérieur 2)	Murs	Enduit ciment	P5	Réalisation d'un prélevement		002FH002020 n°5 - 1 - 002FH002020 n°5 - 2	002FH002020 n°5	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 2 (Extérieur 1)	Murs	Enduit ciment	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002FH002020 n°5 - 1 - 002FH002020 n°5 - 2	002FH002020 n°5	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 23 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S127	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002FH002020 n°5 - 1 - 002FH002020 n°5 - 2	002FH002020 n°5	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon gauche	Vol 24 (Pignon 1)	Murs	Enduit ciment	S128	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002FH002020 n°5 - 1 - 002FH002020 n°5 - 2	002FH002020 n°5	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 25 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	S129	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002FH002020 n°5 - 1 - 002FH002020 n°5 - 2	002FH002020 n°5	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 26 (Pignon 2)	Murs	Enduit ciment	S130	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002FH002020 n°5 - 1 - 002FH002020 n°5 - 2	002FH002020 n°5	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 23 (Façade 1)	Murs	Enduits projetés	P43	Réalisation d'un prélevement	beige	002FH002020-1 n°43 - 1 - 002FH002020-1 n°43 - 2	P43	Enduit gris + matériau beige hétérogène non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 25 (Façade 2)	Murs	Enduits projetés	S131	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P43	beige	002FH002020-1 n°43 - 1 - 002FH002020-1 n°43 - 2	P43	Enduit gris + matériau beige hétérogène non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 25 (Façade 2)	Appui de fenêtre	enduits ciment	P44	Réalisation d'un prélevement		002FH002020-1 n°44 - 1 - 002FH002020-1 n°44 - 2	P44	Enduit compact gris hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 25 (Façade 2)	Appui de fenêtre	enduits ciment	P44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P44		002FH002020-1 n°44 - 1 - 002FH002020-1 n°44 - 2	P44	Enduit compact gris hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 23 (Façade 1)	Appui de fenêtre	enduits ciment	S132	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P44		002FH002020-1 n°44 - 1 - 002FH002020-1 n°44 - 2	P44	Enduit compact gris hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 24 (Pignon 1)	Bardages	Plaques fibres	P46	Réalisation d'un prélevement	bardage + isolation	002FH002020-1 n°46 - 1 - 002FH002020-1 n°46 - 2	P46	Matériau compact blanc + peinture non séparable + polystyrène expansé (billes)	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 26 (Pignon 2)	Bardages	Plaques fibres	S133	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P46	bardage + isolation	002FH002020-1 n°46 - 1 - 002FH002020-1 n°46 - 2	P46	Matériau compact blanc + peinture non séparable + polystyrène expansé (billes)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 39	Vol 3 (Sas 2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P1	Réalisation d'un prélevement		002FH002020 n°1 - 1 - 002FH002020 n°1 - 2	002FH002020 n°1	Peinture décoratives	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 39	Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4) - Vol 3 (Sas 2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S28 - S29 - S30 - P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002FH002020 n°1 - 1 - 002FH002020 n°1 - 2	002FH002020 n°1	Peinture décoratives	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 1 (Sas 1) - Vol 5 (Pc rdc 1) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S1 - S31 - S32 - S33 - P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002FH002020 n°1 - 1 - 002FH002020 n°1 - 2	002FH002020 n°1	Peinture décoratives	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 3 (Sas 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélevement	Porteur, en partie basse	002FH002020 n°2 - 1 - 002FH002020 n°2 - 2	002FH002020 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Porteur, en partie basse	002FH002020 n°2 - 1 - 002FH002020 n°2 - 2	002FH002020 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 1 (Sas 1) - Vol 5 (Pc rdc 1) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S2 - S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Porteur, en partie basse	002FH002020 n°2 - 1 - 002FH002020 n°2 - 2	002FH002020 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 4 (Extérieur 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P6	Réalisation d'un prélevement		002FH002020 n°6 - 1 - 002FH002020 n°6 - 2	002FH002020 n°6	Matériau souple blanc avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 2 (Extérieur 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002FH002020 n°6 - 1 - 002FH002020 n°6 - 2	002FH002020 n°6	Matériau souple blanc avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 3 (Sas 2)	Menuiseries	joint vitrier beige	P7	Réalisation d'un prélevement		002FH002020 n°7 - 1 - 002FH002020 n°7 - 2	002FH002020 n°7	Matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 37	Vol 2 (Extérieur 1)	Menuiseries	joint vitrier beige	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002FH002020 n°7 - 1 - 002FH002020 n°7 - 2	002FH002020 n°7	Matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélevement	Porteur aspect gratté	002FH002020-1 n°11 - 1 - 002FH002020-1 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1) - Vol 16 (Vs 1) - Vol 17 (Vs 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Porteur aspect gratté	002FH002020-1 n°11 - 1 - 002FH002020-1 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P12	Réalisation d'un prélevement	Scellement parpaings	002FH002020-1 n°12 - 1 - 002FH002020-1 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1) - Vol 12 (Local poubelle 1) - Vol 14 (Local poubelle 2) - Vol 17 (Vs 2) - Vol 16 (Vs 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P12 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Scellement parpaings	002FH002020-1 n°12 - 1 - 002FH002020-1 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S114	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Scellement parpaings	002FH002020-1 n°12 - 1 - 002FH002020-1 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 11 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P13	Réalisation d'un prélevement	Porteur brut	002FH002020-1 n°13 - 1 - 002FH002020-1 n°13 - 2	P13	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1) - Vol 14 (Local poubelle 2) - Vol 12 (Local poubelle 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P13 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Porteur brut	002FH002020-1 n°13 - 1 - 002FH002020-1 n°13 - 2	P13	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement	Cloison carreaux de plâtre	002FH002020-1 n°14 - 1 - 002FH002020-1 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Cloison carreaux de plâtre	002FH002020-1 n°14 - 1 - 002FH002020-1 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P17	Réalisation d'un prélevement	Platreux	002FH002020-1 n°17 - 1 - 002FH002020-1 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 11 (PC R-1) - Vol 14 (Local poubelle 2)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P17 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Platreux	002FH002020-1 n°17 - 1 - 002FH002020-1 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P18	Réalisation d'un prélevement	Ciment	002FH002020-1 n°18 - 1 - 002FH002020-1 n°18 - 2	P18	Enduit gris en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1) - Vol 14 (Local poubelle 2) - Vol 12 (Local poubelle 1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P18 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Ciment	002FH002020-1 n°18 - 1 - 002FH002020-1 n°18 - 2	P18	Enduit gris en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P19	Réalisation d'un prélevement		002FH002020-1 n°19 - 1 - 002FH002020-1 n°19 - 2	P19	Matériau souple gris + peintures multiples en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 1 (Sas 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P20	Réalisation d'un prélevement	Porteur, en partie haute	002FH002020-1 n°20 - 1 - 002FH002020-1 n°20 - 2	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S46 - S47 - S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Porteur, en partie haute	002FH002020-1 n°20 - 1 - 002FH002020-1 n°20 - 2	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 3 (Sas 2) - Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S49 - S50 - S51 - S52	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Porteur, en partie haute	002FH002020-1 n°20 - 1 - 002FH002020-1 n°20 - 2	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P21	Réalisation d'un prélevement	Cloisons briques	002FH002020-1 n°21 - 1 - 002FH002020-1 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S53 - S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Cloisons briques	002FH002020-1 n°21 - 1 - 002FH002020-1 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S55 - S56 - S57	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Cloisons briques	002FH002020-1 n°21 - 1 - 002FH002020-1 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P23	Réalisation d'un prélevement	contremarche	002FH002020-1 n°23 - 1 - 002FH002020-1 n°23 - 2	P23	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S63 - S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	contremarche	002FH002020-1 n°23 - 1 - 002FH002020-1 n°23 - 2	P23	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S65 - S66 - S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	contremarche	002FH002020-1 n°23 - 1 - 002FH002020-1 n°23 - 2	P23	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P24	Réalisation d'un prélevement	Gris, en plinthe	002FH002020-1 n°24 - 1 - 002FH002020-1 n°24 - 2	P24	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P24 - S68 - S69	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Gris, en plinthe	002FH002020-1 n°24 - 1 - 002FH002020-1 n°24 - 2	P24	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 39	Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S70 - S71 - S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Gris, en plinthe	002FH002020-1 n°24 - 1 - 002FH002020-1 n°24 - 2	P24	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P28	Réalisation d'un prélevement	Scellement parpaings	002FH002020-1 n°28 - 1 - 002FH002020-1 n°28 - 2	P28	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S87 - S88	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Scellement parpaings	002FH002020-1 n°28 - 1 - 002FH002020-1 n°28 - 2	P28	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S89 - S90 - S91	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Scellement parpaings	002FH002020-1 n°28 - 1 - 002FH002020-1 n°28 - 2	P28	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P29	Réalisation d'un prélevement	Scellement briques gaines techniques	002FH002020-1 n°29 - 1 - 002FH002020-1 n°29 - 2	P29	Enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 37	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S92 - S93	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Scellement briques gaines techniques	002FH002020-1 n°29 - 1 - 002FH002020-1 n°29 - 2	P29	Enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S94 - S95 - S96	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Scellement briques gaines techniques	002FH002020-1 n°29 - 1 - 002FH002020-1 n°29 - 2	P29	Enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P30	Réalisation d'un prélevement	Joints entre marche et porteur	002FH002020-1 n°30 - 1 - 002FH002020-1 n°30 - 2	P30	Enduit compact gris hétérogène + matériau gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	Joints entre marche et porteur	002FH002020-1 n°30 - 1 - 002FH002020-1 n°30 - 2	P30	Enduit compact gris hétérogène + matériau gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 8 (Pc rdc 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S97	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	Joints entre marche et porteur	002FH002020-1 n°30 - 1 - 002FH002020-1 n°30 - 2	P30	Enduit compact gris hétérogène + matériau gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P31	Réalisation d'un prélevement		002FH002020-1 n°31 - 1 - 002FH002020-1 n°31 - 2	P31	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 3 (Sas 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	S98	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31		002FH002020-1 n°31 - 1 - 002FH002020-1 n°31 - 2	P31	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1)	Menuiseries	Joints d'étanchéïté	P32	Réalisation d'un prélevement	Menuiseries alu	002FH002020-1 n°32 - 1 - 002FH002020-1 n°32 - 2	P32	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 8 (Pc rdc 2)	Menuiseries	Joints d'étanchéïté	S99	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	Menuiseries alu	002FH002020-1 n°32 - 1 - 002FH002020-1 n°32 - 2	P32	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 10 (Pc r+ 4)	Menuiseries	sky dome	I2			I2 - 2 - 002FH002020-1 n°35 - 1				Impossibilité d'acceder à la menuiserie sans échaffaudage
CAGE ESCALIER 37	Vol 7 (Pc r+ 3)	Menuiseries	sky dome	I2			I2 - 2 - 002FH002020-1 n°35 - 1				Impossibilité d'acceder à la menuiserie sans échaffaudage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P37	Réalisation d'un prélevement		002FH002020-1 n°37 - 1 - 002FH002020-1 n°37 - 2	P37	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S117	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37		002FH002020-1 n°37 - 1 - 002FH002020-1 n°37 - 2	P37	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P38	Réalisation d'un prélevement	VMC	002FH002020-1 n°38 - 1 - 002FH002020-1 n°38 - 2	P38	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38	VMC	002FH002020-1 n°38 - 1 - 002FH002020-1 n°38 - 2	P38	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S118	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38	VMC	002FH002020-1 n°38 - 1 - 002FH002020-1 n°38 - 2	P38	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P39	Réalisation d'un prélevement	Lucarne	002FH002020-1 n°39 - 1 - 002FH002020-1 n°39 - 2	P39	Matériau beige en vrac non séparable + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S119	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39	Lucarne	002FH002020-1 n°39 - 1 - 002FH002020-1 n°39 - 2	P39	Matériau beige en vrac non séparable + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P40	Réalisation d'un prélevement	Briques cheminée	002FH002020-1 n°40 - 1 - 002FH002020-1 n°40 - 2	P40	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P40	Briques cheminée	002FH002020-1 n°40 - 1 - 002FH002020-1 n°40 - 2	P40	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S120	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P40	Briques cheminée	002FH002020-1 n°40 - 1 - 002FH002020-1 n°40 - 2	P40	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 23 (Façade 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P48	Réalisation d'un prélevement	rebouchage sous menuiserie	002FH002020-1 n°48 - 1 - 002FH002020-1 n°48 - 2	P48	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 23 (Façade 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P48	rebouchage sous menuiserie	002FH002020-1 n°48 - 1 - 002FH002020-1 n°48 - 2	P48	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 23 (Façade 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P49	Réalisation d'un prélevement		002FH002020-1 n°49 - 1 - 002FH002020-1 n°49 - 2 - 002FH002020-1 n°49 - 3 - 002FH002020-1 n°49 - 4	P49	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 23 (Façade 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P49		002FH002020-1 n°49 - 1 - 002FH002020-1 n°49 - 2 - 002FH002020-1 n°49 - 3 - 002FH002020-1 n°49 - 4	P49	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 25 (Façade 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S134	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P49		002FH002020-1 n°49 - 1 - 002FH002020-1 n°49 - 2 - 002FH002020-1 n°49 - 3 - 002FH002020-1 n°49 - 4	P49	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 11 (PC R-1)	Plafonds	Panneaux vissés	P9	Réalisation d'un prélevement	Joints entre panneaux fibralith	002FH002020-1 n°9 - 1 - 002FH002020-1 n°9 - 2	P9	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 12 (Local poubelle 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S10 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Joints entre panneaux fibralith	002FH002020-1 n°9 - 1 - 002FH002020-1 n°9 - 2	P9	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Sous sol	Vol 14 (Local poubelle 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S11 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Joints entre panneaux fibralith	002FH002020-1 n°9 - 1 - 002FH002020-1 n°9 - 2	P9	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1)	Plafonds	Panneaux vissés	I1			I1 - 1				Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs
Sous sol	Vol 12 (Local poubelle 1)	Plafonds	Panneaux vissés	I1			I1 - 1				Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 14 (Local poubelle 2)	Plafonds	Panneaux vissés	I1			I1 - 1				Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs
Sous sol	Vol 11 (PC R-1)	Plafonds	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélevement	Sous face escalier	002FH002020-1 n°10 - 1 - 002FH002020-1 n°10 - 2	P10	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 16 (Vs 1) - Vol 17 (Vs 2)	Plafonds	Enduit ciment	P10 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Sous face escalier	002FH002020-1 n°10 - 1 - 002FH002020-1 n°10 - 2	P10	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 1 (Sas 1)	Plafonds	Enduit plâtre	P25	Réalisation d'un prélevement		002FH002020-1 n°25 - 1 - 002FH002020-1 n°25 - 2	P25	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1) - Vol 6 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S73 - S74 - S75	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25		002FH002020-1 n°25 - 1 - 002FH002020-1 n°25 - 2	P25	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 39	Vol 3 (Sas 2) - Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S76 - S77 - S78	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25		002FH002020-1 n°25 - 1 - 002FH002020-1 n°25 - 2	P25	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1)	Plafonds	Enduit plâtre	P26	Réalisation d'un prélevement	Sous face escalier	002FH002020-1 n°26 - 1 - 002FH002020-1 n°26 - 3 - 002FH002020-1 n°26 - 2 - 002FH002020-1 n°26 - 4	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 6 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S79	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Sous face escalier	002FH002020-1 n°26 - 1 - 002FH002020-1 n°26 - 3 - 002FH002020-1 n°26 - 2 - 002FH002020-1 n°26 - 4	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 39	Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S80 - S81	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Sous face escalier	002FH002020-1 n°26 - 1 - 002FH002020-1 n°26 - 3 - 002FH002020-1 n°26 - 2 - 002FH002020-1 n°26 - 4	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 7 (Pc r+ 3)	Plafonds	Enduit plâtre	P34	Réalisation d'un prélevement	Plafond dernier étage	002FH002020-1 n°34 - 1 - 002FH002020-1 n°34 - 2	P34	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 10 (Pc r+ 4)	Plafonds	Enduit plâtre	S106	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34	Plafond dernier étage	002FH002020-1 n°34 - 1 - 002FH002020-1 n°34 - 2	P34	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Plafonds	Enduit plâtre	P36	Réalisation d'un prélevement	Scellement briques	002FH002020-1 n°36 - 1 - 002FH002020-1 n°36 - 2	P36	Enduit compact blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S116	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36	Scellement briques	002FH002020-1 n°36 - 1 - 002FH002020-1 n°36 - 2	P36	Enduit compact blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 39	Vol 3 (Sas 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P4	Réalisation d'un prélevement	grise	002FH002020 n°4 - 1 - 002FH002020 n°4 - 2	002FH002020 n°4	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 8 (Pc rdc 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S40 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	grise	002FH002020 n°4 - 1 - 002FH002020 n°4 - 2	002FH002020 n°4	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 9 (Pc r+ 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S41 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	grise	002FH002020 n°4 - 1 - 002FH002020 n°4 - 2	002FH002020 n°4	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 10 (Pc r+ 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S42 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	grise	002FH002020 n°4 - 1 - 002FH002020 n°4 - 2	002FH002020 n°4	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 1 (Sas 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S4 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	grise	002FH002020 n°4 - 1 - 002FH002020 n°4 - 2	002FH002020 n°4	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S43 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	grise	002FH002020 n°4 - 1 - 002FH002020 n°4 - 2	002FH002020 n°4	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 37	Vol 6 (PC R+1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S44 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	grise	002FH002020 n°4 - 1 - 002FH002020 n°4 - 2	002FH002020 n°4	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 7 (Pc r+ 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S45 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	grise	002FH002020 n°4 - 1 - 002FH002020 n°4 - 2	002FH002020 n°4	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 39	Vol 3 (Sas 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P3	Réalisation d'un prélevement	gris	002FH002020 n°3 - 1 - 002FH002020 n°3 - 2	002FH002020 n°3	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 1 (Sas 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	gris	002FH002020 n°3 - 1 - 002FH002020 n°3 - 2	002FH002020 n°3	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (PC R-1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P8	Réalisation d'un prélevement		002FH002020-1 n°8 - 1 - 002FH002020-1 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 14 (Local poubelle 2) - Vol 12 (Local poubelle 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002FH002020-1 n°8 - 1 - 002FH002020-1 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P22	Réalisation d'un prélevement	Marbre escalier	002FH002020-1 n°22 - 1 - 002FH002020-1 n°22 - 2	P22	Colle grise hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S58 - S59	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Marbre escalier	002FH002020-1 n°22 - 1 - 002FH002020-1 n°22 - 2	P22	Colle grise hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S60 - S61 - S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Marbre escalier	002FH002020-1 n°22 - 1 - 002FH002020-1 n°22 - 2	P22	Colle grise hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P27	Réalisation d'un prélevement	Gaines techniques	002FH002020-1 n°27 - 1 - 002FH002020-1 n°27 - 2	P27	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S82 - S83	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Gaines techniques	002FH002020-1 n°27 - 1 - 002FH002020-1 n°27 - 2	P27	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 39	Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S84 - S85 - S86	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Gaines techniques	002FH002020-1 n°27 - 1 - 002FH002020-1 n°27 - 2	P27	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 5 (Pc rdc 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P33	Réalisation d'un prélevement	4x4 beige	002FH002020-1 n°33 - 1 - 002FH002020-1 n°33 - 2	P33	Colle grise hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 37	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (Pc r+ 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S100 - S101	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	4x4 beige	002FH002020-1 n°33 - 1 - 002FH002020-1 n°33 - 2	P33	Colle grise hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 39	Vol 8 (Pc rdc 2) - Vol 9 (Pc r+ 2) - Vol 10 (Pc r+ 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S102 - S103 - S104 - S105	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	4x4 beige	002FH002020-1 n°33 - 1 - 002FH002020-1 n°33 - 2	P33	Colle grise hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 23 (Façade 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P45	Réalisation d'un prélevement	balcon	002FH002020-1 n°45 - 1 - 002FH002020-1 n°45 - 2	P45	Enduit gris hétérogène + matériau beige en vrac non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 23 (Façade 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P45	balcon	002FH002020-1 n°45 - 1 - 002FH002020-1 n°45 - 2	P45	Enduit gris hétérogène + matériau beige en vrac non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Masse	Vol 21 (Masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P47	Réalisation d'un prélevement	Extérieur	002FH002020-1 n°47 - 1 - 002FH002020-1 n°47 - 2	P47	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Masse	Vol 21 (Masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P47	Extérieur	002FH002020-1 n°47 - 1 - 002FH002020-1 n°47 - 2	P47	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles cage 37	Vol 19 (Comble 1)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P35	Réalisation d'un prélevement	Laine de verre + pare vapeur	002FH002020-1 n°35 - 1	P35	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles cage 39	Vol 22 (Comble 2)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S115	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35	Laine de verre + pare vapeur	002FH002020-1 n°35 - 1	P35	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Masse	Vol 20 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S113			S113 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Masse	Vol 21 (Masse)	Trottoir	Scellement bordures	P41	Réalisation d'un prélevement		002FH002020-1 n°41 - 1 - 002FH002020-1 n°41 - 2	P41	Enduit gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Masse	Vol 21 (Masse)	Revêtement routier	Bitume	P42	Réalisation d'un prélevement		002FH002020-1 n°42 - 1 - 002FH002020-1 n°42 - 2	P42	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - MPCA Toutes catégories confondues
	CAGE ESCALIER 37	CAGE ESCALIER 37 - Plan de repérage - Actions menées
	CAGE ESCALIER 37	CAGE ESCALIER 37 - MPCA Toutes catégories confondues
	CAGE ESCALIER 39	CAGE ESCALIER 39 - Plan de repérage - Actions menées
	CAGE ESCALIER 39	CAGE ESCALIER 39 - MPCA Toutes catégories confondues
	Combles cage 37	Combles cage 37 - Plan de repérage - Actions menées
	Combles cage 37	Combles cage 37 - MPCA Toutes catégories confondues
	Masse	Masse - Plan de repérage - Actions menées
	Combles cage 39	Combles cage 39 - Plan de repérage - Actions menées
	Combles cage 39	Combles cage 39 - MPCA Toutes catégories confondues
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FH002020-1

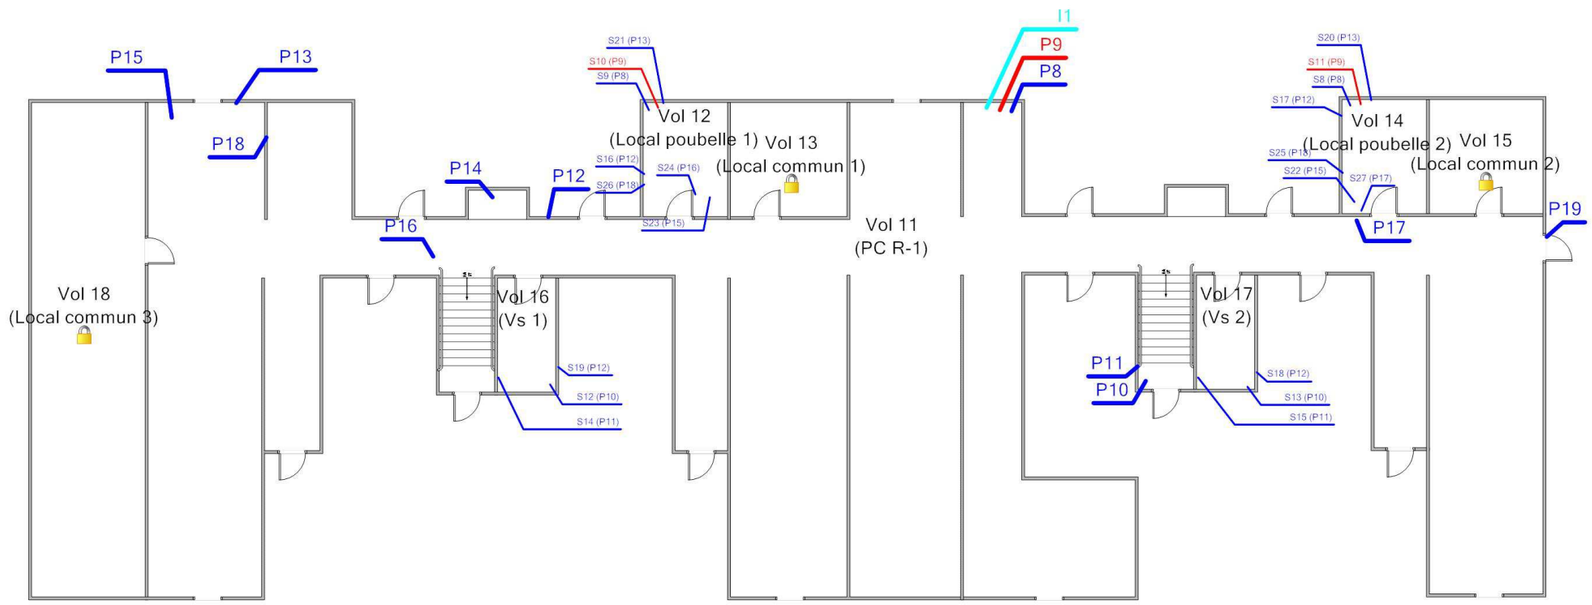

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

SOUS SOL - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002FH002020-1

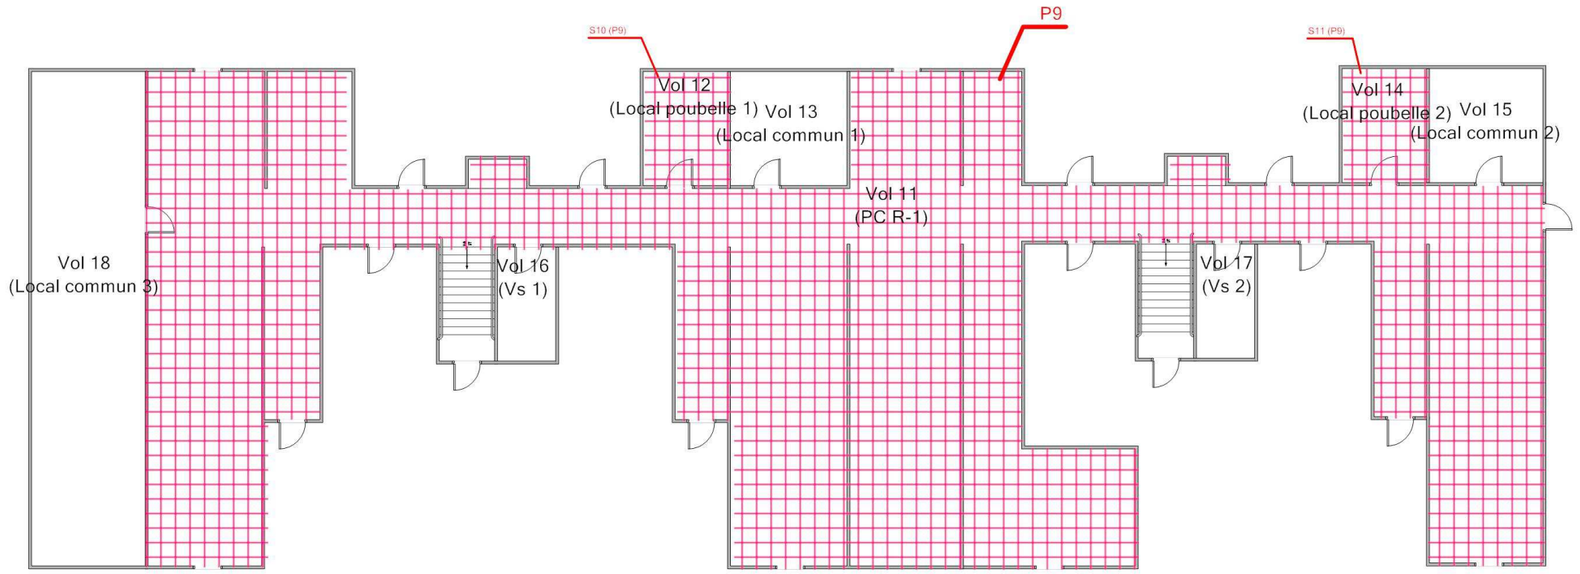

Légende

	P9 : Panneaux vissés

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

CAGE ESCALIER 37 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FH002020-1

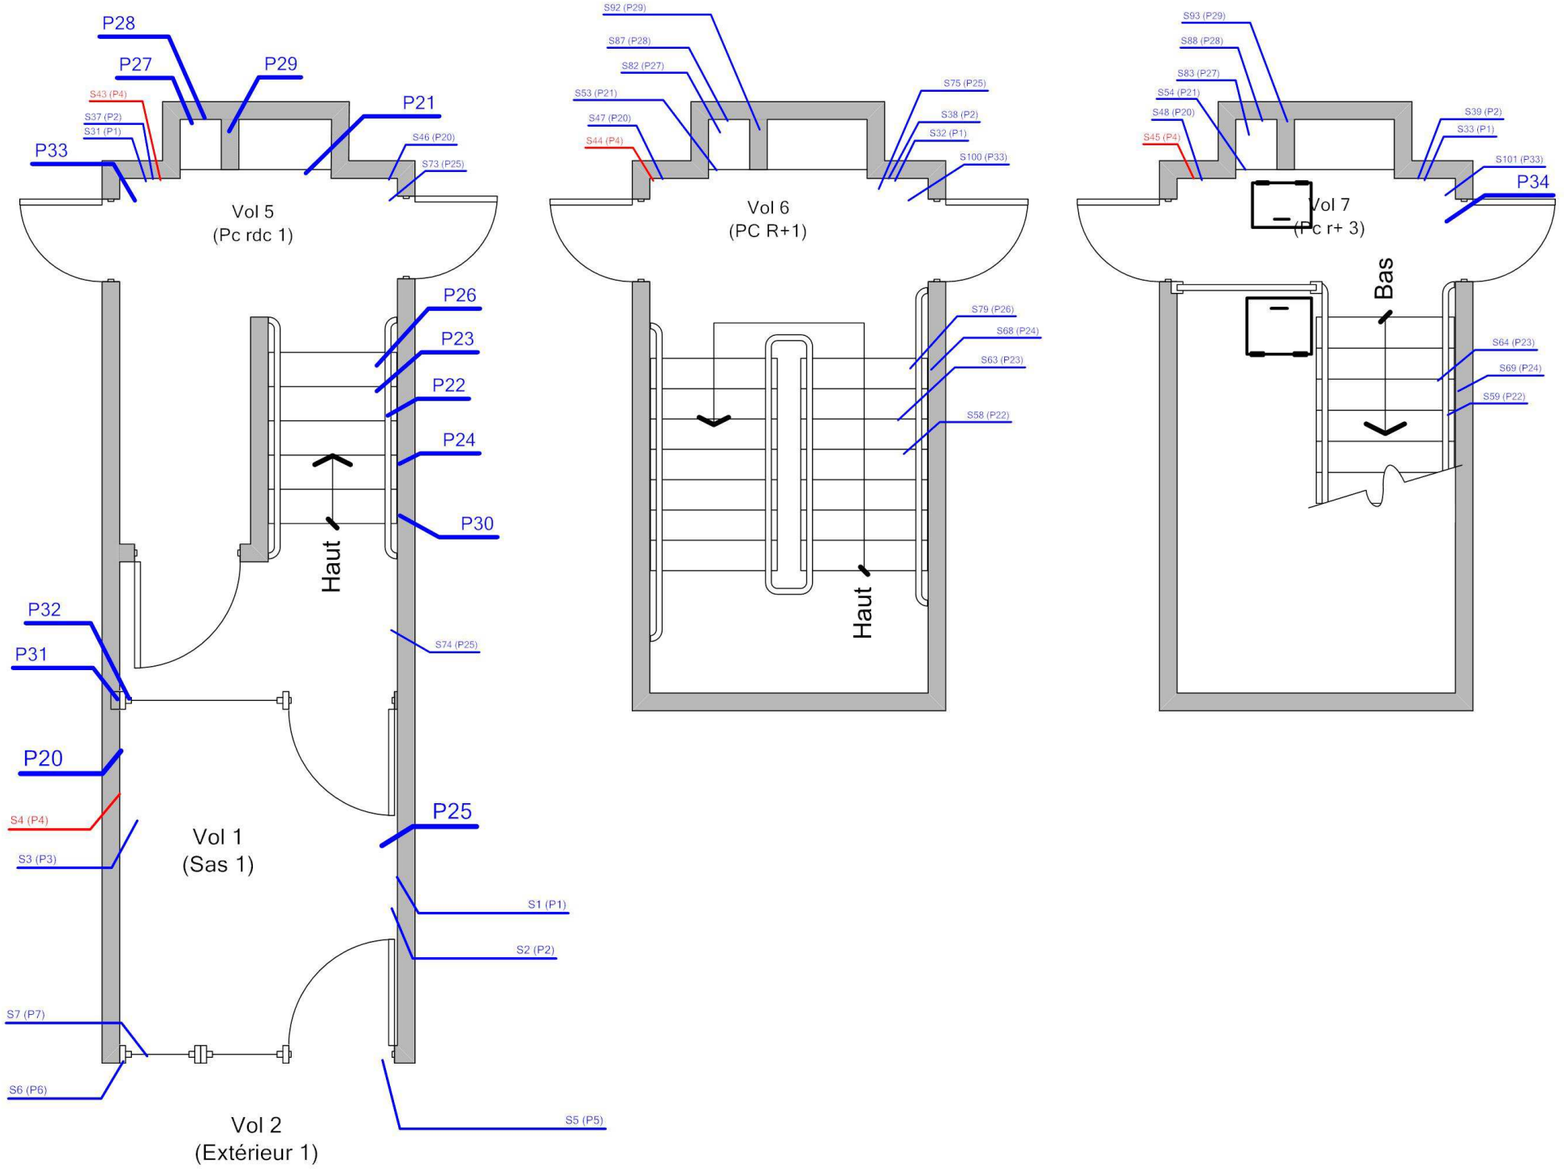

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

CAGE ESCALIER 37 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002FH002020-1

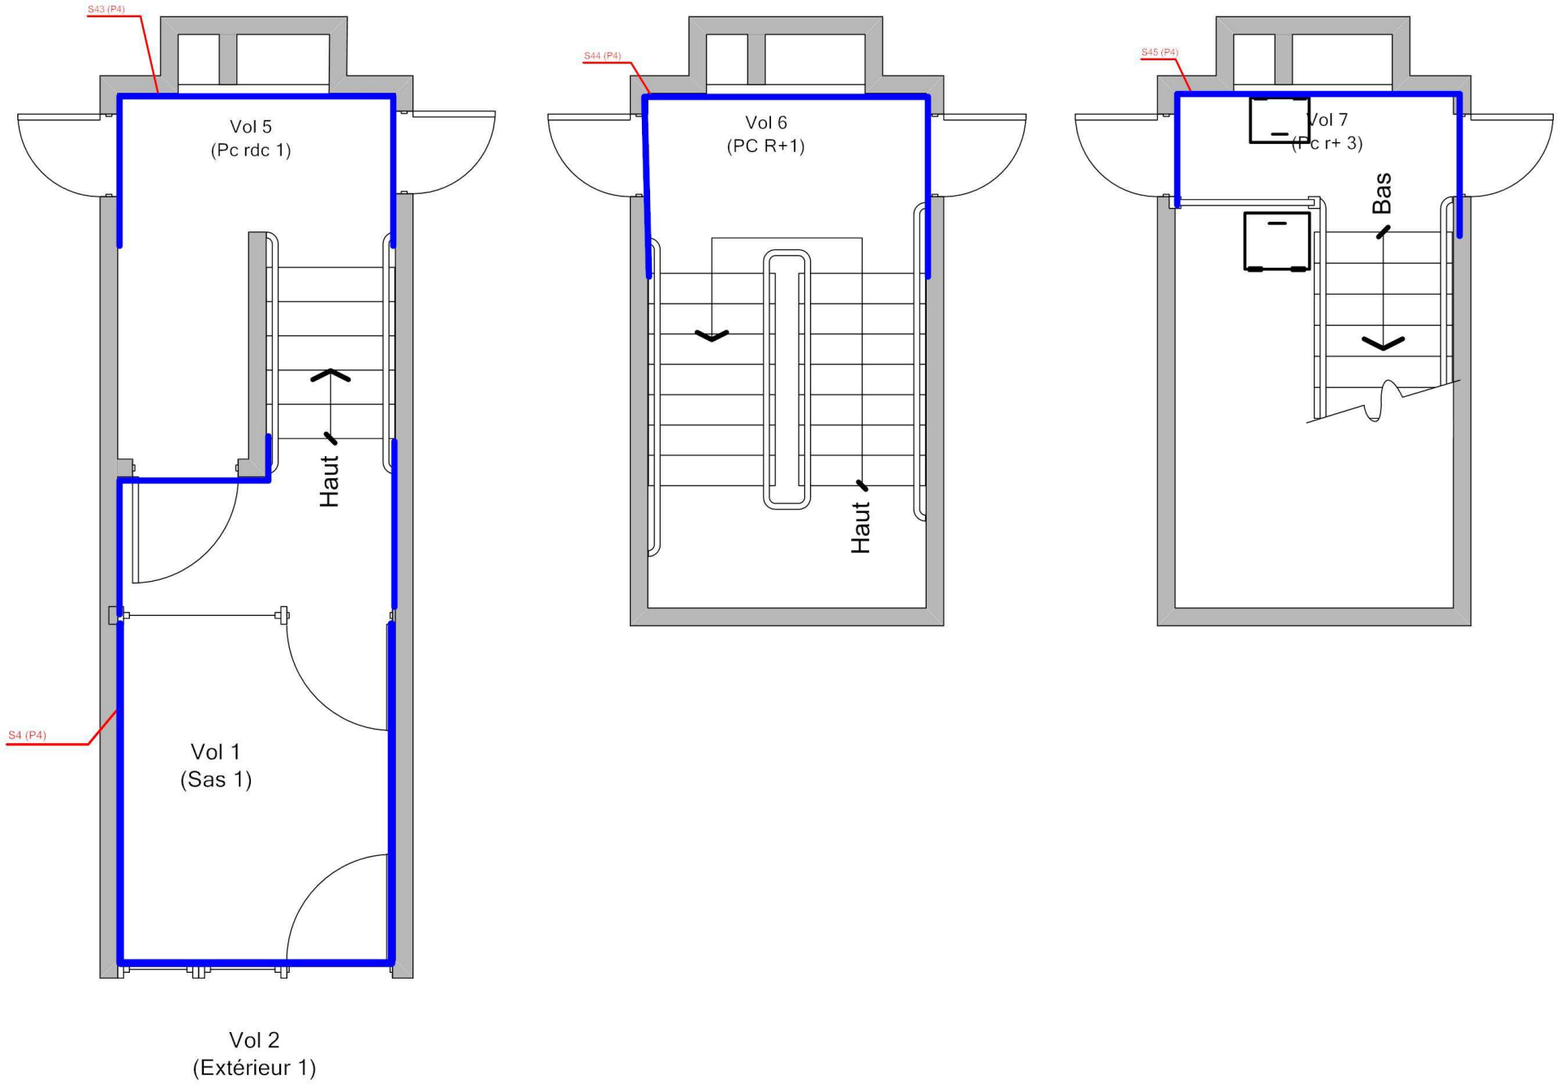

Légende

	P4 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

CAGE ESCALIER 39 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FH002020-1

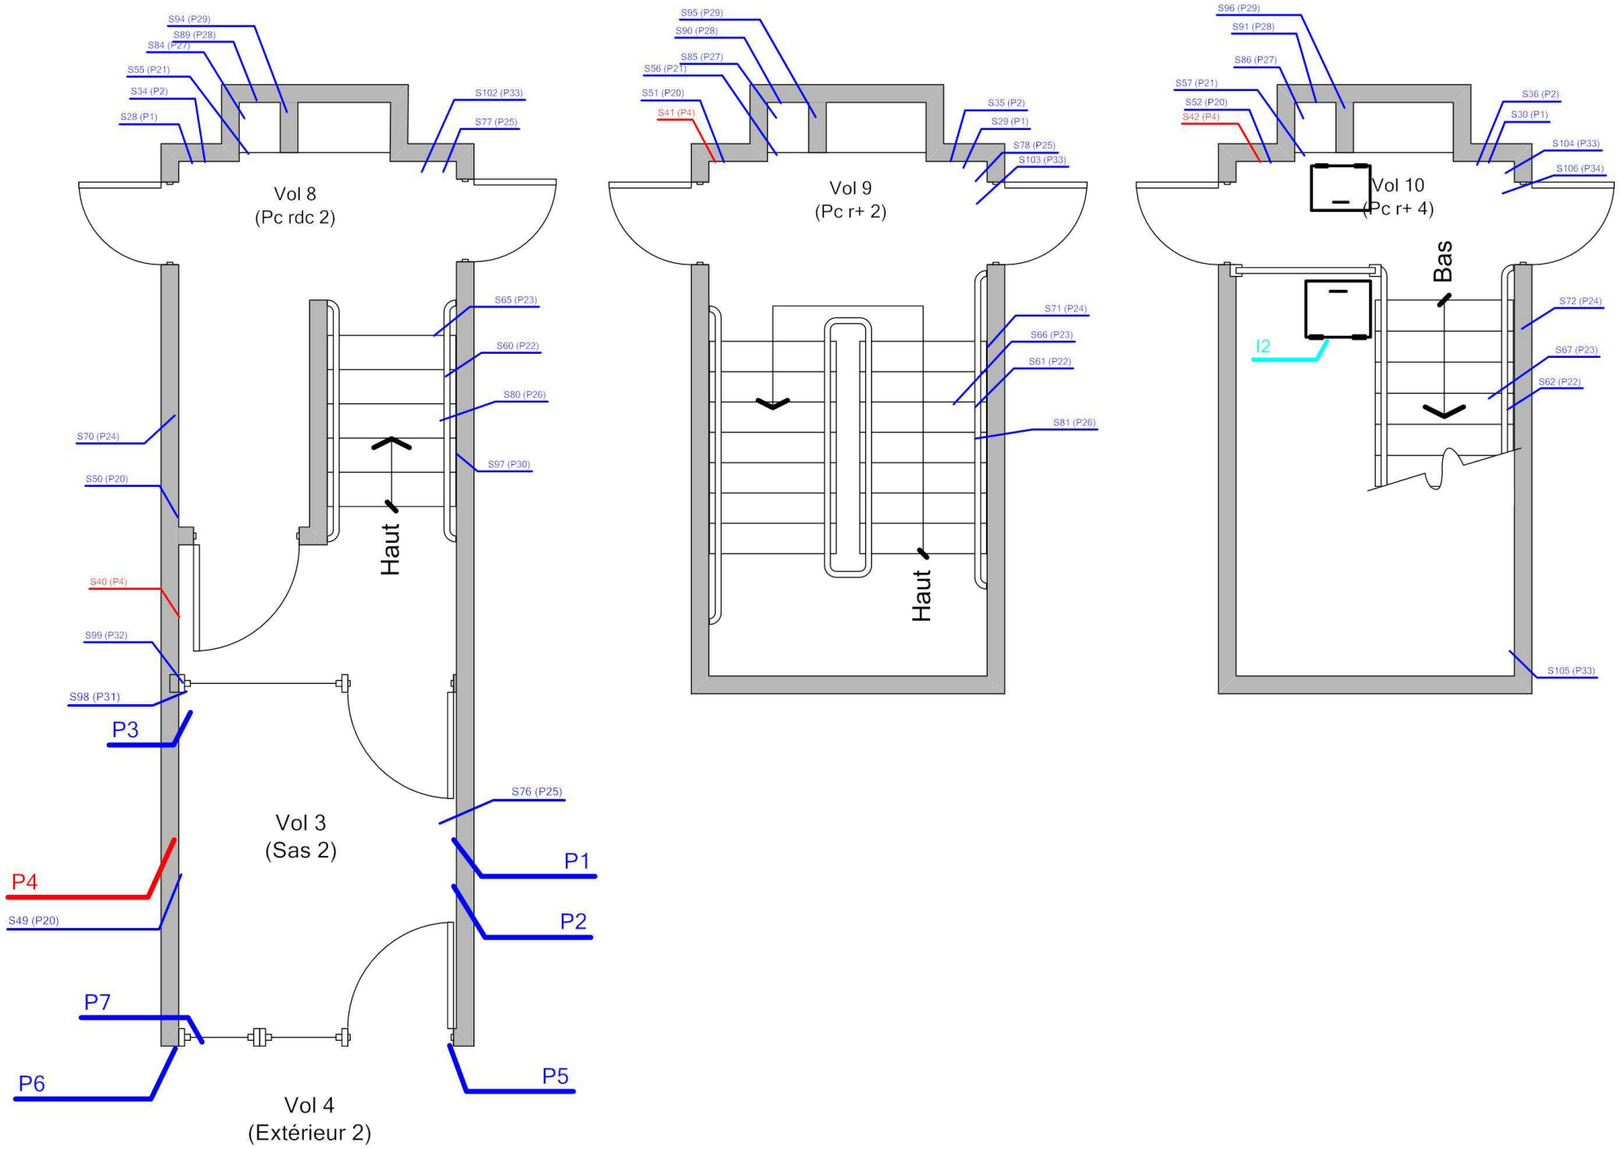

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

CAGE ESCALIER 39 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002FH002020-1

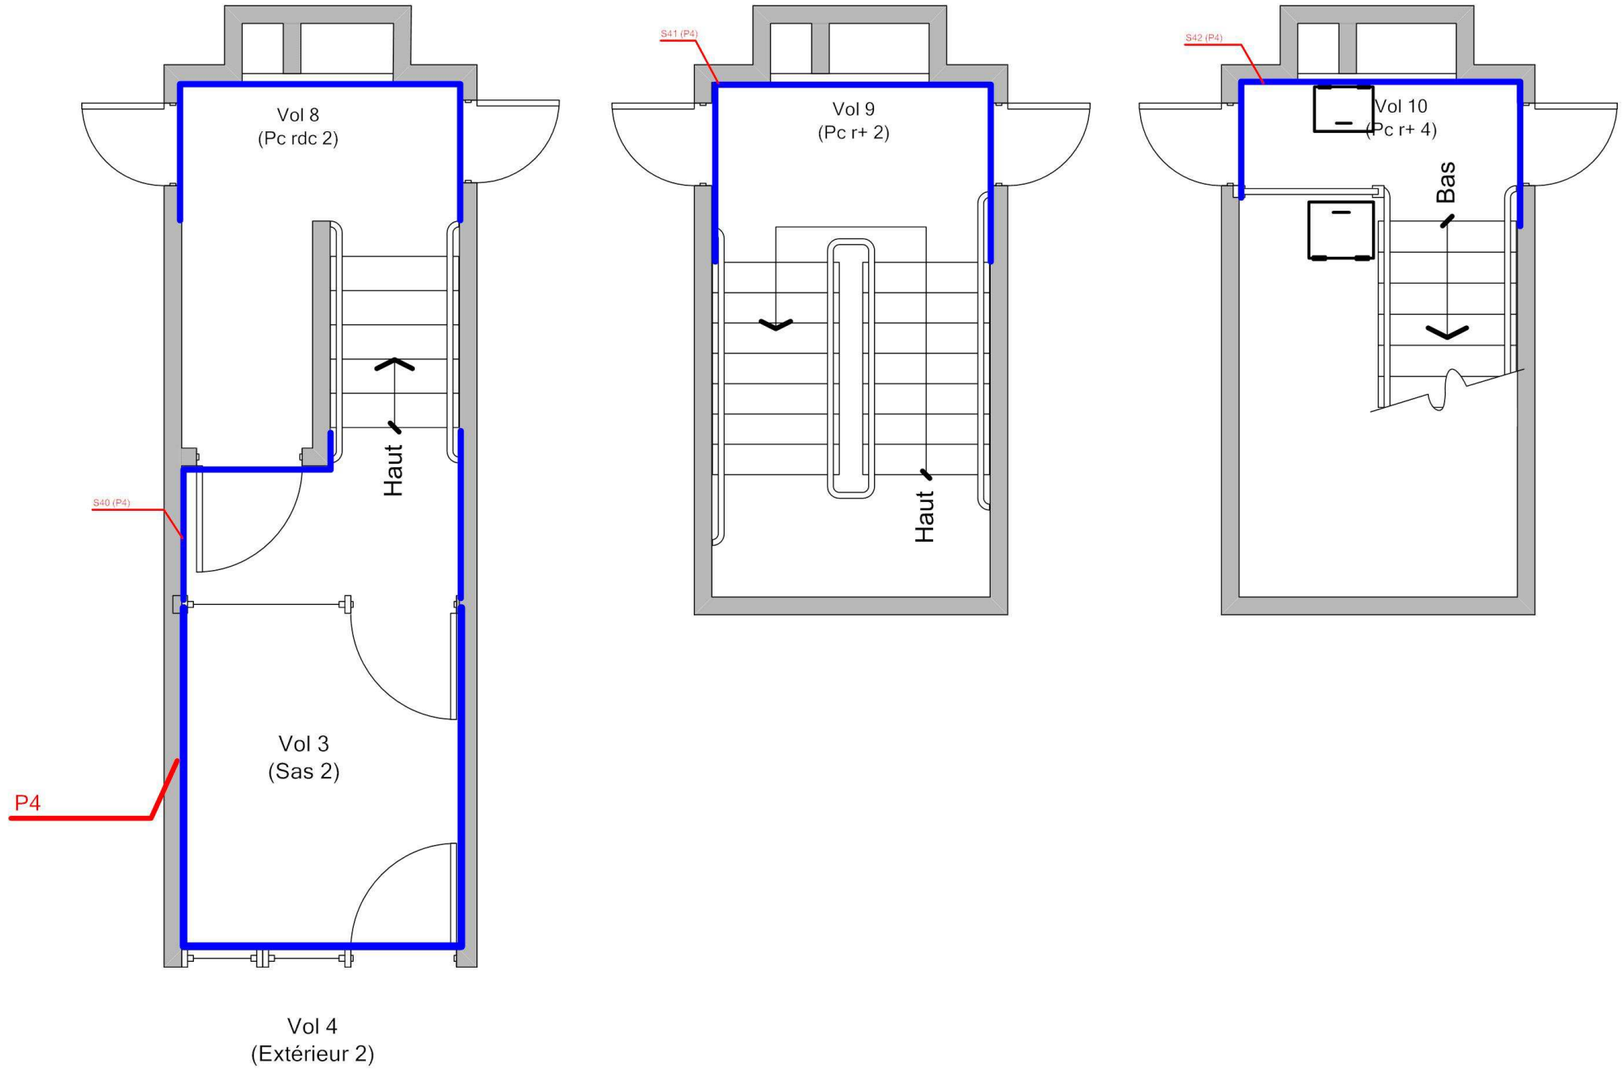

Légende

	P4 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

COMBLES CAGE 37 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FH002020-1

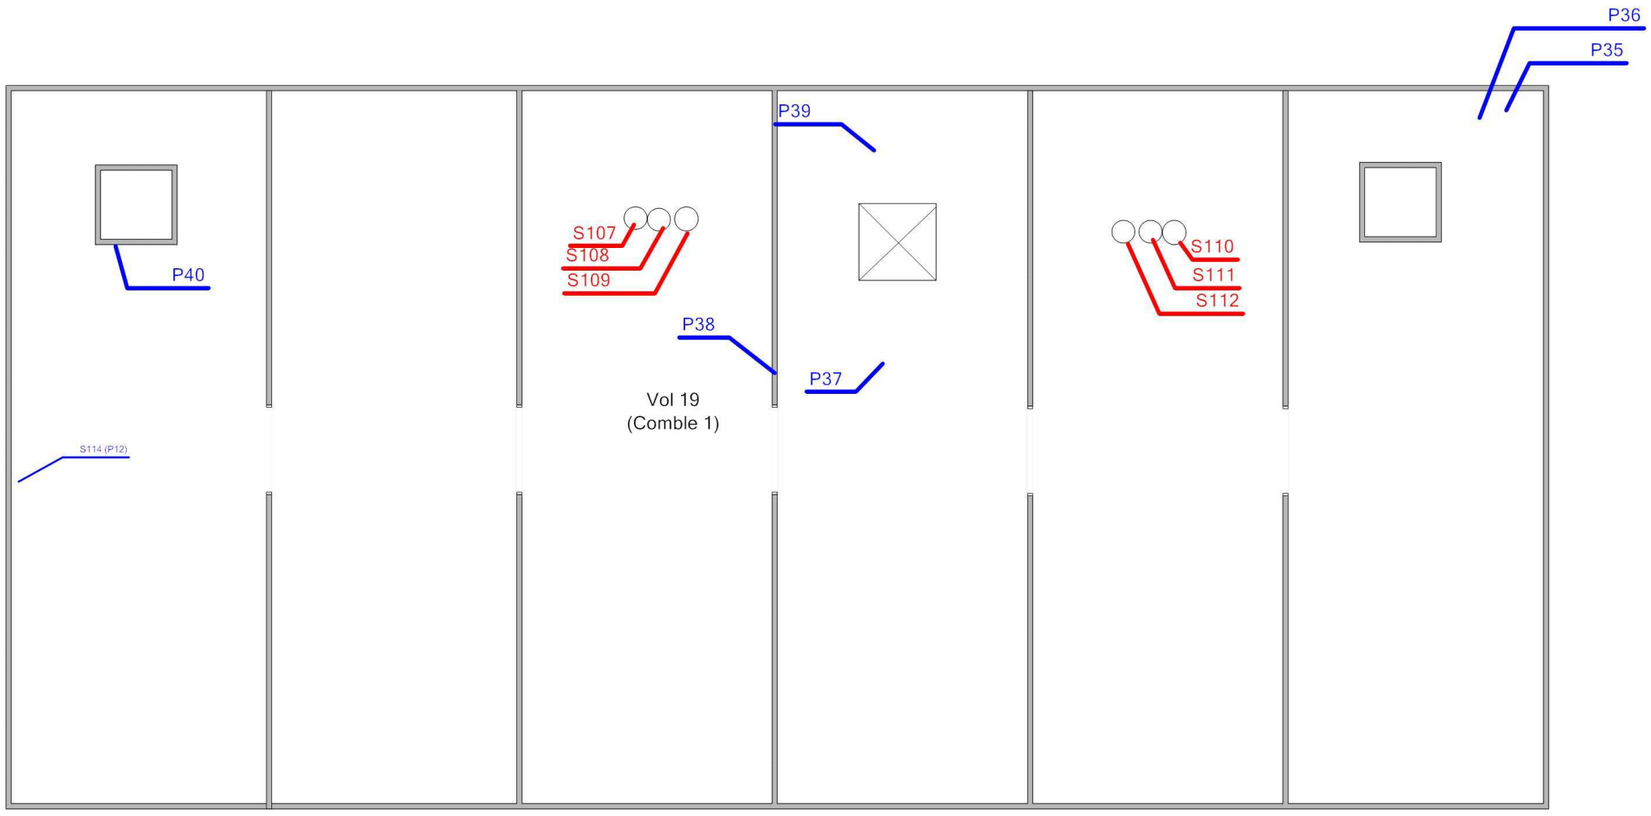

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

COMBLES CAGE 37 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002FH002020-1

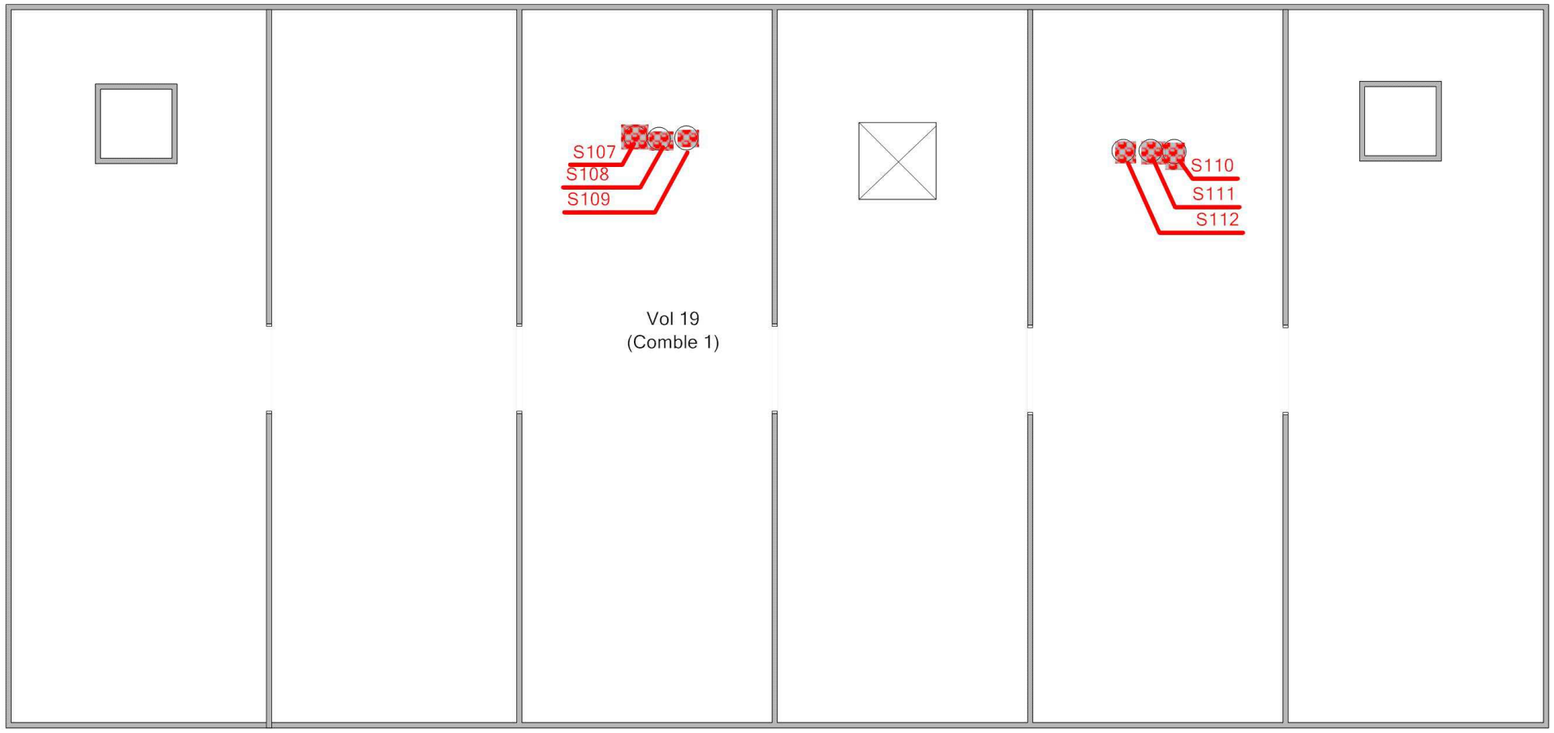

Légende	
	S109: Conduit en fibres-ciment
	S111: Conduit en fibres-ciment
	S112: Conduit en fibres-ciment
	S110: Conduit en fibres-ciment
	S107: Conduit en fibres-ciment
	S108: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FH002020-1

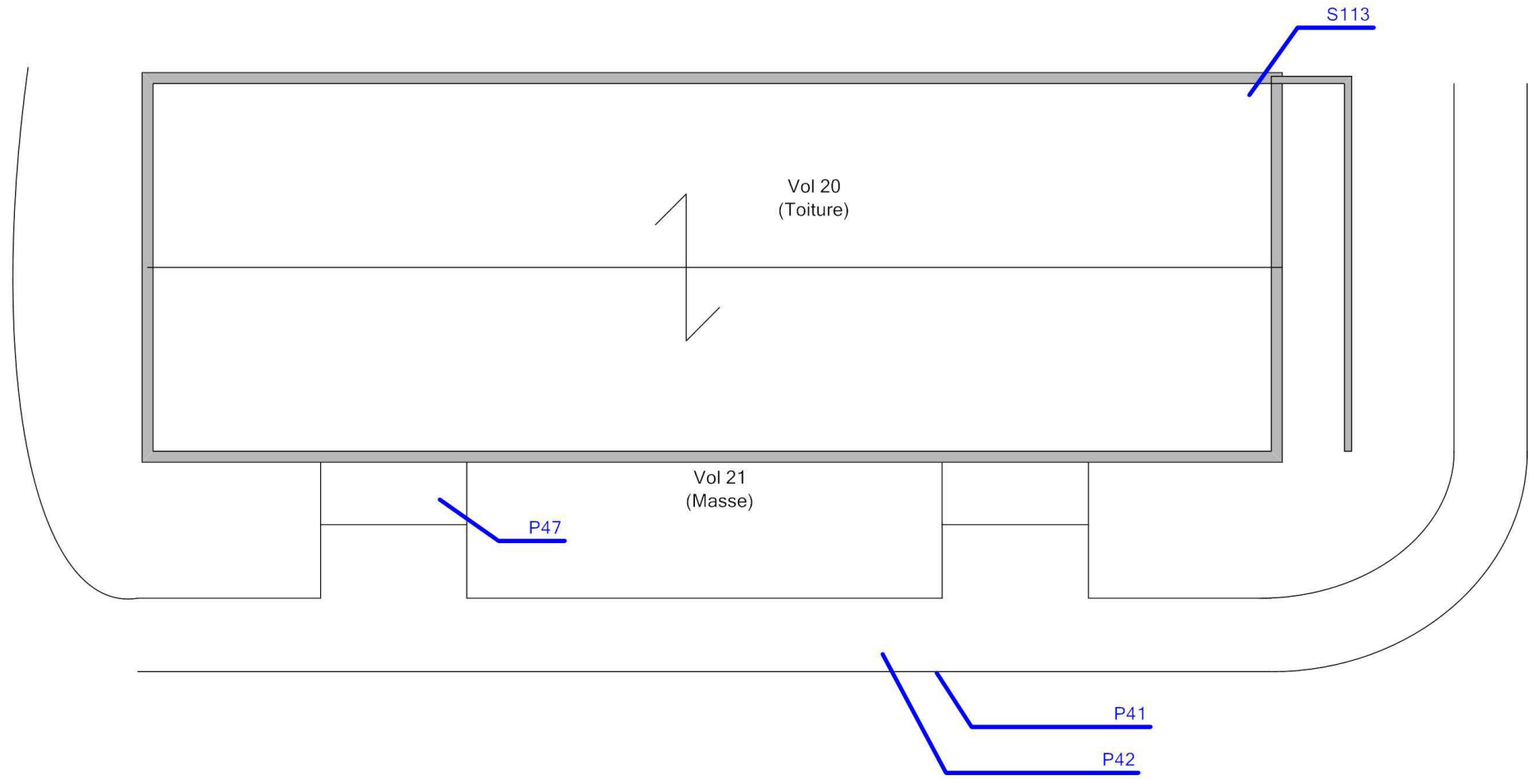

Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

COMBLES CAGE 39 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FH002020-1

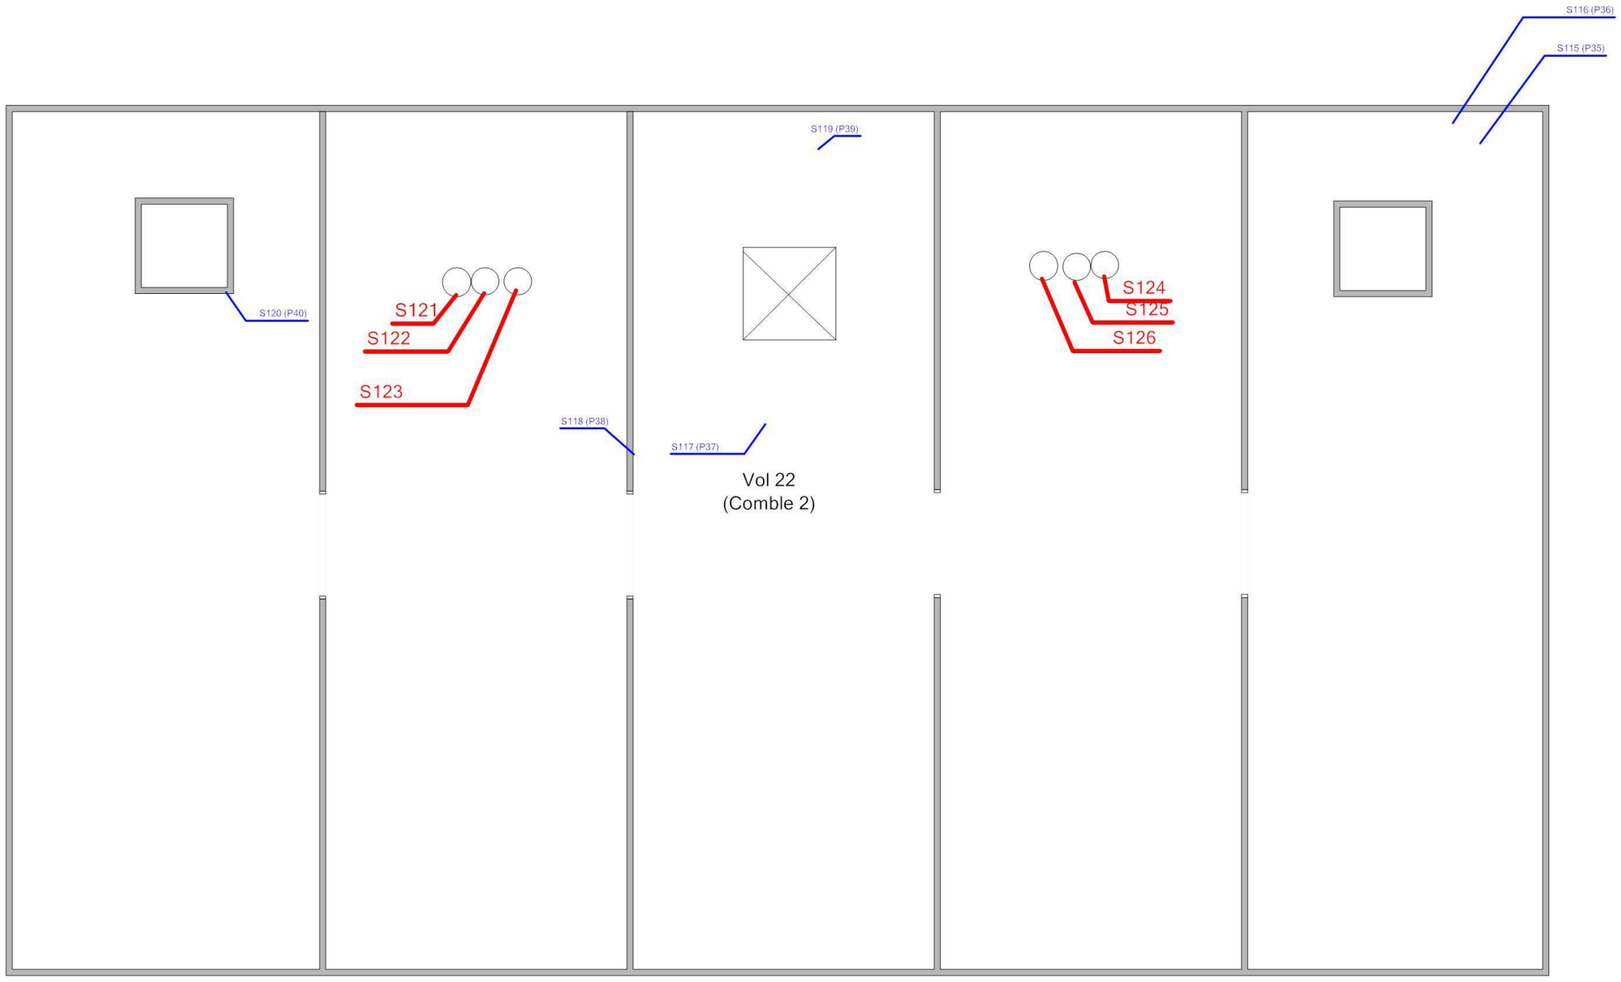

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

COMBLES CAGE 39 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002FH002020-1

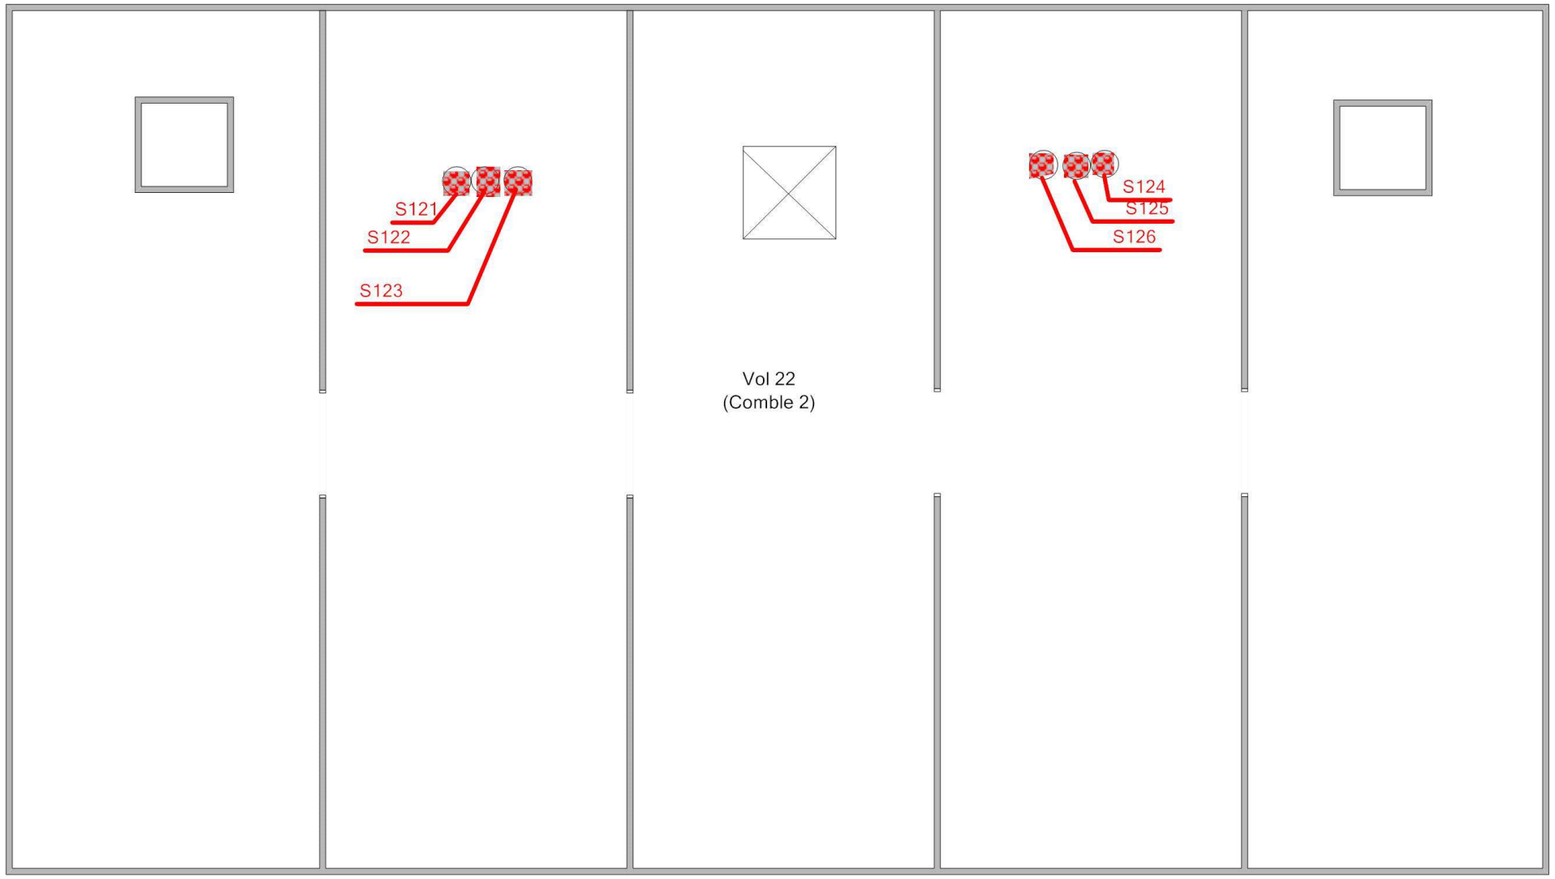

Légende

	S126: Conduit en fibres-ciment
	S122: Conduit en fibres-ciment
	S121: Conduit en fibres-ciment
	S125: Conduit en fibres-ciment
	S124: Conduit en fibres-ciment
	S123: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

FAÇADE AVANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FH002020-1

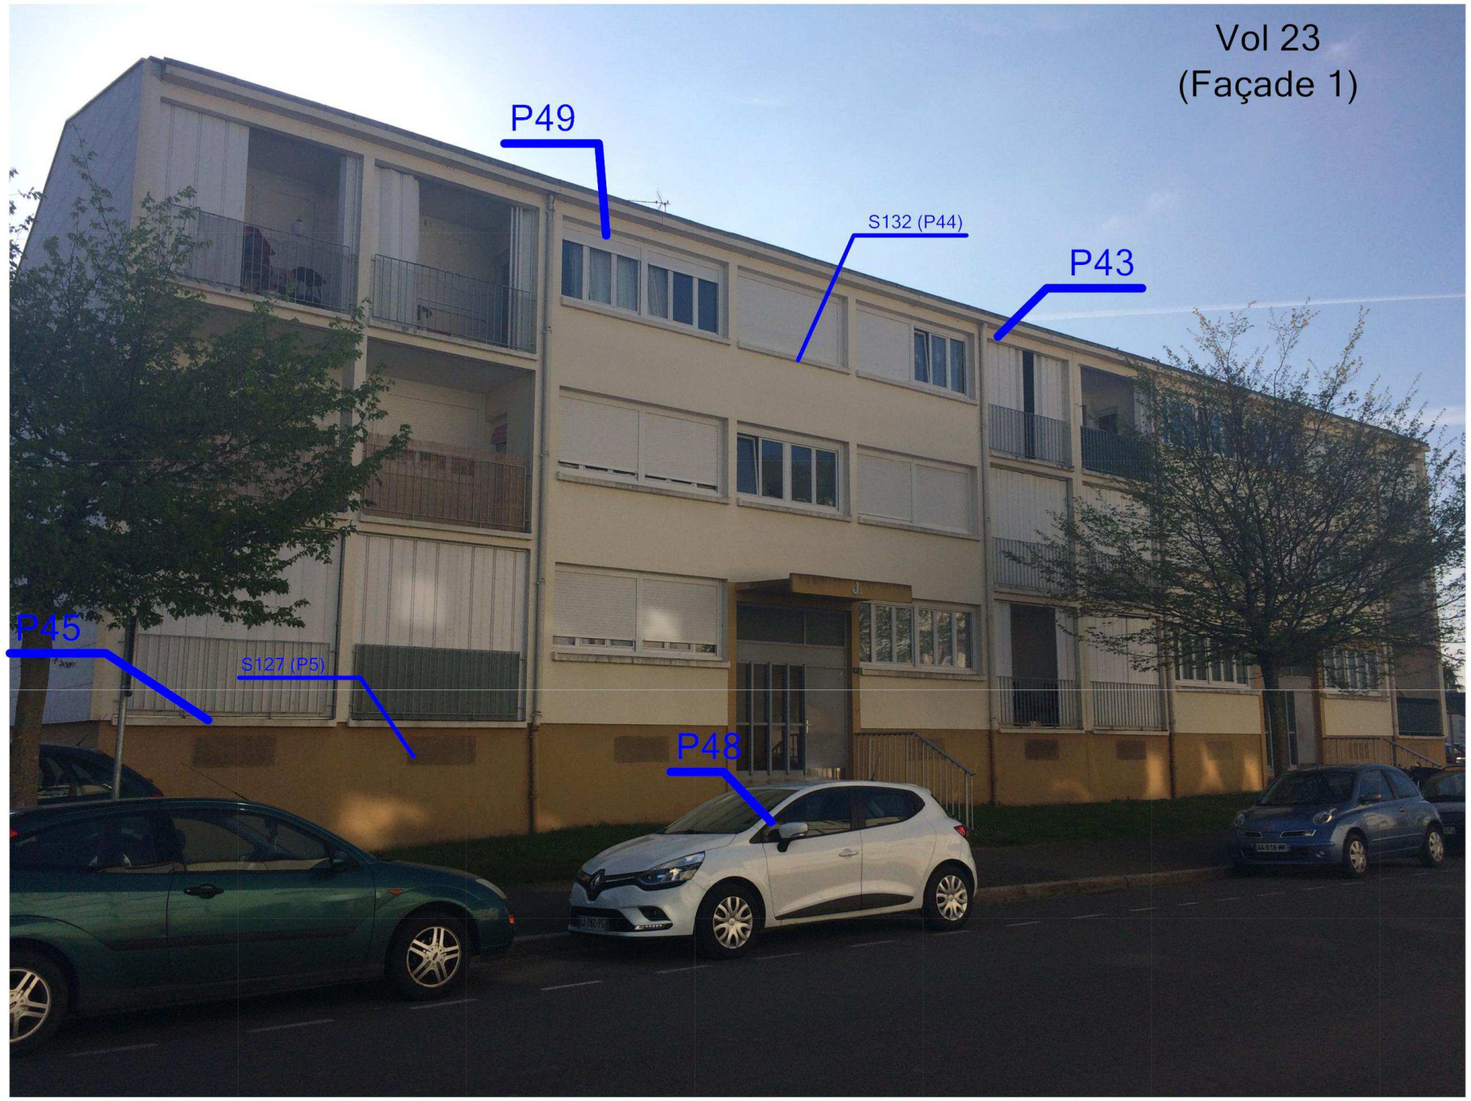

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

PIGNON GAUCHE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FH002020-1

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FH002020-1

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FH002020-1

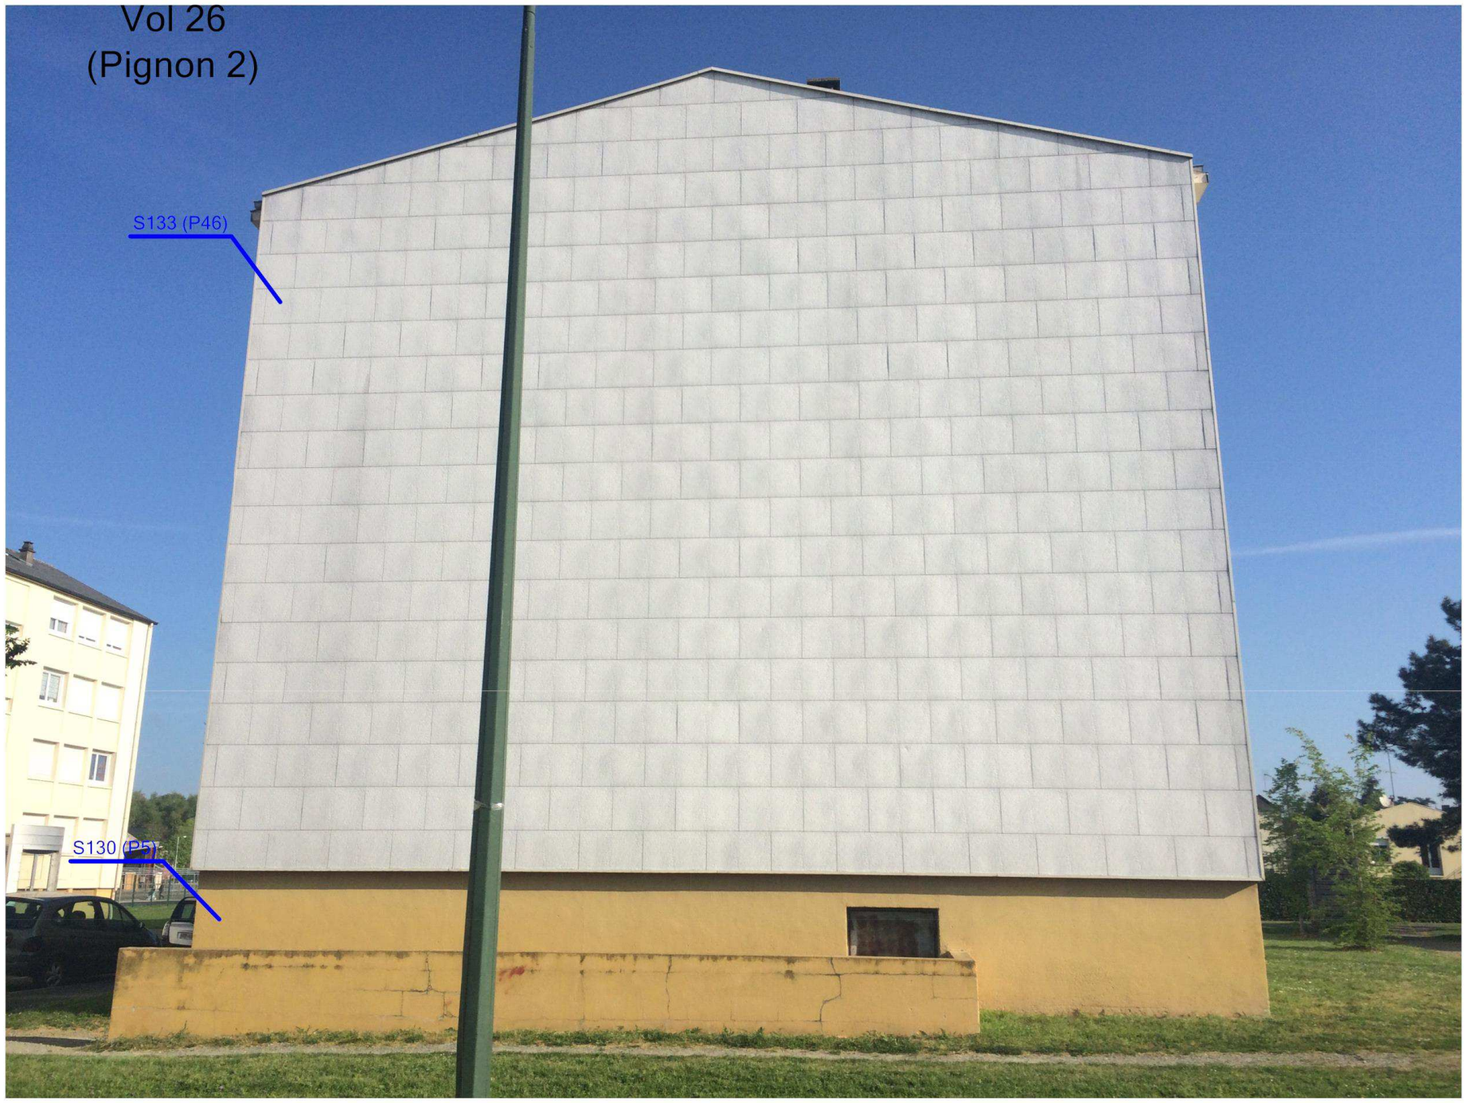

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002FH002020-1 n°26 - 1 (P26)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°26 - 2 (P26)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°20 - 1 (P20)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 1 (Sas 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°20 - 2 (P20)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 1 (Sas 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°21 - 1 (P21)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°21 - 2 (P21)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°22 - 1 (P22)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°22 - 2 (P22)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°23 - 1 (P23)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°23 - 2 (P23)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°24 - 1 (P24)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°24 - 2 (P24)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°25 - 1 (P25)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 1 (Sas 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°25 - 2 (P25)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 1 (Sas 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°26 - 3 (P26)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°26 - 4 (P26)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°27 - 1 (P27)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°27 - 2 (P27)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°28 - 1 (P28)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°28 - 2 (P28)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°29 - 1 (P29)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°29 - 2 (P29)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°30 - 1 (P30)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°30 - 2 (P30)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°31 - 1 (P31)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°31 - 2 (P31)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°32 - 1 (P32)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°32 - 2 (P32)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°33 - 1 (P33)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°33 - 2 (P33)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°34 - 1 (P34)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 7 (Pc r+ 3)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002FH002020-1 n°34 - 2 (P34)	CAGE ESCALIER 37 - Vol 7 (Pc r+ 3)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002FH002020 n°1 - 1 (P1)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	Prélevement négatif
002FH002020 n°1 - 2 (P1)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	Prélevement négatif
002FH002020 n°2 - 1 (P2)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	Prélevement négatif
002FH002020 n°2 - 2 (P2)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	Prélevement négatif
002FH002020 n°3 - 1 (P3)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	Prélevement négatif
002FH002020 n°3 - 2 (P3)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	Prélevement négatif
002FH002020 n°4 - 1 (P4)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	Prélevement positif
002FH002020 n°4 - 2 (P4)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	Prélevement positif
002FH002020 n°5 - 1 (P5)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 4 (Extérieur 2)	Prélevement négatif
002FH002020 n°5 - 2 (P5)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 4 (Extérieur 2)	Prélevement négatif
002FH002020 n°6 - 1 (P6)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 4 (Extérieur 2)	Prélevement négatif
002FH002020 n°6 - 2 (P6)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 4 (Extérieur 2)	Prélevement négatif
002FH002020 n°7 - 1 (P7)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	Prélevement négatif
002FH002020 n°7 - 2 (P7)	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	Prélevement négatif
	CAGE ESCALIER 39 - Vol 10 (Pc r+ 4)	I2
	CAGE ESCALIER 39 - Vol 10 (Pc r+ 4)	I2

Référence	Localisation	Action
002FH002020-1 n°35 - 1 (P35)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°36 - 1 (P36)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°36 - 2 (P36)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°37 - 1 (P37)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°37 - 2 (P37)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°39 - 1 (P39)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°39 - 2 (P39)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°38 - 1 (P38)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°38 - 2 (P38)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°40 - 1 (P40)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°40 - 2 (P40)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Prélevement négatif
S107 - 1 (A107)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S108 - 1 (A108)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S109 - 1 (A109)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S110 - 1 (A110)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S111 - 1 (A111)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S112 - 1 (A112)	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S121 - 1 (A121)	Combles cage 39 - Vol 22 (Comble 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S122 - 1 (A122)	Combles cage 39 - Vol 22 (Comble 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S123 - 1 (A123)	Combles cage 39 - Vol 22 (Comble 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S124 - 1 (A124)	Combles cage 39 - Vol 22 (Comble 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S125 - 1 (A125)	Combles cage 39 - Vol 22 (Comble 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S126 - 1 (A126)	Combles cage 39 - Vol 22 (Comble 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002FH002020-1 n°44 - 1 (P44)	Façade arrière - Vol 25 (Façade 2)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°44 - 2 (P44)	Façade arrière - Vol 25 (Façade 2)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002FH002020-1 n°49 - 2 (P49)	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°49 - 1 (P49)	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°43 - 1 (P43)	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°43 - 2 (P43)	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°48 - 1 (P48)	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°48 - 2 (P48)	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°45 - 1 (P45)	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°45 - 2 (P45)	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°49 - 3 (P49)	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°49 - 4 (P49)	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
S113 - 1 (A113)	Masse - Vol 20 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature
002FH002020-1 n°41 - 1 (P41)	Masse - Vol 21 (Masse)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°41 - 2 (P41)	Masse - Vol 21 (Masse)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°42 - 1 (P42)	Masse - Vol 21 (Masse)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°42 - 2 (P42)	Masse - Vol 21 (Masse)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°47 - 1 (P47)	Masse - Vol 21 (Masse)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°47 - 2 (P47)	Masse - Vol 21 (Masse)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002FH002020-1 n°46 - 1 (P46)	Pignon gauche - Vol 24 (Pignon 1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°46 - 2 (P46)	Pignon gauche - Vol 24 (Pignon 1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002FH002020-1 n°8 - 1 (P8)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°8 - 2 (P8)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°9 - 1 (P9)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement positif
002FH002020-1 n°9 - 2 (P9)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement positif
	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	I1
002FH002020-1 n°10 - 1 (P10)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°10 - 2 (P10)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°11 - 1 (P11)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°11 - 2 (P11)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°12 - 1 (P12)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°12 - 2 (P12)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°13 - 1 (P13)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°13 - 2 (P13)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°14 - 1 (P14)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°14 - 2 (P14)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°15 - 1 (P15)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°15 - 2 (P15)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°16 - 1 (P16)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°16 - 2 (P16)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°17 - 1 (P17)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°17 - 2 (P17)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°18 - 1 (P18)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°18 - 2 (P18)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°19 - 1 (P19)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002020-1 n°19 - 2 (P19)	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	Prélevement négatif

002FH002020 n°1 - 1 (P1)

002FH002020 n°1 - 2 (P1)

002FH002020 n°2 - 1 (P2)

002FH002020 n°2 - 2 (P2)

002FH002020 n°3 - 1 (P3)

002FH002020 n°3 - 2 (P3)

002FH002020 n°4 - 1 (P4)

002FH002020 n°4 - 2 (P4)

002FH002020 n°5 - 1 (P5)

002FH002020 n°5 - 2 (P5)

002FH002020 n°6 - 1 (P6)

002FH002020 n°6 - 2 (P6)

002FH002020 n°7 - 1 (P7)

002FH002020 n°7 - 2 (P7)

002FH002020-1 n°26 - 1 (P26)

002FH002020-1 n°26 - 2 (P26)

002FH002020-1 n°49 - 2 (P49)

002FH002020-1 n°49 - 1 (P49)

002FH002020-1 n°35 - 1

002FH002020-1 n°8 - 1 (P8)

002FH002020-1 n°8 - 2 (P8)

002FH002020-1 n°9 - 1 (P9)

002FH002020-1 n°9 - 2 (P9)

I1 - 1

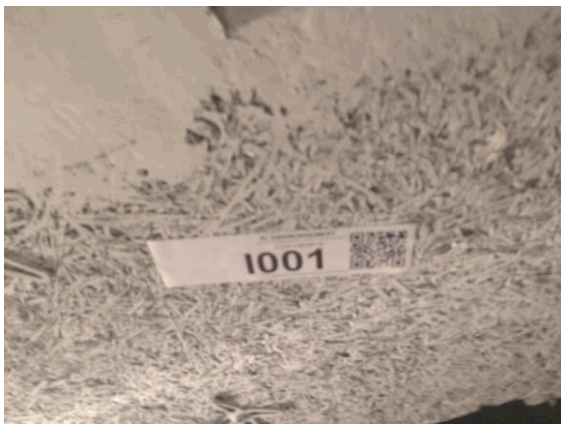

002FH002020-1 n°10 - 1 (P10)

002FH002020-1 n°10 - 2 (P10)

002FH002020-1 n°11 - 1 (P11)

002FH002020-1 n°11 - 2 (P11)

002FH002020-1 n°12 - 1 (P12)

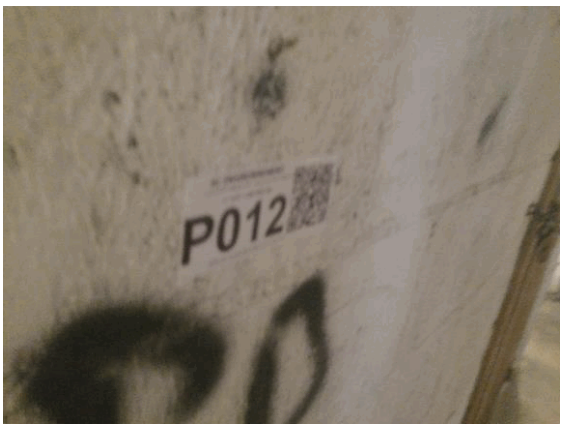

002FH002020-1 n°12 - 2 (P12)

002FH002020-1 n°13 - 1 (P13)

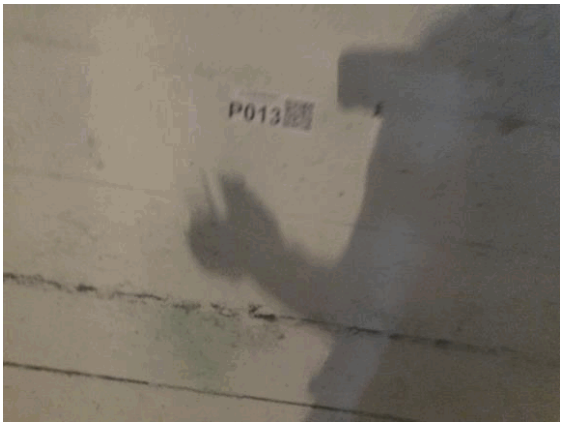

002FH002020-1 n°13 - 2 (P13)

002FH002020-1 n°14 - 1 (P14)

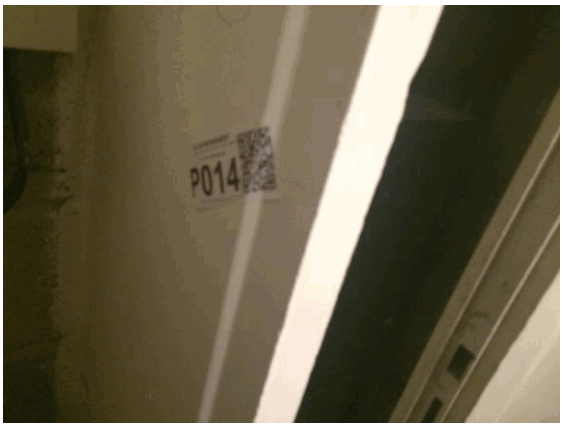

002FH002020-1 n°14 - 2 (P14)

002FH002020-1 n°15 - 1 (P15)

002FH002020-1 n°15 - 2 (P15)

002FH002020-1 n°16 - 1 (P16)

002FH002020-1 n°16 - 2 (P16)

002FH002020-1 n°17 - 1 (P17)

002FH002020-1 n°17 - 2 (P17)

002FH002020-1 n°18 - 1 (P18)

002FH002020-1 n°18 - 2 (P18)

002FH002020-1 n°19 - 1 (P19)

002FH002020-1 n°19 - 2 (P19)

002FH002020-1 n°20 - 1 (P20)

002FH002020-1 n°20 - 2 (P20)

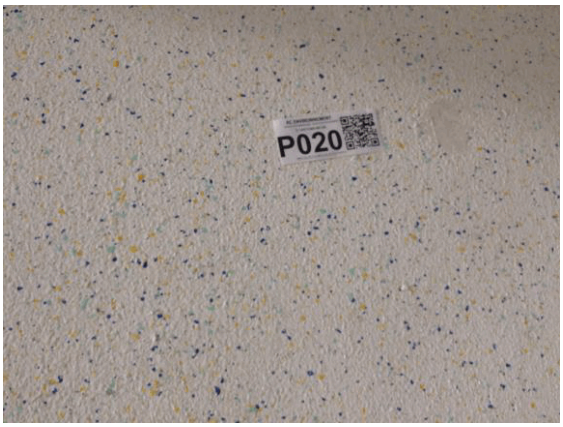

002FH002020-1 n°21 - 1 (P21)

002FH002020-1 n°21 - 2 (P21)

002FH002020-1 n°22 - 1 (P22)

002FH002020-1 n°22 - 2 (P22)

002FH002020-1 n°23 - 1 (P23)

002FH002020-1 n°23 - 2 (P23)

002FH002020-1 n°24 - 1 (P24)

002FH002020-1 n°24 - 2 (P24)

002FH002020-1 n°25 - 1 (P25)

002FH002020-1 n°25 - 2 (P25)

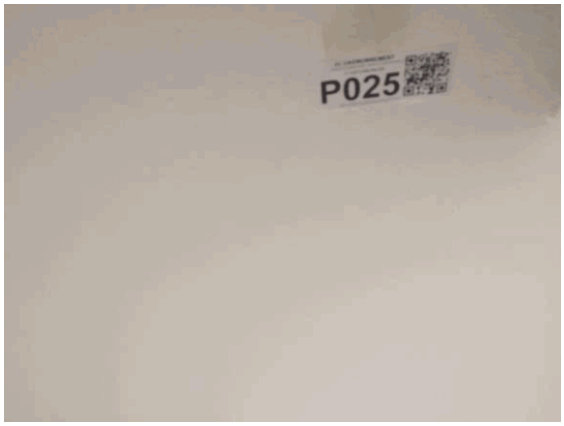

002FH002020-1 n°26 - 3 (P26)

002FH002020-1 n°26 - 4 (P26)

002FH002020-1 n°27 - 1 (P27)

002FH002020-1 n°27 - 2 (P27)

002FH002020-1 n°28 - 1 (P28)

002FH002020-1 n°28 - 2 (P28)

002FH002020-1 n°29 - 1 (P29)

002FH002020-1 n°29 - 2 (P29)

002FH002020-1 n°30 - 1 (P30)

002FH002020-1 n°30 - 2 (P30)

002FH002020-1 n°31 - 1 (P31)

002FH002020-1 n°31 - 2 (P31)

002FH002020-1 n°32 - 1 (P32)

002FH002020-1 n°32 - 2 (P32)

002FH002020-1 n°33 - 1 (P33)

002FH002020-1 n°33 - 2 (P33)

002FH002020-1 n°34 - 1 (P34)

002FH002020-1 n°34 - 2 (P34)

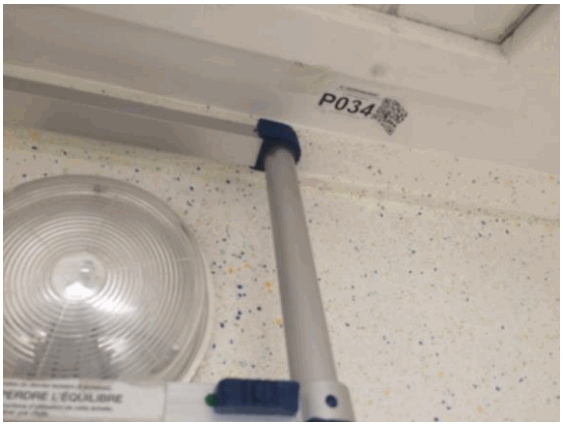

I2 - 2

002FH002020-1 n°35 - 1 (P35)

002FH002020-1 n°36 - 1 (P36)

002FH002020-1 n°36 - 2 (P36)

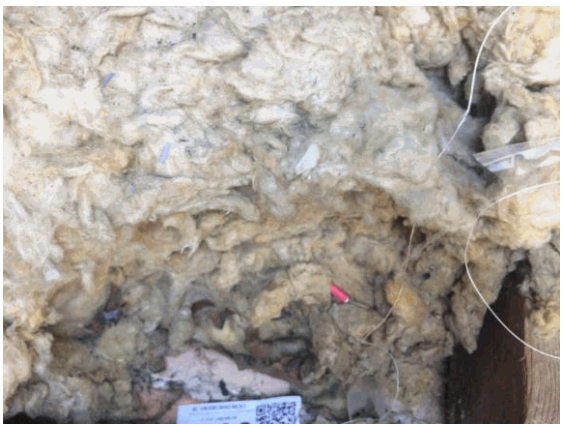

002FH002020-1 n°37 - 1 (P37)

002FH002020-1 n°37 - 2 (P37)

002FH002020-1 n°39 - 1 (P39)

002FH002020-1 n°39 - 2 (P39)

002FH002020-1 n°38 - 1 (P38)

002FH002020-1 n°38 - 2 (P38)

002FH002020-1 n°40 - 1 (P40)

002FH002020-1 n°40 - 2 (P40)

S107 - 1 (A107)

S108 - 1 (A108)

S109 - 1 (A109)

S110 - 1 (A110)

S111 - 1 (A111)

S112 - 1 (A112)

S113 - 1 (A113)

S121 - 1 (A121)

S122 - 1 (A122)

S123 - 1 (A123)

S124 - 1 (A124)

S125 - 1 (A125)

S126 - 1 (A126)

002FH002020-1 n°41 - 1 (P41)

002FH002020-1 n°41 - 2 (P41)

002FH002020-1 n°42 - 1 (P42)

002FH002020-1 n°42 - 2 (P42)

002FH002020-1 n°43 - 1 (P43)

002FH002020-1 n°43 - 2 (P43)

002FH002020-1 n°44 - 1 (P44)

002FH002020-1 n°44 - 2 (P44)

002FH002020-1 n°47 - 1 (P47)

002FH002020-1 n°47 - 2 (P47)

002FH002020-1 n°48 - 1 (P48)

002FH002020-1 n°48 - 2 (P48)

002FH002020-1 n°45 - 1 (P45)

002FH002020-1 n°45 - 2 (P45)

002FH002020-1 n°46 - 1 (P46)

002FH002020-1 n°46 - 2 (P46)

002FH002020-1 n°49 - 3 (P49)

002FH002020-1 n°49 - 4 (P49)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002FH002020 n°1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture décoratives - -	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	
002FH002020 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment - Porteur, en partie basse -	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	
002FH002020 n°3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage - gris -	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	
002FH002020 n°4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) - grise -	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	
002FH002020 n°5	Façades	Murs	Enduit ciment - -	CAGE ESCALIER 39 - Vol 4 (Extérieur 2)	
002FH002020 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières + peinture non séparable - -	CAGE ESCALIER 39 - Vol 4 (Extérieur 2)	
002FH002020 n°7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable - -	CAGE ESCALIER 39 - Vol 3 (Sas 2)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit gris en vrac hétérogène - -	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable - Joints entre panneaux fibralith -	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène + peinture - Sous face escalier -	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peinture - Porteur aspect gratté -	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable - Scellement parpaings -	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable - Porteur brut -	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison carreaux de plâtre -	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	
P15	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux multicolore avec poussières + matériau fibreux blanc non séparable - Laine marron -	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	
P16	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau noir en mousse + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Enduit, blanc -	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	

P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Platreux -	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable - Ciment -	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple gris + peintures multiples en faible quantité non séparable - -	Sous sol - Vol 11 (PC R-1)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - Porteur, en partie haute -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 1 (Sas 1)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - Cloisons briques -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène non séparable + peinture non séparable - Marbre escalier -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable - contremarche -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - Gris, en plinthe -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	
P25	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 1 (Sas 1)	
P26	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - Sous face escalier -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - Gaines techniques -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Scellement parpaings -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige en vrac - Scellement briques gaines techniques -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + matériau gris + peintures multiples - Joints entre marche et porteur -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc - -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - Menuiseries alu -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	
P33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable - 4x4 beige -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 5 (Pc rdc 1)	

P34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - Plafond dernier étage -	CAGE ESCALIER 37 - Vol 7 (Pc r+ 3)	
P35	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable - Laine de verre + pare vapeur -	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	
P36	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact blanc avec poussières - Scellement briques -	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit compact blanc - -	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	
P38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - VMC -	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	
P39	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac non séparable + peinture avec poussières non séparable - Lucarne -	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - Briques cheminée -	Combles cage 37 - Vol 19 (Comble 1)	
P41	Voies et réseaux divers	Trottoir	Enduit gris hétérogène - -	Masse - Vol 21 (Masse)	
P42	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 - -	Masse - Vol 21 (Masse)	
P43	Façades	Murs	Enduit gris + matériau beige hétérogène non séparable + peintures multiples - beige -	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)	
P44	Façades	Appui de fenêtre	Enduit compact gris hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples - -	Façade arrière - Vol 25 (Façade 2)	
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit gris hétérogène + matériau beige en vrac non séparable + peinture - balcon -	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)	
P46	Façades	Bardages	Matériau compact blanc + peinture non séparable + polystyrène expansé (billes) - bardage + isolation -	Pignon gauche - Vol 24 (Pignon 1)	
P47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + peinture - Extérieur -	Masse - Vol 21 (Masse)	
P48	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - rebouchage sous menuiserie -	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)	
P49	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc - -	Façade avant - Vol 23 (Façade 1)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-47389 EN DATE DU 27/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-25543
Echantillon ITGA : IT071703-47389
Reçu au laboratoire le : 15/03/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 3 (Sas 2)

Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Peintures multiples + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-47390 EN DATE DU 27/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-25543
Echantillon ITGA : IT071703-47390
Reçu au laboratoire le : 15/03/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (Sas 2)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peintures multiples non séparable	META le 27/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-47391 EN DATE DU 27/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-25543
Echantillon ITGA : IT071703-47391
Reçu au laboratoire le : 15/03/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 3 (Sas 2)

Description ITGA	Colle grise / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise non séparable + matériau gris en vrac	META le 27/03/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Céline Blin - Analyste MET

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-47392 EN DATE DU 27/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-25543
Echantillon ITGA : IT071703-47392
Reçu au laboratoire le : 15/03/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 3 (Sas 2)

Description ITGA	Colle grise / Matériau compact beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise non séparable + matériau compact beige	META le 25/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-47393 EN DATE DU 27/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-25543
Echantillon ITGA : IT071703-47393
Reçu au laboratoire le : 15/03/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020005 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 4 (Extérieur 2)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 27/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-47394 EN DATE DU 27/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-25543
Echantillon ITGA : IT071703-47394
Reçu au laboratoire le : 15/03/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020006 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté / Vol 4 (Extérieur 2)

Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple blanc avec poussières + peinture non séparable	META le 27/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-47395 EN DATE DU 27/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-25543
Echantillon ITGA : IT071703-47395
Reçu au laboratoire le : 15/03/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint vitrier beige / Vol 3 (Sas 2)

Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peinture / Bois

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 27/03/2017	Amiante non détecté	---	1
Bois	Non analysé			

Validé par : Céline Blin - Analyste MET

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40581 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40581
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 11 (PC R-1)

Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40582 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40582
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 11 (PC R-1)

Description ITGA	Enduit beige en vrac / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META le 25/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40583 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40583
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 11 (PC R-1)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peinture	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40584 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40584
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 11 (PC R-1)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peinture	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40585 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40585
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 11 (PC R-1)

Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40586 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40586
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 11 (PC R-1)

Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40587 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40587
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 11 (PC R-1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40588 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40588
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1015 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 11 (PC R-1)

Description ITGA	Matériau fibreux multicolore avec poussières / Matériau fibreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux multicolore avec poussières + matériau fibreux blanc non séparable	MOLP le 25/04/2017	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40589 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40589
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1016 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 11 (PC R-1)

Description ITGA	Matériau noir en mousse / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau noir en mousse + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40592 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40592
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 11 (PC R-1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40595 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40595
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 11 (PC R-1)

Description ITGA	Enduit gris en vrac / Matériau beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40597 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40597
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1019 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté / Vol 11 (PC R-1)

Description ITGA	Matériau souple gris / Peintures multiples en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple gris + peintures multiples en faible quantité non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40599 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40599
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1020 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Sas 1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40600 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40600
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Pc rdc 1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40601 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40601
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 5 (Pc rdc 1)

Description ITGA	Colle grise hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40602 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40602
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (Pc rdc 1)

Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40603 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40603
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1024 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (Pc rdc 1)

Description ITGA	Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40604 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40604
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1025 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Sas 1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40605 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40605
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1026 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 5 (Pc rdc 1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40606 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40606
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1027 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 5 (Pc rdc 1)

Description ITGA	Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40607 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40607
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1028 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (Pc rdc 1)

Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40608 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40608
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1029 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Pc rdc 1)

Description ITGA	Enduit beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit beige en vrac	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40609 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40609
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1030 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (Pc rdc 1)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Matériau gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + matériau gris + peintures multiples	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40610 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40610
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1031 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté / Vol 5 (Pc rdc 1)

Description ITGA	Matériau souple blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple blanc	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40611 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40611
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1032 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joints d'étanchéïté / Vol 5 (Pc rdc 1)

Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40612 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40612
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1033 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 5 (Pc rdc 1)

Description ITGA	Colle grise hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40613 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40613
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1034 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 7 (Pc r+ 3)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40614 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40614
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1035 / Toiture et étanchéité / Elément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 19 (Comble 1)

Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40615 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40615
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1036 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 19 (Comble 1)

Description ITGA	Enduit compact blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact blanc avec poussières	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40616 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40616
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1037 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 19 (Comble 1)

Description ITGA	Enduit compact blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact blanc	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40617 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40617
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1038 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 19 (Comble 1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40618 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40618
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1039 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 19 (Comble 1)

Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peinture avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau beige en vrac non séparable + peinture avec poussières non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40619 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40619
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1040 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 19 (Comble 1)

Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40620 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40620
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1041 / Voies et réseaux divers / Trottoir / Scellement bordures / Vol 21 (Masse)

Description ITGA	Enduit gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris hétérogène	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40621 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40621
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1042 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume / Vol 21 (Masse)

Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40622 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40622
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1043 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 23 (Façade 1)

Description ITGA	Enduit gris / Matériau beige hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris + matériau beige hétérogène non séparable + peintures multiples	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40623 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40623
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1044 / Façades / Appui de fenêtre / enduits ciment / Vol 25 (Façade 2)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40624 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40624
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1045 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 23 (Façade 1)

Description ITGA	Enduit gris hétérogène / Matériau beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris hétérogène + matériau beige en vrac non séparable + peinture	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40625 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40625
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1046 / Façades / Bardages / Plaques fibres / Vol 24 (Pignon 1)

Description ITGA	Matériau compact blanc / Peinture / Polystyrène expansé (billes)

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact blanc + peinture non séparable + polystyrène expansé (billes)	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40626 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40626
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1047 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 21 (Masse)

Description ITGA	Matériau compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris + peinture	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40627 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40627
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1048 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 23 (Façade 1)

Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-40628 EN DATE DU 26/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37515
Echantillon ITGA : IT071704-40628
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002020-1
Dossier client	_0005500007_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002FH002020-1049 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté / Vol 23 (Façade 1)

Description ITGA	Matériau souple blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple blanc	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
