Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LA COURTILLE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_0007400002_
Date du repérage :	02/02/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Présence d'amiante	Oui
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_0007400002_
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	PALLUEL Matthieu
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)
Date de repérage	02/02/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 3879 V2
Délivré le : 28/04/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 10/02/2017
A Riorges, le 10/02/2017



Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

RDC - Vol 1 (Porche 1)	RDC - Vol 2 (PC RDC)
RDC - Vol 3 (Porche 2)	RDC - Vol 4 (Cave)
RDC - Vol 5 (Local poubelle)	RDC - Vol 6 (Local à velo)
Etages - Vol 7 (PC R+1)	Etages - Vol 8 (PC R+2)
Etages - Vol 9 (PC R+3)	Etages - Vol 10 (PC R+4)
Combles - Vol 11 (Comble)	Toiture - Vol 12 (Toiture)
Masse - Vol 13 (Masse)	Façade avant - Vol 14 (Façade 1)
Façade arrière - Vol 15 (Façade 2)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment.

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Façades	RDC	Vol 1 (Porche 1) - Vol 3 (Porche 2)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 (Porche 1) - Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (Porche 2) - Vol 4 (Cave) - Vol 5 (Local poubelle) - Vol 6 (Local à velo)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 1 (Porche 1) - Vol 2 (PC RDC)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (Porche 1) - Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (Porche 2) - Vol 4 (Cave) - Vol 5 (Local poubelle) - Vol 6 (Local à velo)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 2 (PC RDC) - Vol 4 (Cave) - Vol 6 (Local à velo)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 2 (PC RDC) - Vol 4 (Cave) - Vol 5 (Local poubelle) - Vol 6 (Local à velo)	
Parois verticales intérieures et enduits	Etages	Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (PC R+2) - Vol 9 (PC R+3) - Vol 10 (PC R+4)	
Plafond et faux-plafonds	Etages	Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (PC R+2) - Vol 9 (PC R+3) - Vol 10 (PC R+4)	

Revêtement de mur	Etages	Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (PC R+2) - Vol 9 (PC R+3) - Vol 10 (PC R+4)	
Revêtement de sol	Etages	Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (PC R+2) - Vol 9 (PC R+3) - Vol 10 (PC R+4)	
Conduits, canalisations et équipements	Etages	Vol 10 (PC R+4)	
Conduits, canalisations et équipements	Combles	Vol 11 (Comble)	
Parois verticales intérieures et enduits	Combles	Vol 11 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Combles	Vol 11 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 12 (Toiture)	
Voies et réseaux divers	Masse	Vol 13 (Masse)	
Façades	Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	
Façades	Façade arrière	Vol 15 (Façade 2)	

K — Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L — Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M — Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 6 (Local à velo)	Panneaux fibralith	Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs
Vol 4 (Cave)	Panneaux fibralith	Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs
Vol 5 (Local poubelle)	Panneaux fibralith	Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs
Vol 2 (PC RDC)	PVC	Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 7 (PC R+1)	PVC	Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 8 (PC R+2)	PVC	Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 9 (PC R+3)	PVC	Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 10 (PC R+4)	PVC	Aucun prélèvement à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 6 (Local à velo)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1
Vol 2 (PC RDC)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S2
Vol 10 (PC R+4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S3
Vol 2 (PC RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P1
Vol 7 (PC R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P1
Vol 8 (PC R+2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P1
Vol 9 (PC R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P1
Vol 10 (PC R+4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P1
Vol 2 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	S23
Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S24
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S49
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S50
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51

Q Réserves / Commentaires

Les bâtiments faisant l'objet des rapports 002LQ000836, 002LQ000837, 002LQ000838, 002LQ000839 sont mitoyens et présentent des similitudes d'ouvrage.
Après analyses, un prélèvement sur deux des joints plâtreux entre les panneaux de type fibralith est amiantés. Des analyses complémentaires pourront être réalisés dans chaque bâtiment afin de confirmer les résultats initiaux.
Sur les quatre bâtiments, un prélèvement de peinture décorative est positif.
- Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.
Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :
Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.
Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.
Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.
Les matériaux présents sous le bardage bois présent en façade.
Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.
Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.
Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées…)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 6 (Local à velo)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1	Résalisation d'un sondage		S1 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S2	Résalisation d'un sondage		S2 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etages	Vol 10 (PC R+4)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S3	Résalisation d'un sondage		S3 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
RDC	Vol 4 (Cave)	Conduit eau	Calorifugeage	S16	Trese + carton + ldv + enduit plâtre						Négatif sur document Prélèvement N°9 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 6 (Local à velo)	Conduit eau	Calorifugeage	S16	Trese + carton + ldv + enduit plâtre						Négatif sur document Prélèvement N°9 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 11 (Comble)	Conduit eau	Calorifugeage	S16	Trese + carton + ldv + enduit plâtre						Négatif sur document Prélèvement N°9 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Combles	Vol 11 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S49	Résalisation d'un sondage		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 11 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S50	Résalisation d'un sondage		S50 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 11 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Résalisation d'un sondage		S51 - 1				Présence sur document

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Porche 1)	Murs	Enduits projetés	S33							Négatif sur document Prélèvement N°27 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Porche 1)	Murs	Enduit ciment	S34	Partie haute						Négatif sur document Prélèvement N°28 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 3 (Porche 2)	Murs	Enduit ciment	S34	Partie haute						Négatif sur document Prélèvement N°28 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S34	Partie haute						Négatif sur document Prélèvement N°28 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Façade arrière	Vol 15 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	S34	Partie haute						Négatif sur document Prélèvement N°28 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Porche 1)	Murs	Enduit ciment	S35	Partie basse						Négatif sur document Prélèvement N°29 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 3 (Porche 2)	Murs	Enduit ciment	S35	Partie basse						Négatif sur document Prélèvement N°29 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S35	Partie basse						Négatif sur document Prélèvement N°29 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Façade arrière	Vol 15 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	S35	Partie basse						Négatif sur document Prélèvement N°29 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Porche 1)	Bardages	Plaques	S38	Verte						Négatif sur document Prélèvement N°32 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Bardages	Plaques	S38	Verte						Négatif sur document Prélèvement N°32 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Menuiseries	PVC	I2							Aucun prélèvement à la demande du client
Etages	Vol 7 (PC R+1)	Menuiseries	PVC	I2							Aucun prélèvement à la demande du client
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Menuiseries	PVC	I2							Aucun prélèvement à la demande du client
Etages	Vol 9 (PC R+3)	Menuiseries	PVC	I2							Aucun prélèvement à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 10 (PC R+4)	Menuiseries	PVC	I2							Aucun prélèvement à la demande du client
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S54	Appuis						Négatif sur document Prélèvement N°43 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Façade arrière	Vol 15 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	S54	Appuis						Négatif sur document Prélèvement N°43 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P1	Réalisation d'un prélevement	Peinture blanche tachetée verte	002LQ000839 n°1 - 1 - 002LQ000839 n°1 - 2	P1	Peintures multiples	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Peinture blanche tachetée verte	002LQ000839 n°1 - 1 - 002LQ000839 n°1 - 2	P1	Peintures multiples	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 7 (PC R+1)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S4 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Peinture blanche tachetée verte	002LQ000839 n°1 - 1 - 002LQ000839 n°1 - 2	P1	Peintures multiples	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S5 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Peinture blanche tachetée verte	002LQ000839 n°1 - 1 - 002LQ000839 n°1 - 2	P1	Peintures multiples	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 9 (PC R+3)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S6 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Peinture blanche tachetée verte	002LQ000839 n°1 - 1 - 002LQ000839 n°1 - 2	P1	Peintures multiples	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 10 (PC R+4)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S7 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Peinture blanche tachetée verte	002LQ000839 n°1 - 1 - 002LQ000839 n°1 - 2	P1	Peintures multiples	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 5 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S10	Partie basse du mur						Négatif sur document Prélèvement N°3 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 6 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S10	Partie basse du mur						Négatif sur document Prélèvement N°3 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 6 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S11	Rebouchage autour du conduit fibrociment						Négatif sur document Prélèvement N°4 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 6 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S12	Rebouchage autour du conduit gaz						Négatif sur document Prélèvement N°5 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 6 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S13	Rebouchage autour des menuiseries						Négatif sur document Prélèvement N°6 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 5 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S13	Rebouchage autour des menuiseries						Négatif sur document Prélèvement N°6 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 6 (Local à velo)	Menuiseries	Mastic vitrier	S14							Négatif sur document Prélèvement N°7 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 6 (Local à velo)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S15	Scellement parpaings						Négatif sur document Prélèvement N°8 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 4 (Cave)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S15	Scellement parpaings						Négatif sur document Prélèvement N°8 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 5 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S15	Scellement parpaings						Négatif sur document Prélèvement N°8 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S15	Scellement parpaings						Négatif sur document Prélèvement N°8 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 4 (Cave)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S18	Plâtre						Négatif sur document Prélèvement N°11 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S20	Cloisons gaines techniques						Négatif sur document Prélèvement N°13 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 7 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S20	Cloisons gaines techniques						Négatif sur document Prélèvement N°13 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S20	Cloisons gaines techniques						Négatif sur document Prélèvement N°13 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 9 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S20	Cloisons gaines techniques						Négatif sur document Prélèvement N°13 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 10 (PC R+4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S20	Cloisons gaines techniques						Négatif sur document Prélèvement N°13 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S21	Porteur						Négatif sur document Prélèvement N°14 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 7 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S21	Porteur						Négatif sur document Prélèvement N°14 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S21	Porteur						Négatif sur document Prélèvement N°14 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 9 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S21	Porteur						Négatif sur document Prélèvement N°14 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 10 (PC R+4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S21	Porteur						Négatif sur document Prélèvement N°14 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S22	Cloisonnement / Doublage						Négatif sur document Prélèvement N°15 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 7 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S22	Cloisonnement / Doublage						Négatif sur document Prélèvement N°15 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S22	Cloisonnement / Doublage						Négatif sur document Prélèvement N°15 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 9 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S22	Cloisonnement / Doublage						Négatif sur document Prélèvement N°15 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 10 (PC R+4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S22	Cloisonnement / Doublage						Négatif sur document Prélèvement N°15 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S27	Contremarche						Négatif sur document Prélèvement N°23 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 7 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S27	Contremarche						Négatif sur document Prélèvement N°23 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S27	Contremarche						Négatif sur document Prélèvement N°23 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 9 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S27	Contremarche						Négatif sur document Prélèvement N°23 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 10 (PC R+4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S27	Contremarche						Négatif sur document Prélèvement N°23 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Gaines et coffre verticaux	Bois	S28							Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Menuiseries	Joints d'étanchéité	S31	Porte d'entrée						Négatif sur document Prélèvement N°26 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 11 (Comble)	Menuiseries	Mastic vitrier	S45							Négatif sur document Prélèvement N°37 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S46	Cheminée						Négatif sur document Prélèvement N°38 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S47	VMC						Négatif sur document Prélèvement N°39 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S48	Pannes						Négatif sur document Prélèvement N°40 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 6 (Local à velo)	Faux plafonds	Joints plâtre	S9	Enre panneaux fibralith						Négatif sur document Prélèvement N°2 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 4 (Cave)	Faux plafonds	Joints plâtre	S9	Enre panneaux fibralith						Négatif sur document Prélèvement N°2 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 5 (Local poubelle)	Faux plafonds	Joints plâtre	S9	Enre panneaux fibralith						Négatif sur document Prélèvement N°2 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 6 (Local à velo)	Plafonds	Panneaux fibralith	I1							Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (Cave)	Plafonds	Panneaux fibralith	I1							Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs
RDC	Vol 5 (Local poubelle)	Plafonds	Panneaux fibralith	I1							Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	S23	Résalisation d'un sondage	Sous face escaliers					Présence sur document Prélèvement N°16 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 7 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S23	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S23	Sous face escaliers					Présence sur document Prélèvement N°16 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Plafonds	Enduit plâtre	S23	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S23	Sous face escaliers					Présence sur document Prélèvement N°16 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 9 (PC R+3)	Plafonds	Enduit plâtre	S23	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S23	Sous face escaliers					Présence sur document Prélèvement N°16 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Gaines et coffre horizontaux	Jonction entre panneaux	S29	Coffre plaques de plâtre						Négatif sur document Prélèvement N°24 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	S30							Négatif sur document Prélèvement N°25 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Porche 1)	Faux plafonds	Lambris métallique	S32							Négatif sur document Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le lambris sans sondages destructifs
RDC	Vol 3 (Porche 2)	Faux plafonds	Lambris métallique	S32							Négatif sur document Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le lambris sans sondages destructifs
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Faux plafonds	Bois	S39							Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S40	Laine de verre + pare vapeur						Négatif sur document Prélèvement N°33 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S41							Négatif sur document Prélèvement N°1 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000838
Etages	Vol 10 (PC R+4)	Plafonds	Enduit plâtre	S42	Dernier étage						Négatif sur document Prélèvement N°34 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S24	Résalisation d'un sondage	Plinthe carrelage rouge					Présence sur document Prélèvement N°20 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24	Plinthe carrelage rouge					Présence sur document Prélèvement N°20 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 7 (PC R+1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24	Plinthe carrelage rouge					Présence sur document Prélèvement N°20 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24	Plinthe carrelage rouge					Présence sur document Prélèvement N°20 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 9 (PC R+3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24	Plinthe carrelage rouge					Présence sur document Prélèvement N°20 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 10 (PC R+4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24	Plinthe carrelage rouge					Présence sur document Prélèvement N°20 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 1 (Porche 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S37	Carrelage beige						Négatif sur document Prélèvement N°31 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S37	Carrelage beige						Négatif sur document Prélèvement N°31 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 6 (Local à velo)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S8							Négatif sur document Prélèvement N°1 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 4 (Cave)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S8							Négatif sur document Prélèvement N°1 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 5 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S8							Négatif sur document Prélèvement N°1 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 5 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Rebouchage autour de conduits	S17							Négatif sur document Prélèvement N°10 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S19	Gaines techniques						Négatif sur document Prélèvement N°12 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 7 (PC R+1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S19	Gaines techniques						Négatif sur document Prélèvement N°12 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S19	Gaines techniques						Négatif sur document Prélèvement N°12 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 9 (PC R+3)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S19	Gaines techniques						Négatif sur document Prélèvement N°12 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 10 (PC R+4)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S19	Gaines techniques						Négatif sur document Prélèvement N°12 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S25	Mosaïque rouge						Négatif sur document Prélèvement N°21 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 7 (PC R+1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S25	Mosaïque rouge						Négatif sur document Prélèvement N°21 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S25	Mosaïque rouge						Négatif sur document Prélèvement N°21 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 9 (PC R+3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S25	Mosaïque rouge						Négatif sur document Prélèvement N°21 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Etages	Vol 10 (PC R+4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S25	Mosaïque rouge						Négatif sur document Prélèvement N°21 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S26	Plaques marbre escalier						Négatif sur document Prélèvement N°22 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 1 (Porche 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S36	Carrelage beige						Négatif sur document Prélèvement N°30 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S36	Carrelage beige						Négatif sur document Prélèvement N°30 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
RDC	Vol 3 (Porche 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S36	Carrelage beige						Négatif sur document Prélèvement N°30 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture	Vol 12 (Toiture)	Ardoises	Ardoises composites	S43							Négatif sur document Prélèvement N°35 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 11 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S44	Laine de verre + pare vapeur						Négatif sur document Prélèvement N°36 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Masse	Vol 13 (Masse)	Trottoir	Scellement bordures	S52							Négatif sur document Prélèvement N°41 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836
Masse	Vol 13 (Masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	S53							Négatif sur document Prélèvement N°42 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002LQ000836

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	RDC	RDC - MPCA Plafond et faux-plafonds
	RDC	RDC - MPCA Revêtement de mur
	RDC	RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Etages	Etages - Plan de repérage - Actions menées
	Etages	Etages - MPCA Toutes catégories confondues
	Etages	Etages - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Etages	Etages - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Etages	Etages - MPCA Revêtement de mur
	Etages	Etages - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Masse	Masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000839

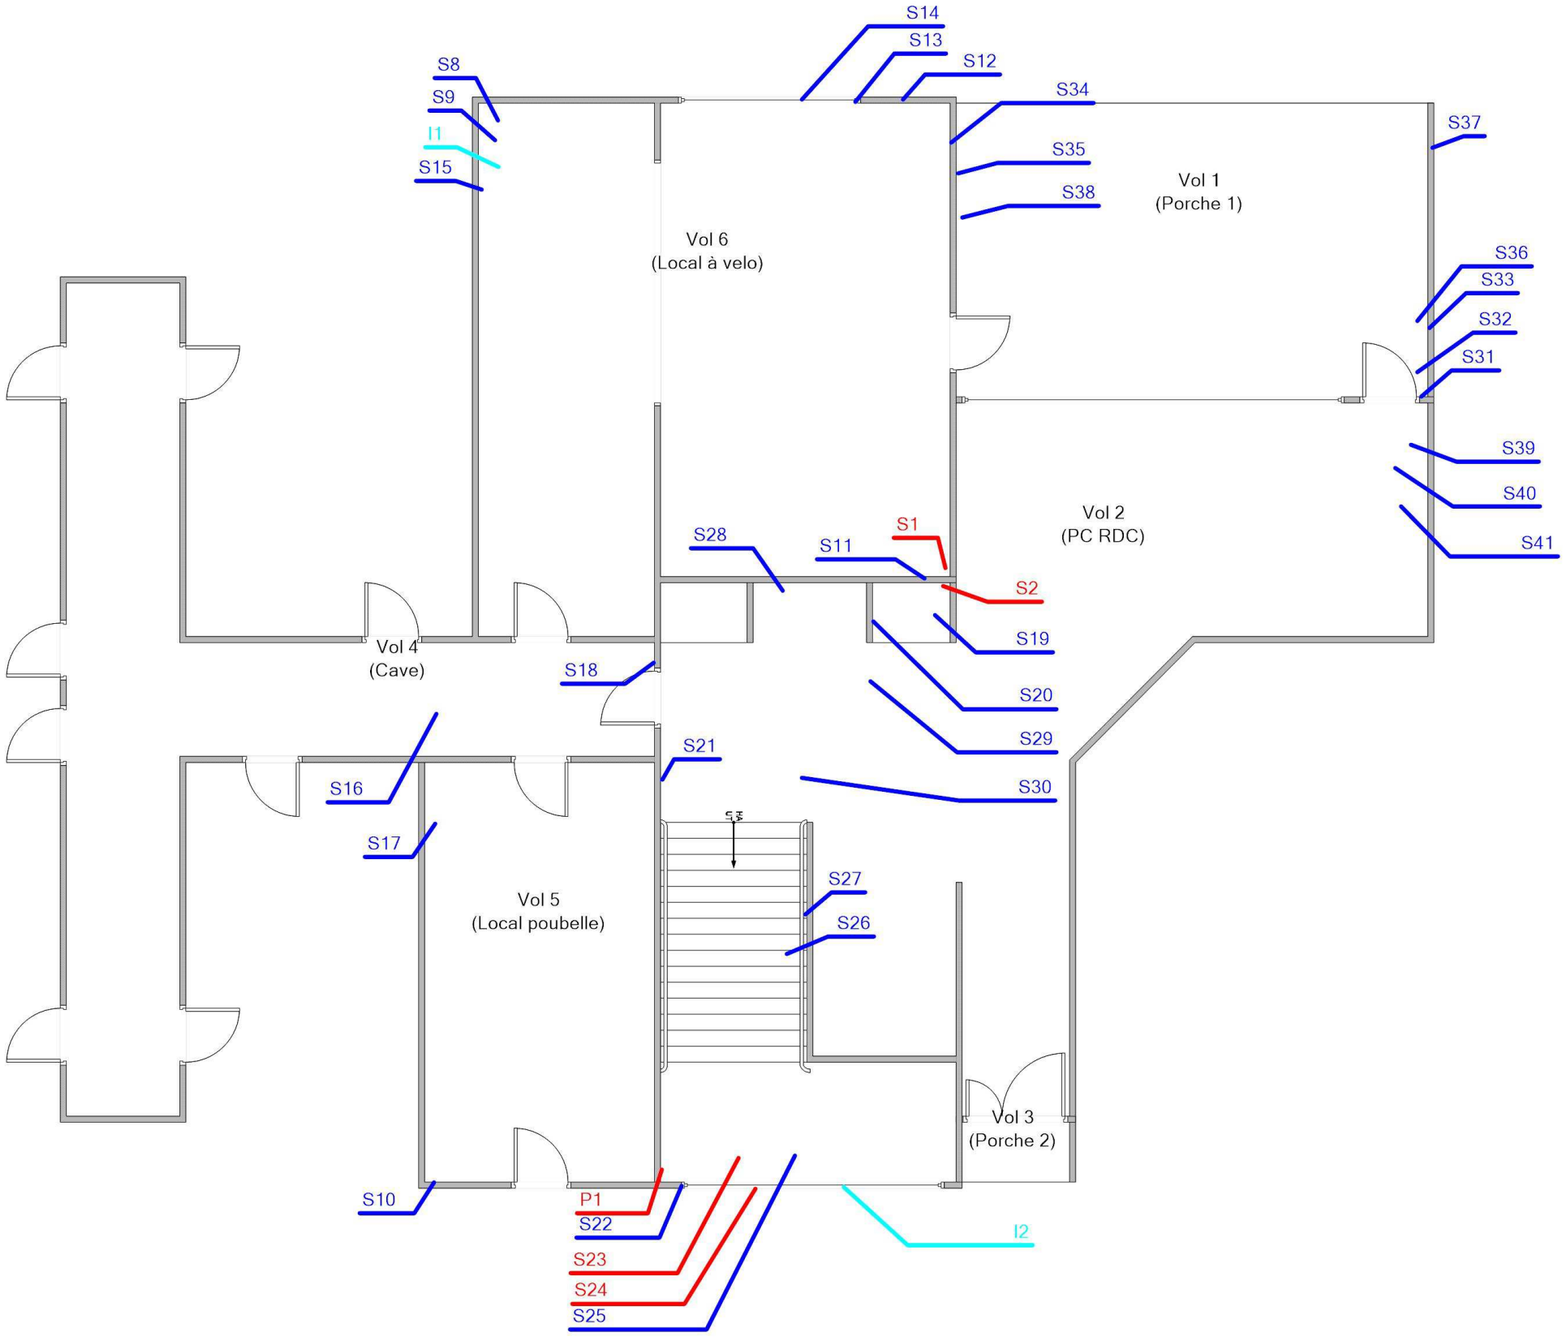

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002LQ000839

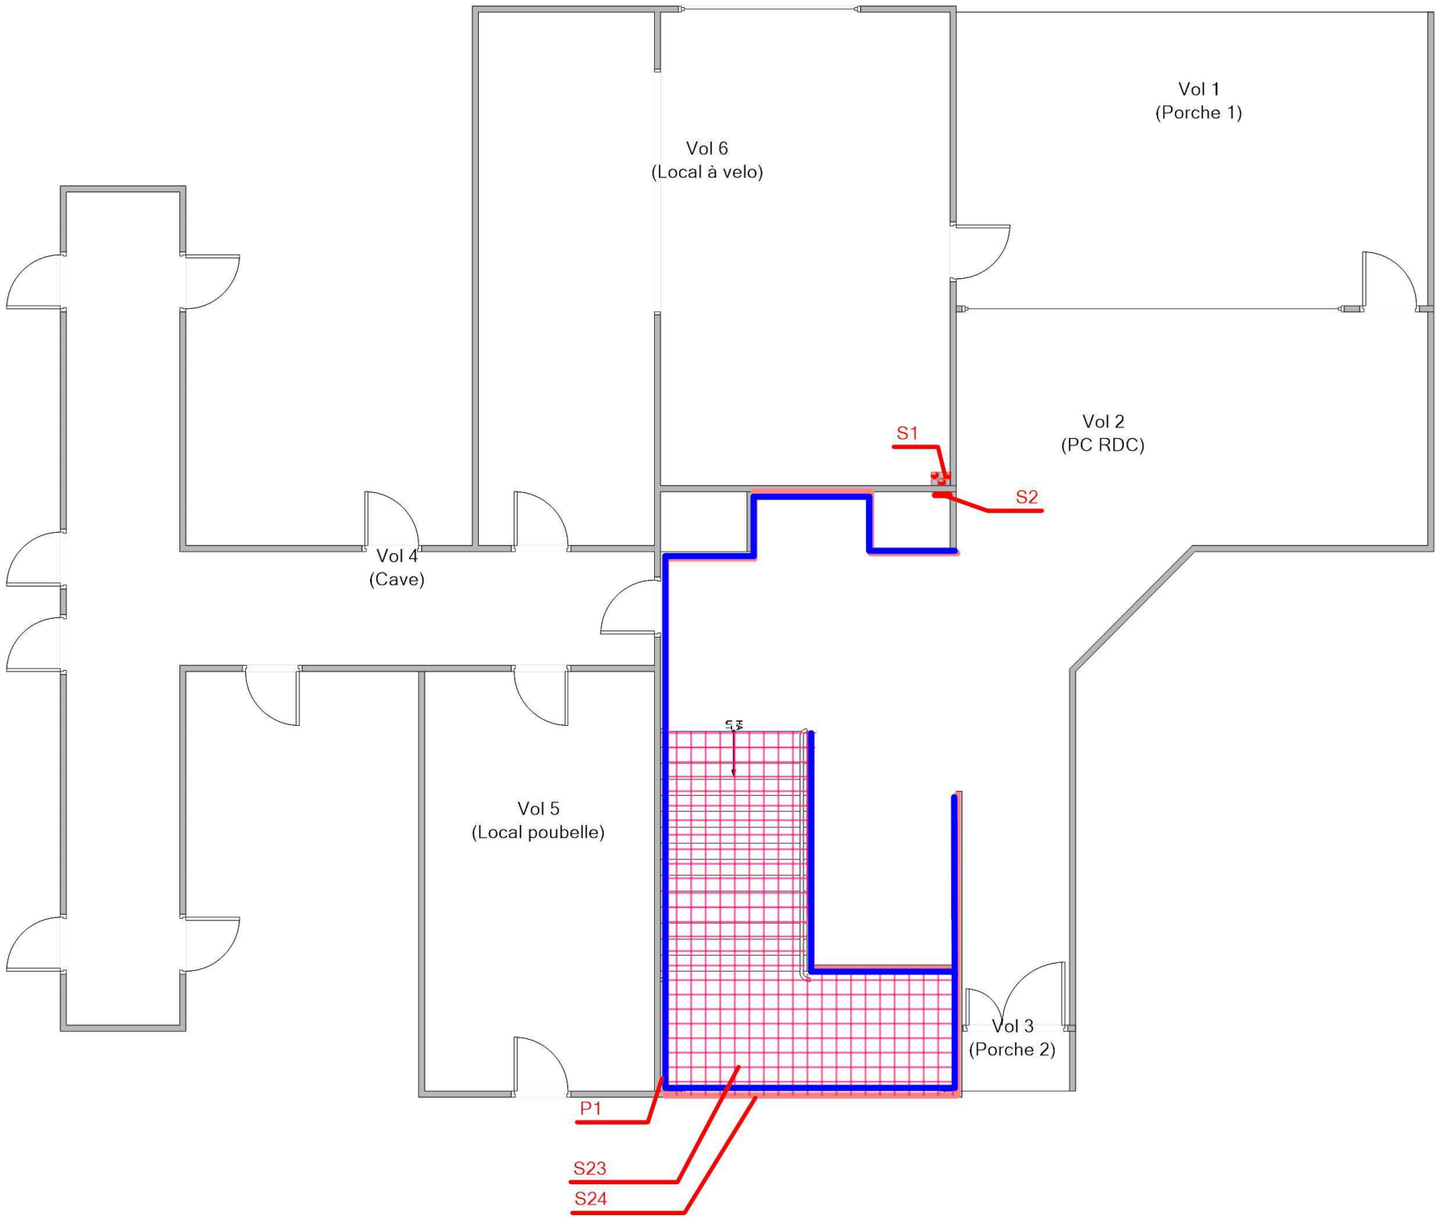

Légende

	S24: Colle de carrelage (plinthe)
	S23: Enduit plâtre
	S1: Conduit en fibres-ciment
	P1 : Peinture décoratives
	S2: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002LQ000839

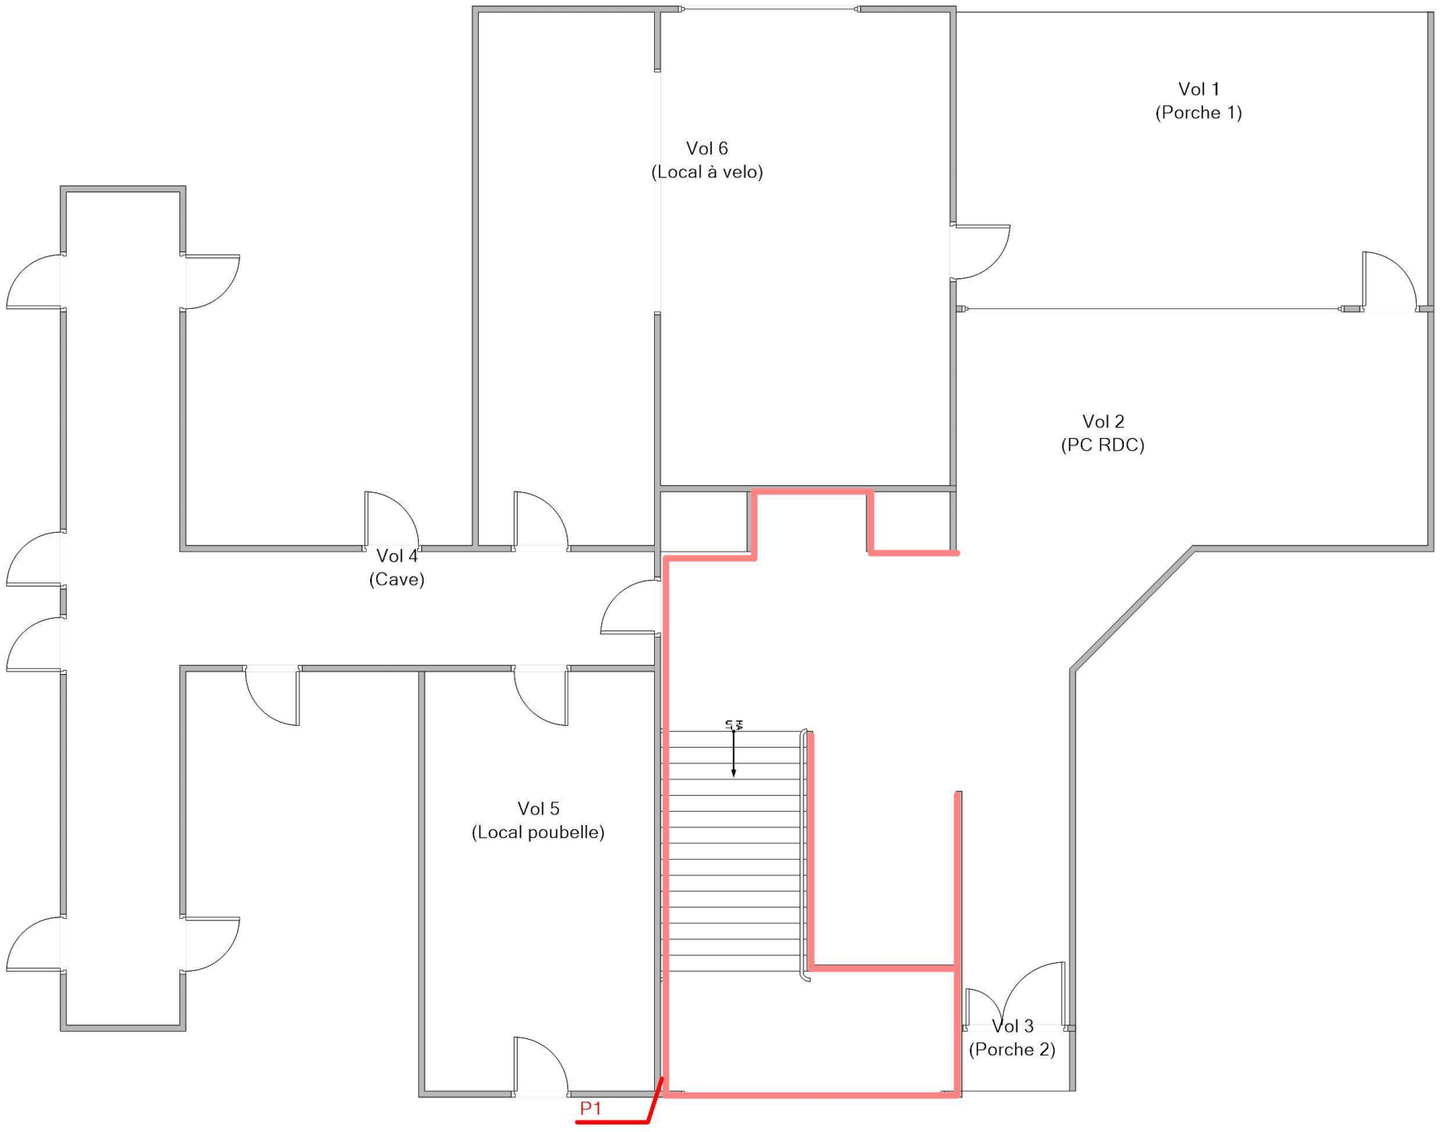

Légende

	P1 : Peinture décoratives

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

RDC - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002LQ000839

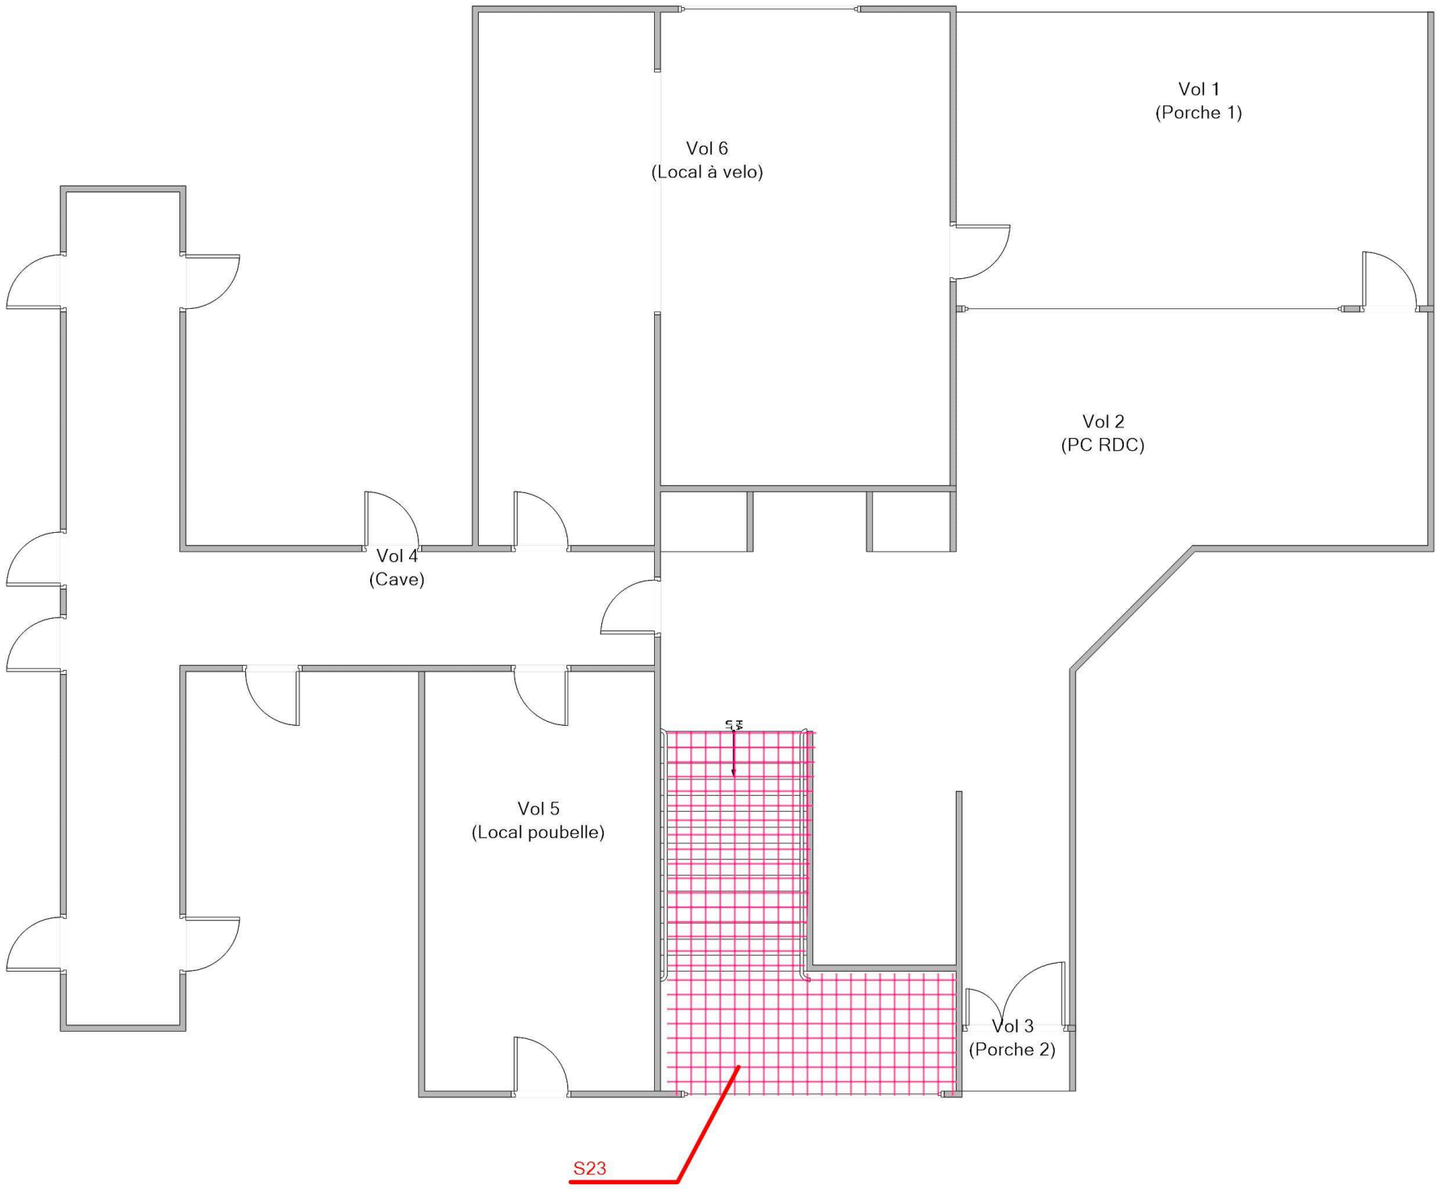

Légende

	S23: Enduit plâtre

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

RDC - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002LQ000839

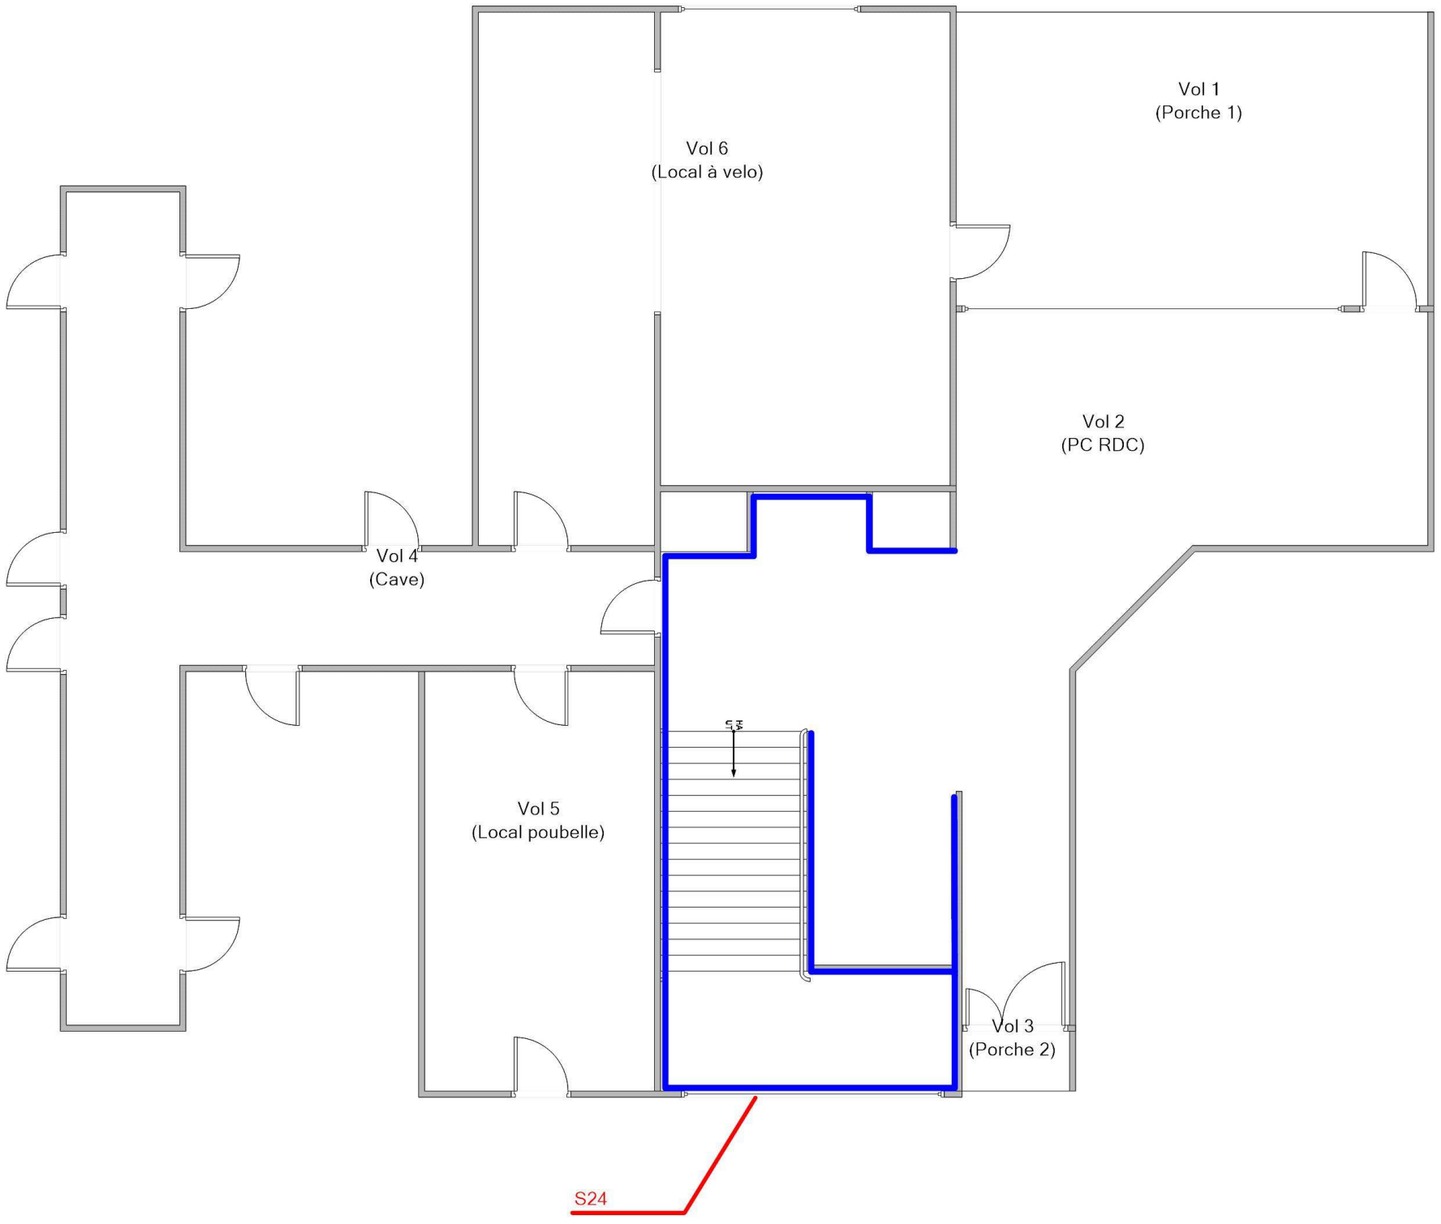

Légende

	S24: Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002LQ000839

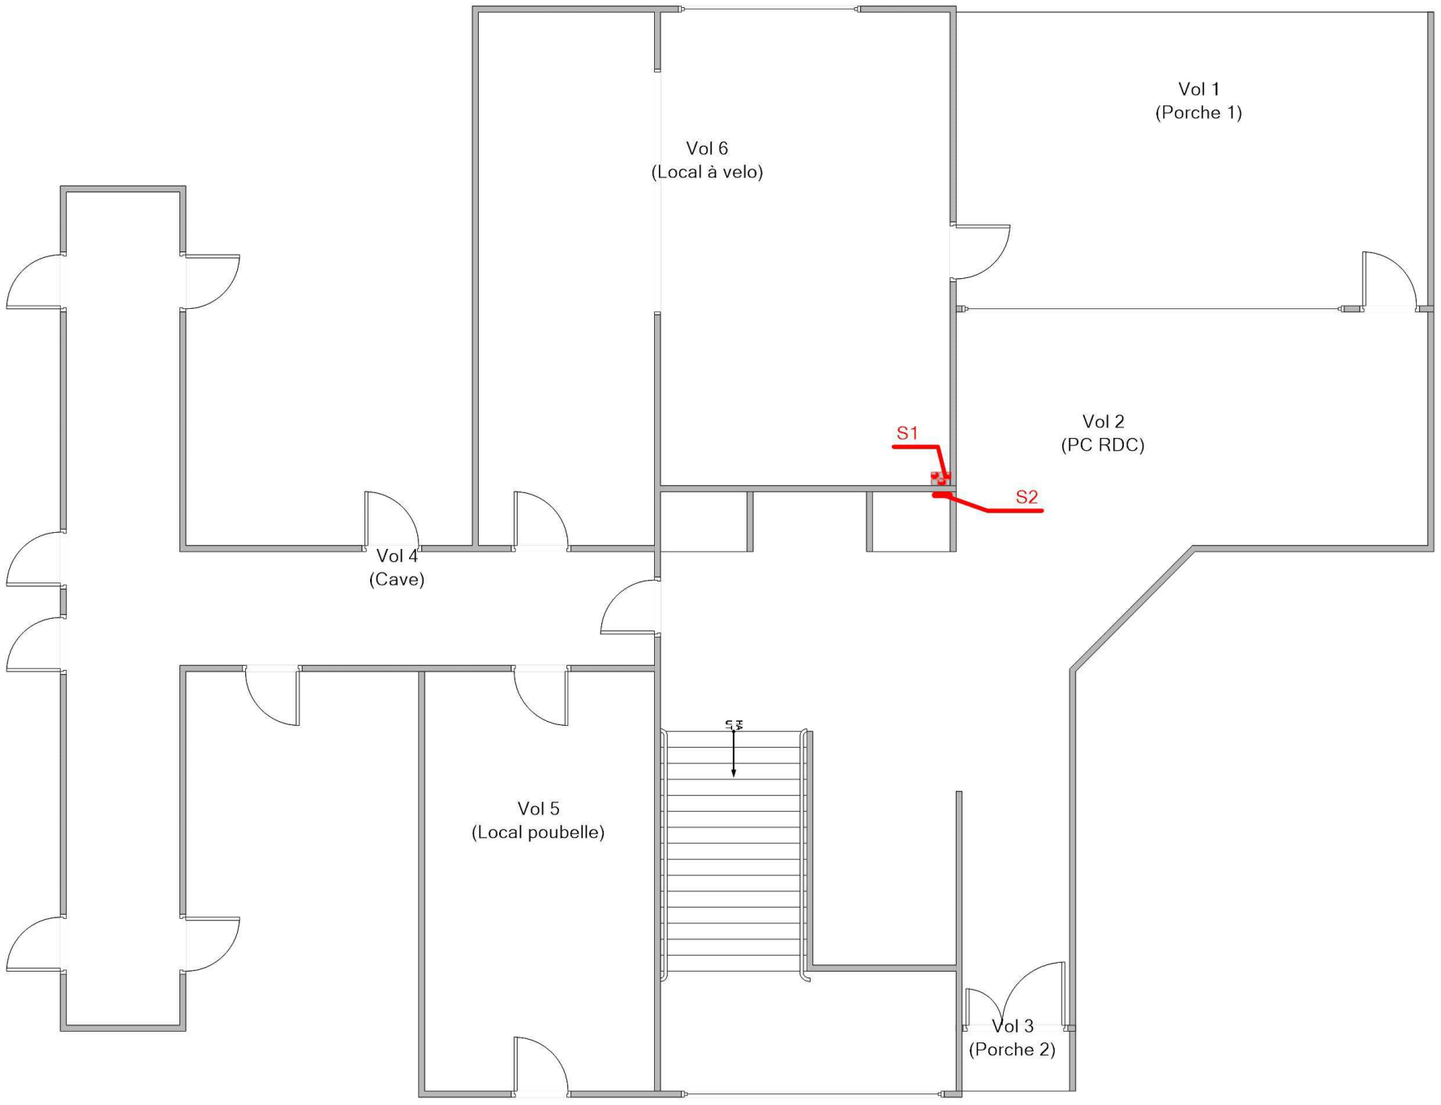

Légende

	S1: Conduit en fibres-ciment
	S2: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000839

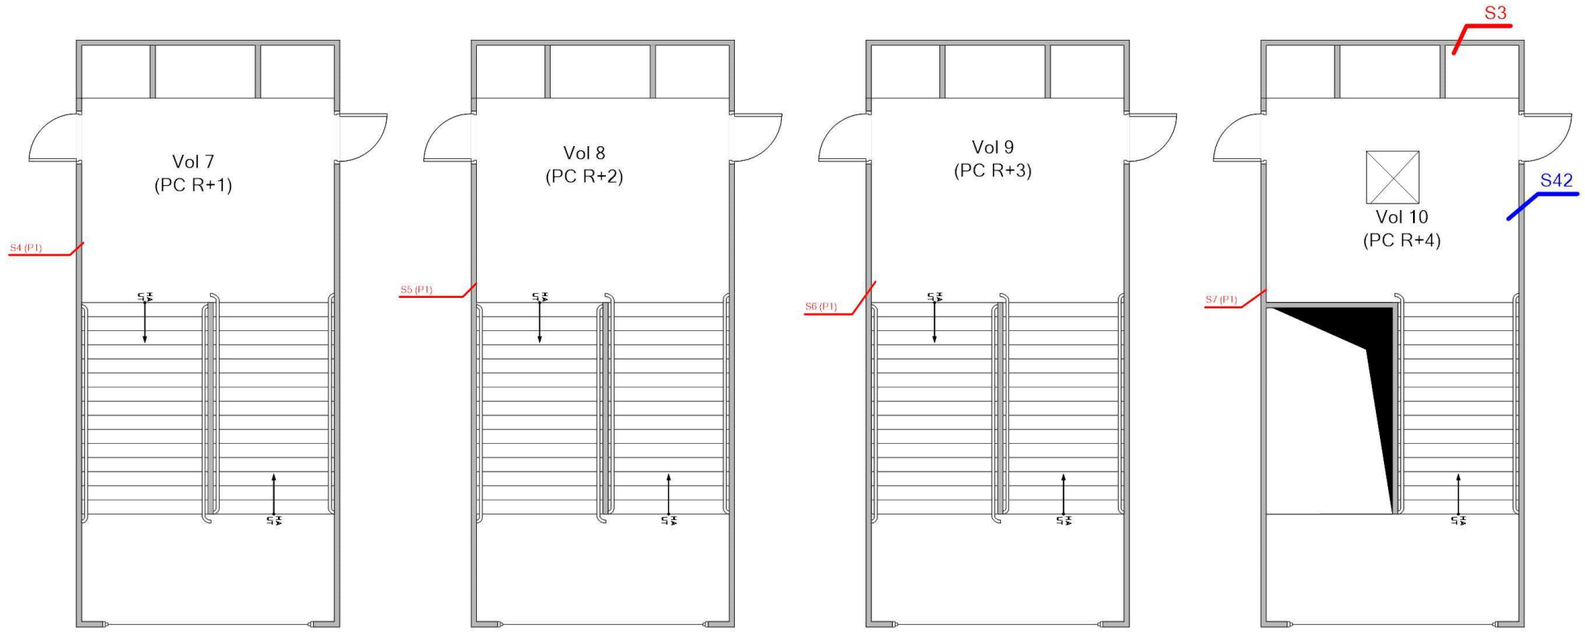

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

ETAGES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002LQ000839

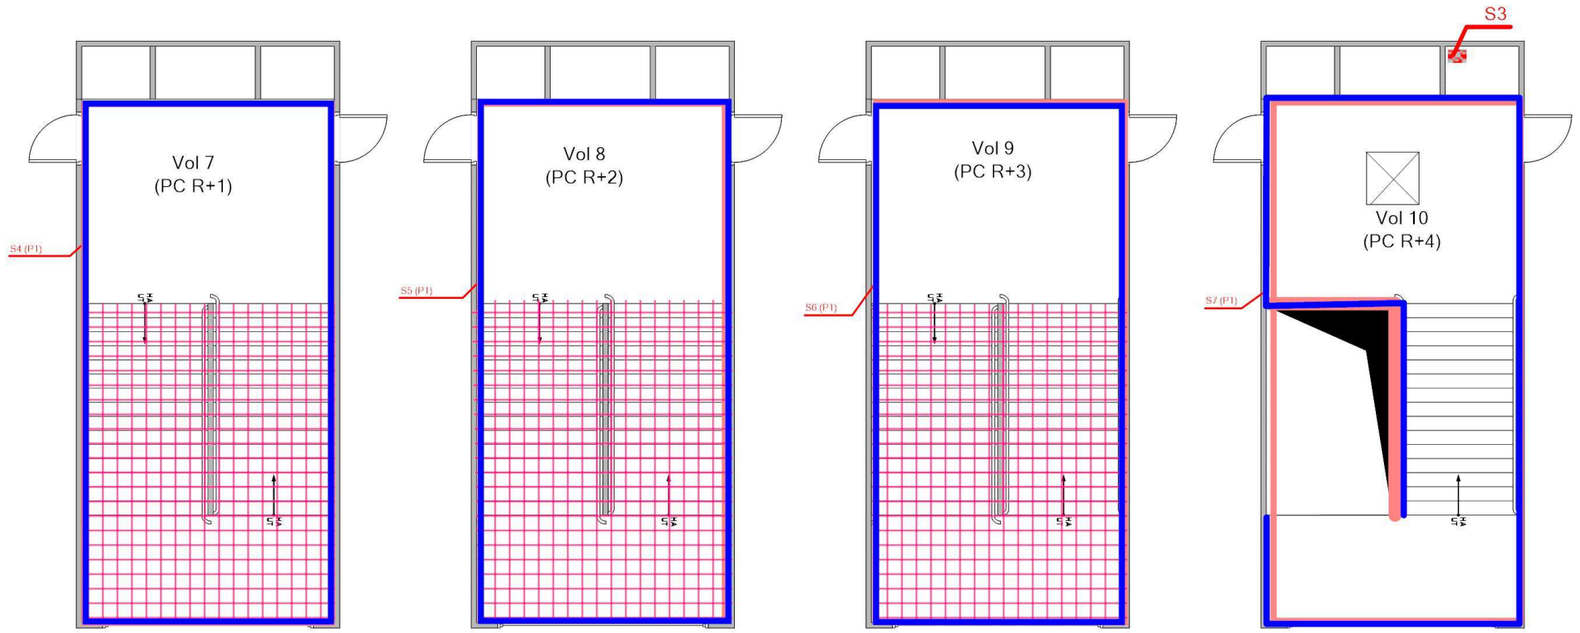

Légende

	S24: Colle de carrelage (plinthe)
	S23: Enduit plâtre
	P1 : Peinture décoratives
	S3: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

ETAGES - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002LQ000839

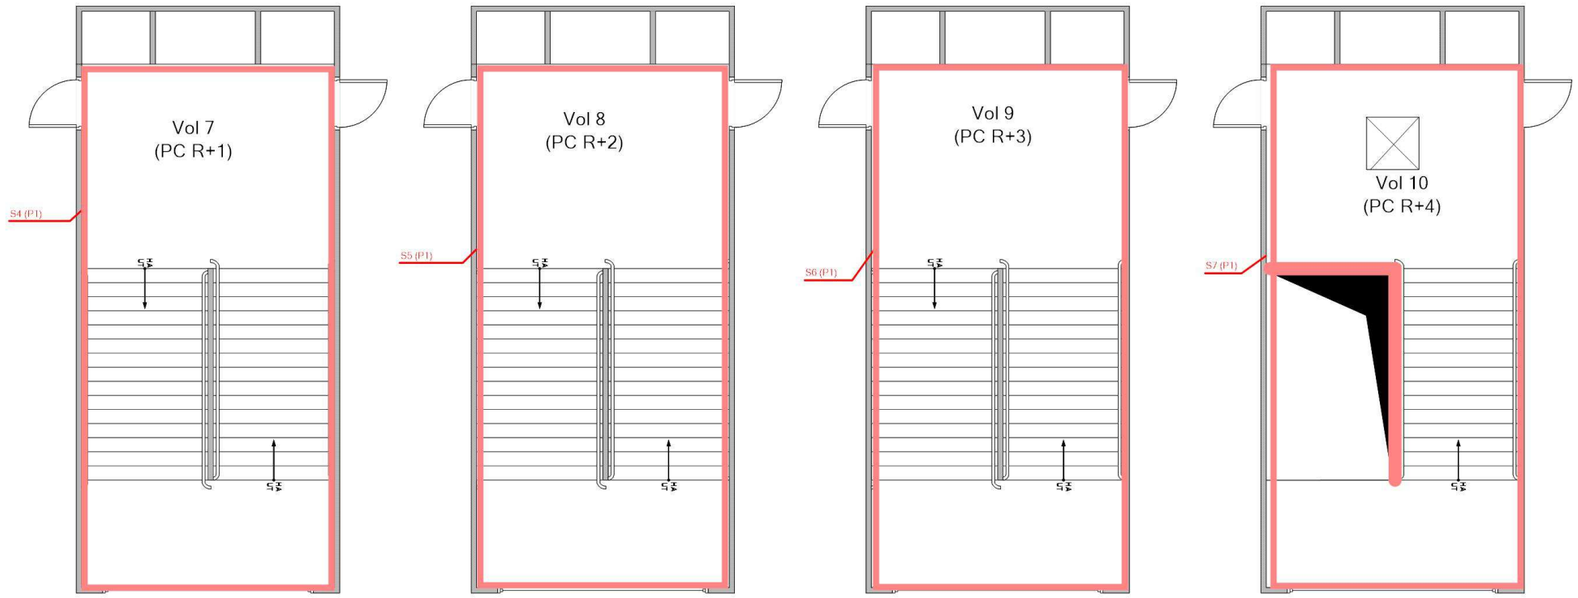

Légende

	P1 : Peinture décoratives

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

ETAGES - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002LQ000839

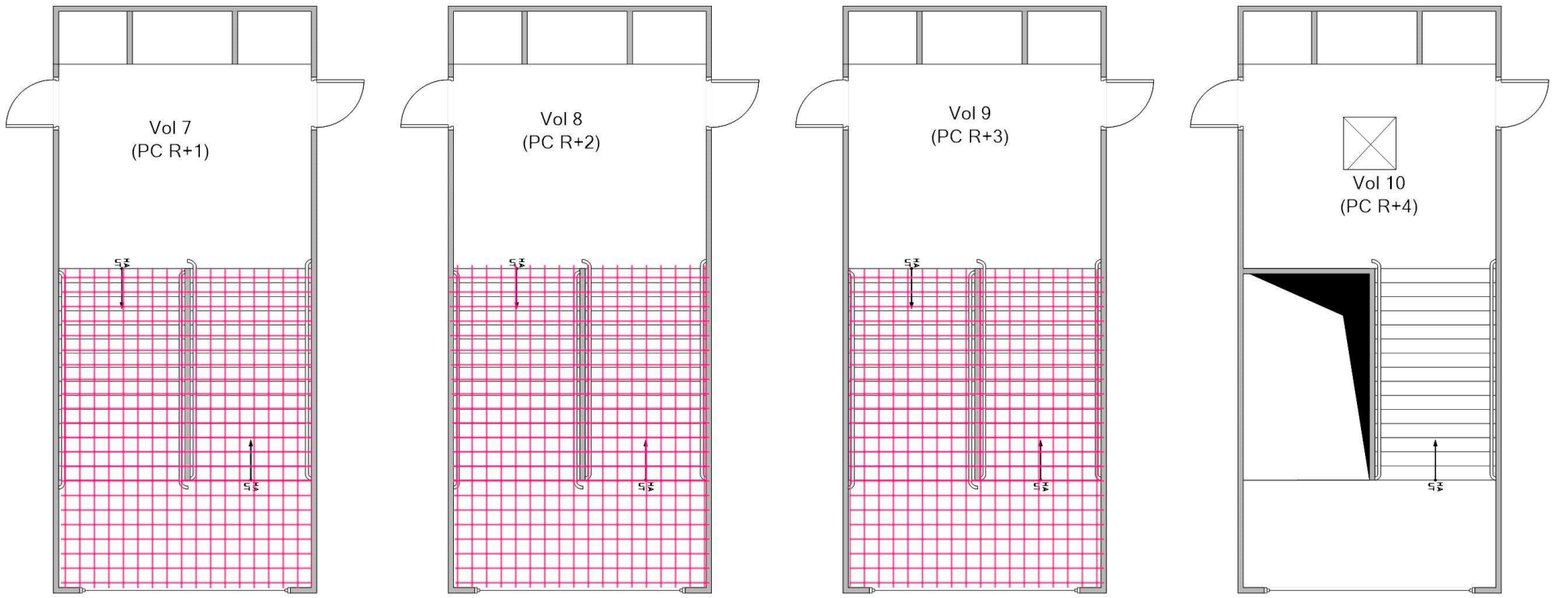

Légende

	S23: Enduit plâtre

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

ETAGES - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002LQ000839

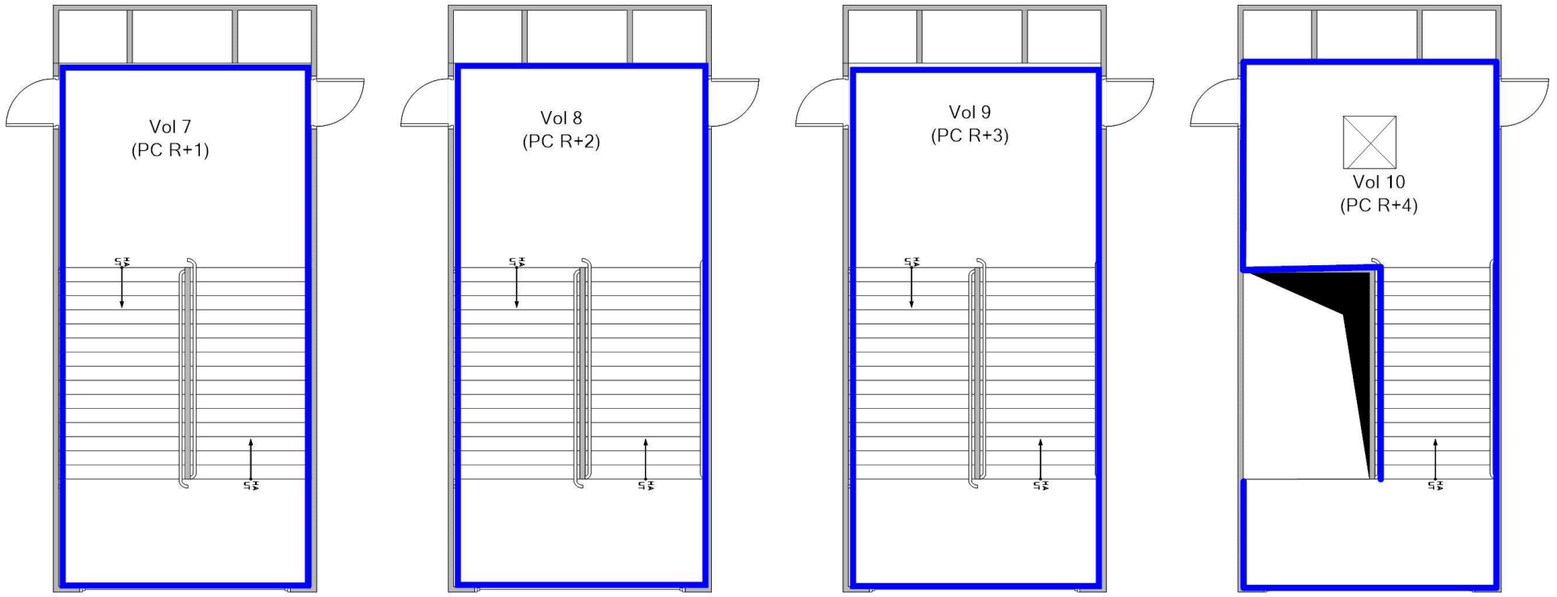

Légende

	S24: Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

ETAGES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002LQ000839

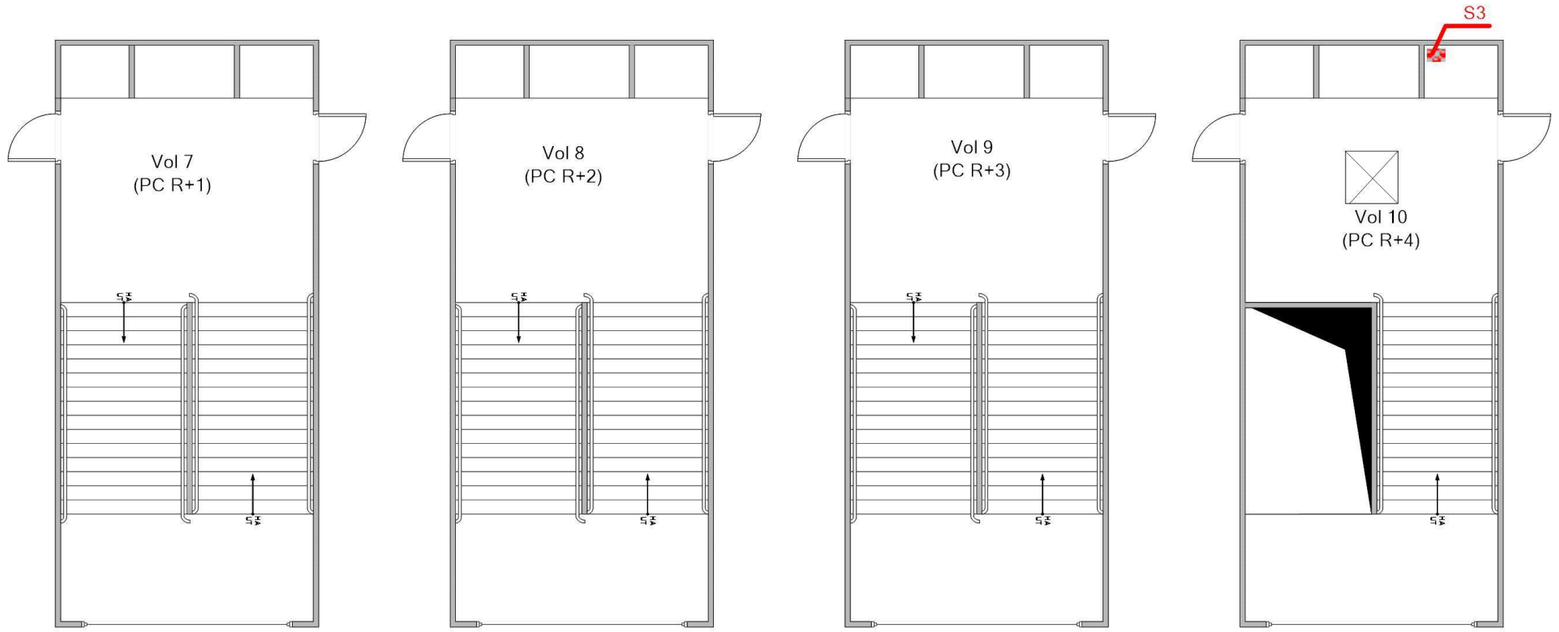

Légende

	S3: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000839

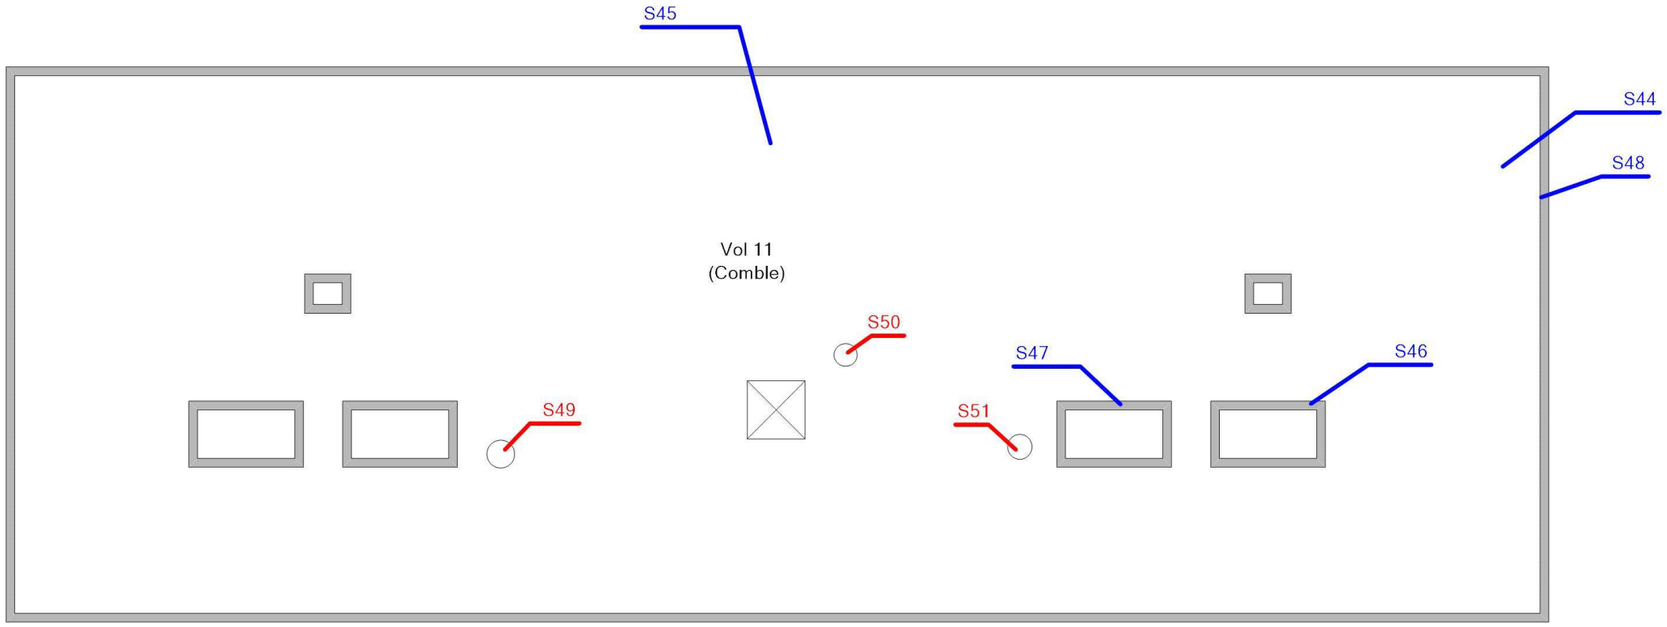

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

COMBLES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002LQ000839

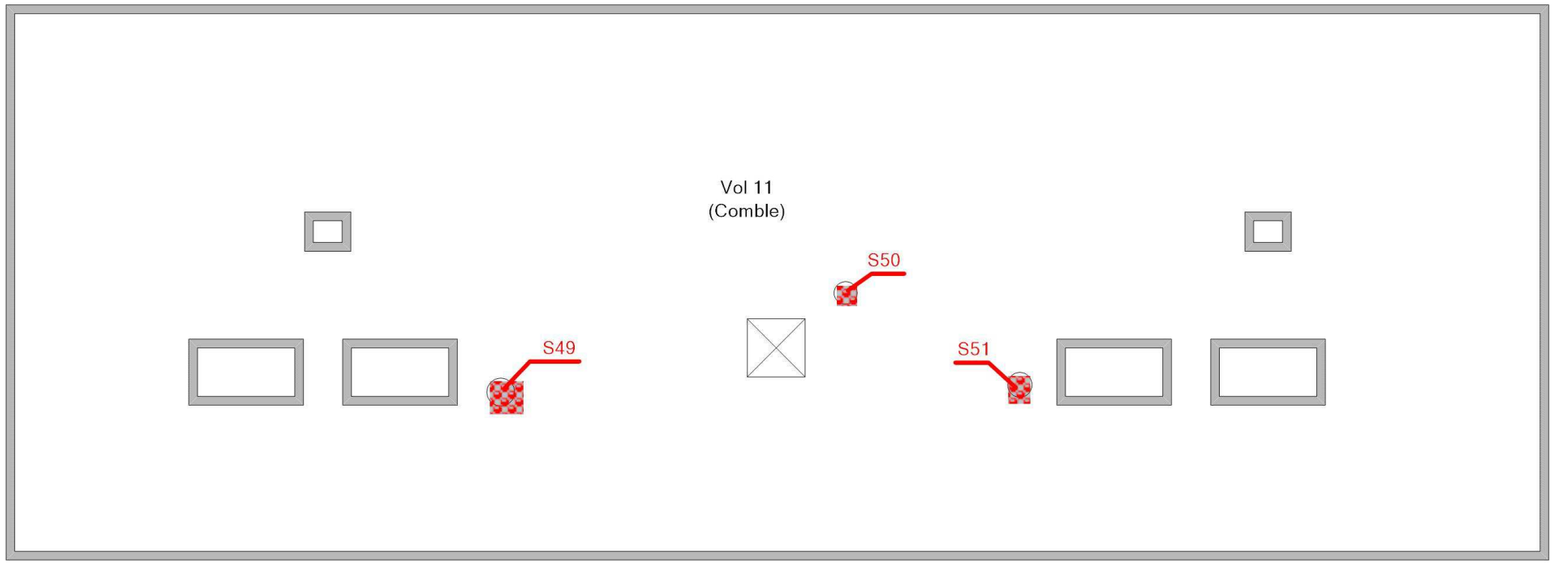

Légende	
	S49: Conduit en fibres-ciment
	S50: Conduit en fibres-ciment
	S51: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000839

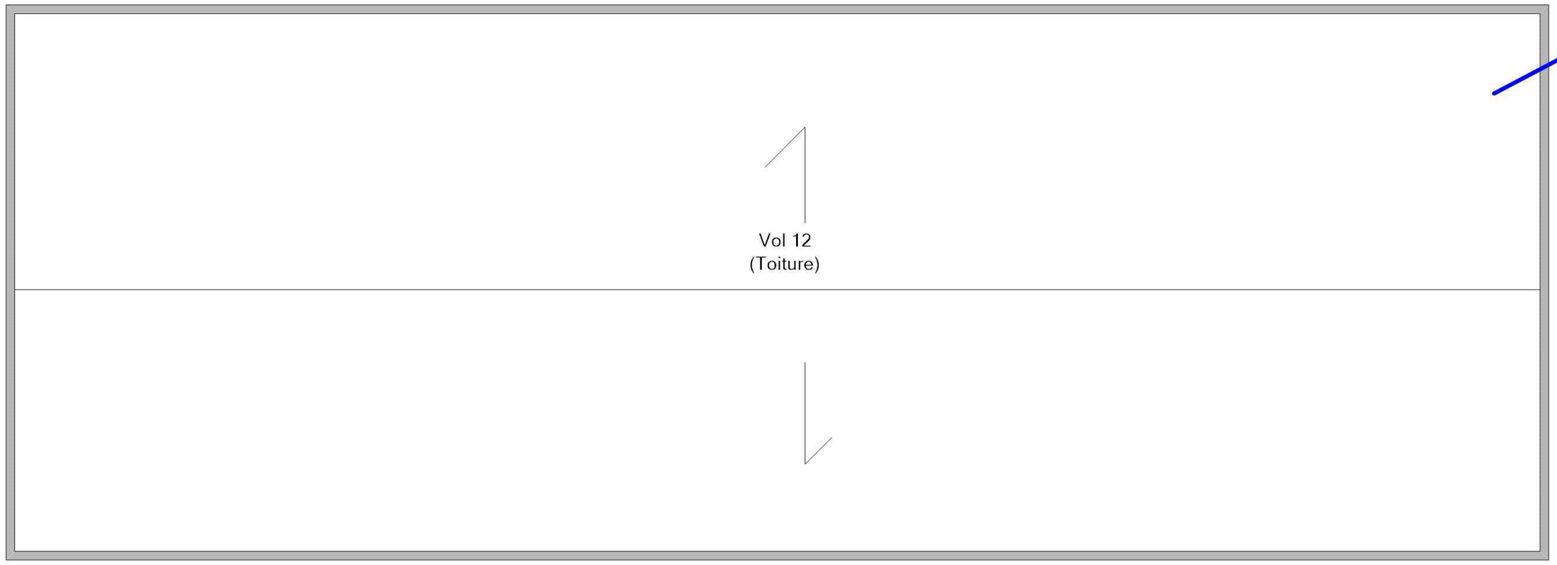

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000839

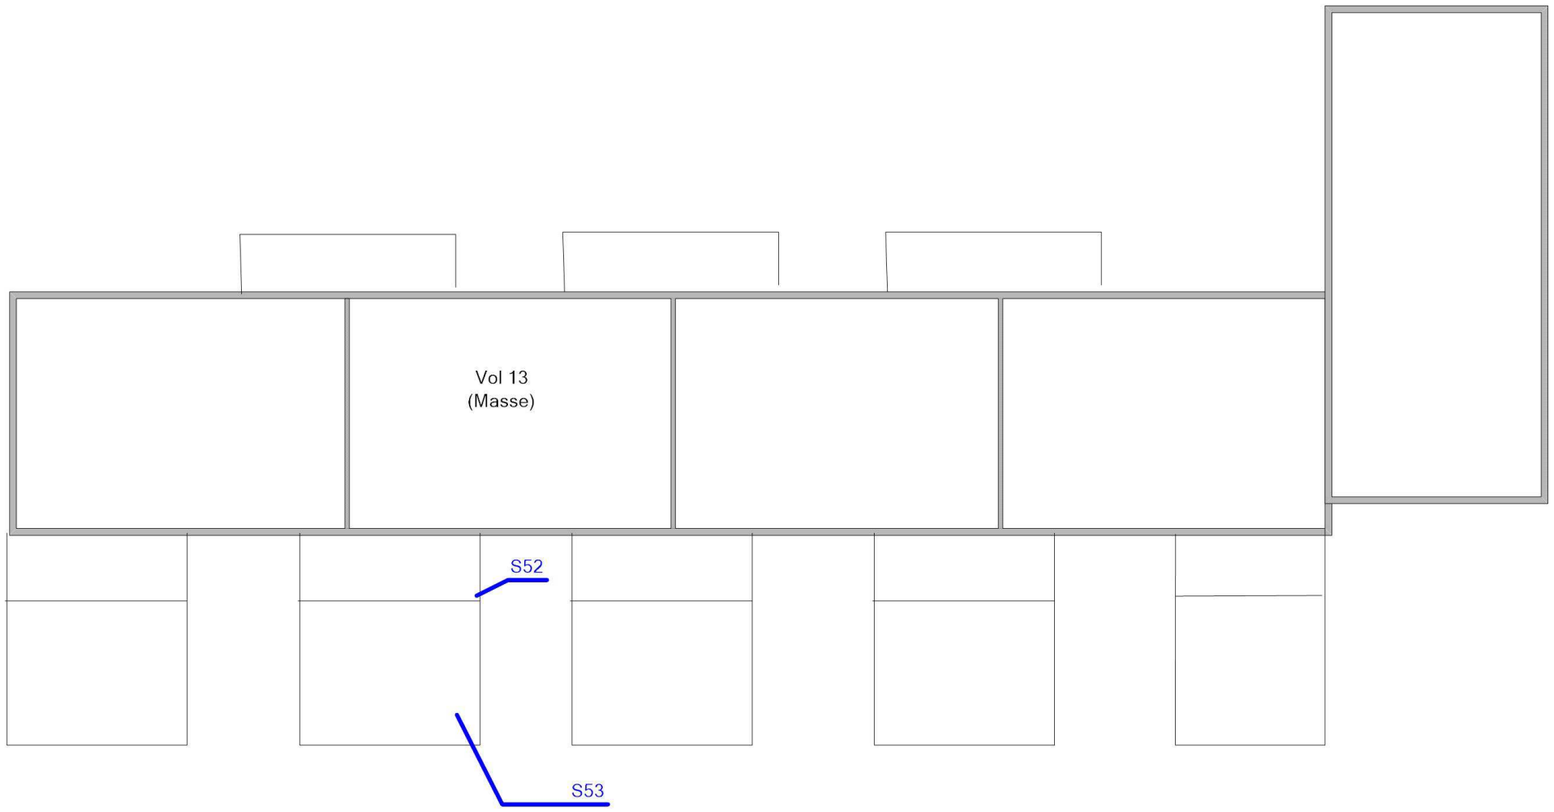

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

FAÇADE AVANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000839

Vol 14
(Façade 1)

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000839

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA COURTILLE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	02/02/2017	PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
S49 - 1 (A49)	Combles - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S50 - 1 (A50)	Combles - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S51 - 1 (A51)	Combles - Vol 11 (Comble)	Présence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
S3 - 1 (A3)	Etages - Vol 10 (PC R+4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002LQ000839 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement positif
002LQ000839 n°1 - 2 (P1)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement positif
S1 - 1 (A1)	RDC - Vol 6 (Local à velo)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S2 - 1 (A2)	RDC - Vol 2 (PC RDC)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002LQ000839 n°1 - 1 (P1)

002LQ000839 n°1 - 2 (P1)

S1 - 1 (A1)

S2 - 1 (A2)

S3 - 1 (A3)

S49 - 1 (A49)

S50 - 1 (A50)

S51 - 1 (A51)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples - Peinture blanche tachetée verte -	RDC - Vol 2 (PC RDC)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13162 EN DATE DU 09/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11650
Echantillon ITGA : IT071702-13162
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000839
Dossier client	_0007400002_ LA COURTILLE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002LQ000839001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 2 (PC RDC)

Description ITGA	Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Peintures multiples	META le 09/02/2017	Présence de fibres d'amiante	Trémolite	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
