Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LA MAILLARDIERE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_0015600005_
Date du repérage :	09/11/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Présence d'amiante	Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_0015600005_
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	GARDENAT Ludovic
Accompagnateur :	Florian Loyer (0800 400 100)
Date de repérage	09/11/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 4002 V3
Délivré le : 23/06/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 06/01/2017
A Riorges, le 06/01/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

SOUS-SOL - Vol 1 (Rampe accès sous-sol)	SOUS-SOL - Vol 2 (Local à velo)
SOUS-SOL - Vol 3 (Accès caves)	SOUS-SOL - Vol 4 (local)
SOUS-SOL - Vol 5 (Accès sous-sol)	SOUS-SOL - Vol 6 (Vide Sanitaires 2)
SOUS-SOL - Vol 7 (Local commun)	RDC - Vol 9 (SAS d'entrée RDC)
RDC - Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	RDC - Vol 11 (Local poubelle)
RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	RDC - Vol 13 (Dégagement RDC)
RDC - Vol 14 (Local technique RDC)	R+1 & R+2 - Vol 17 (Dégagement R+2)
R+1 & R+2 - Vol 18 (Local technique R+2)	R+1 & R+2 - Vol 21 (Local V.O R+2)
R+1 & R+2 - Vol 22 (cage d'escalier R+2)	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)
R+1 & R+2 - Vol 24 (Local technique R+1)	R+1 & R+2 - Vol 27 (Local V.O R+1)
R+1 & R+2 - Vol 28 (cage d'escalier R+1)	R+3 & R+4 - Vol 29 (Dégagement R+3)
R+3 & R+4 - Vol 30 (Local technique R+3)	R+3 & R+4 - Vol 33 (Local V.O R+3)
R+3 & R+4 - Vol 34 (cage d'escalier R+3)	R+3 & R+4 - Vol 35 (Dégagement R+4)
R+3 & R+4 - Vol 36 (Local technique R+4)	R+3 & R+4 - Vol 39 (Local V.O R+4)
R+3 & R+4 - Vol 40 (cage d'escalier R+4)	SOUS-SOL - Vol 41 (Vide Sanitaires 3)
SOUS-SOL - Vol 42 (Vide Sanitaires 1)	Plan masse et toiture - Vol 43 (Toiture terrasse)
Plan masse et toiture - Vol 44 (extérieures)	Façade avant gauche - Vol 45 (Façade avant gauche)
Façade avant droite - Vol 46 (Façade avant droite)	pignon droit - Vol 47 (pignon droit)
façade arrière - Vol 48 (façade arrière)	machinerie - Vol 49 (Machinerie ascenseur)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans l'ensemble de parties communes du bâtiment

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble de parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Façades	SOUS-SOL	Vol 1 (Rampe accès sous-sol)	
Parois verticales intérieures et enduits	SOUS-SOL	Vol 2 (Local à velo) - Vol 3 (Accès caves) - Vol 4 (local) - Vol 5 (Accès sous-sol) - Vol 7 (Local commun) - Vol 41 (Vide Sanitaires 3) - Vol 42 (Vide Sanitaires 1)	
Plafond et faux-plafonds	SOUS-SOL	Vol 2 (Local à velo) - Vol 3 (Accès caves) - Vol 4 (local) - Vol 5 (Accès sous-sol) - Vol 6 (Vide Sanitaires 2) - Vol 7 (Local commun) - Vol 41 (Vide Sanitaires 3) - Vol 42 (Vide Sanitaires 1)	
Revêtement de sol	SOUS-SOL	Vol 2 (Local à velo) - Vol 3 (Accès caves) - Vol 4 (local) - Vol 5 (Accès sous-sol) - Vol 6 (Vide Sanitaires 2) - Vol 7 (Local commun)	
Conduits, canalisations et équipements	SOUS-SOL	Vol 5 (Accès sous-sol)	
Façades	RDC	Vol 9 (SAS d'entrée RDC)	

Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 9 (SAS d'entrée RDC) - Vol 10 (Hall d'entrée RDC) - Vol 11 (Local poubelle) - Vol 12 (cage d'escalier RDC) - Vol 13 (Dégagement RDC) - Vol 14 (Local technique RDC)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 9 (SAS d'entrée RDC) - Vol 10 (Hall d'entrée RDC) - Vol 11 (Local poubelle) - Vol 12 (cage d'escalier RDC) - Vol 13 (Dégagement RDC) - Vol 14 (Local technique RDC)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 10 (Hall d'entrée RDC) - Vol 11 (Local poubelle) - Vol 12 (cage d'escalier RDC) - Vol 13 (Dégagement RDC) - Vol 14 (Local technique RDC)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 10 (Hall d'entrée RDC) - Vol 13 (Dégagement RDC)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 11 (Local poubelle)	
Conduits, canalisations et équipements	R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2) - Vol 23 (Dégagement R+1) - Vol 27 (Local V.O R+1)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2) - Vol 18 (Local technique R+2) - Vol 21 (Local V.O R+2) - Vol 22 (cage d'escalier R+2) - Vol 23 (Dégagement R+1) - Vol 24 (Local technique R+1) - Vol 27 (Local V.O R+1) - Vol 28 (cage d'escalier R+1)	
Plafond et faux-plafonds	R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2) - Vol 18 (Local technique R+2) - Vol 21 (Local V.O R+2) - Vol 22 (cage d'escalier R+2) - Vol 23 (Dégagement R+1) - Vol 24 (Local technique R+1) - Vol 27 (Local V.O R+1) - Vol 28 (cage d'escalier R+1)	
Revêtement de sol	R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2) - Vol 18 (Local technique R+2) - Vol 21 (Local V.O R+2) - Vol 22 (cage d'escalier R+2) - Vol 23 (Dégagement R+1) - Vol 24 (Local technique R+1) - Vol 27 (Local V.O R+1) - Vol 28 (cage d'escalier R+1)	
Coffrages perdus	R+1 & R+2	Vol 18 (Local technique R+2) - Vol 23 (Dégagement R+1)	

Conduits, canalisations et équipements	R+3 & R+4	Vol 29 (Dégagement R+3) - Vol 33 (Local V.O R+3) - Vol 35 (Dégagement R+4) - Vol 39 (Local V.O R+4)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+3 & R+4	Vol 29 (Dégagement R+3) - Vol 30 (Local technique R+3) - Vol 33 (Local V.O R+3) - Vol 34 (cage d'escalier R+3) - Vol 35 (Dégagement R+4) - Vol 36 (Local technique R+4) - Vol 39 (Local V.O R+4) - Vol 40 (cage d'escalier R+4)	
Plafond et faux-plafonds	R+3 & R+4	Vol 29 (Dégagement R+3) - Vol 30 (Local technique R+3) - Vol 33 (Local V.O R+3) - Vol 34 (cage d'escalier R+3) - Vol 35 (Dégagement R+4) - Vol 36 (Local technique R+4) - Vol 39 (Local V.O R+4) - Vol 40 (cage d'escalier R+4)	
Revêtement de sol	R+3 & R+4	Vol 29 (Dégagement R+3) - Vol 30 (Local technique R+3) - Vol 33 (Local V.O R+3) - Vol 34 (cage d'escalier R+3) - Vol 35 (Dégagement R+4) - Vol 36 (Local technique R+4) - Vol 39 (Local V.O R+4) - Vol 40 (cage d'escalier R+4)	
Coffrages perdus	R+3 & R+4	Vol 30 (Local technique R+3) - Vol 36 (Local technique R+4)	
Conduits, canalisations et équipements	Plan masse et toiture	Vol 43 (Toiture terrasse)	
Façades	Plan masse et toiture	Vol 43 (Toiture terrasse)	
Toiture et étanchéité	Plan masse et toiture	Vol 43 (Toiture terrasse)	
Voies et réseaux divers	Plan masse et toiture	Vol 44 (extérieures)	
Façades	Façade avant gauche	Vol 45 (Façade avant gauche)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade avant gauche	Vol 45 (Façade avant gauche)	
Plafond et faux-plafonds	Façade avant gauche	Vol 45 (Façade avant gauche)	
Façades	Façade avant droite	Vol 46 (Façade avant droite)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade avant droite	Vol 46 (Façade avant droite)	
Plafond et faux-plafonds	Façade avant droite	Vol 46 (Façade avant droite)	
Façades	pignon droit	Vol 47 (pignon droit)	
Parois verticales intérieures et enduits	pignon droit	Vol 47 (pignon droit)	
Plafond et faux-plafonds	pignon droit	Vol 47 (pignon droit)	
Façades	façade arrière	Vol 48 (façade arrière)	
Parois verticales intérieures et enduits	façade arrière	Vol 48 (façade arrière)	
Plafond et faux-plafonds	façade arrière	Vol 48 (façade arrière)	

Parois verticales intérieures et enduits	machinerie	Vol 49 (Machinerie ascenseur)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 3 (Accès caves)	Panneaux vissés de fibralith	Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 2 (Local à velo)	Panneaux vissés de fibralith	Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 5 (Accès sous-sol)	Panneaux vissés de fibralith	Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 7 (Local commun)	Panneaux vissés de fibralith	Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 41 (Vide Sanitaires 3)	Panneaux vissés de fibralith	Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 42 (Vide Sanitaires 1)	Panneaux vissés de fibralith	Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 6 (Vide Sanitaires 2)	Panneaux vissés de fibralith	Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 9 (SAS d'entrée RDC)	Panneaux vissés de fibralith	Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 11 (Local poubelle)	Panneaux vissés de fibralith	Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 43 (Toiture terrasse)	Complexe d'étanchéité	Impossibilités de réaliser des prélèvements du complexe d' étanchéité recouvrant la toiture et ses massifs sans dégradations de celui-ci ; ce qui pourrait nuire à l'étanchéité de la toiture. De plus il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sous cette isolant.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 23 (Dégagement R+1)	Coffrages perdus	Fond de coffrage	plaque fibreuse sous plaque métallique	P21
Vol 18 (Local technique R+2)	Coffrages perdus	Fond de coffrage	plaque fibreuse sous plaque métallique	P21
Vol 36 (Local technique R+4)	Coffrages perdus	Fond de coffrage	plaque fibreuse sous plaque métallique	P21
Vol 30 (Local technique R+3)	Coffrages perdus	Fond de coffrage	plaque fibreuse sous plaque métallique	P21
Vol 23 (Dégagement R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P29
Vol 17 (Dégagement R+2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P29
Vol 35 (Dégagement R+4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P29
Vol 29 (Dégagement R+3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P29
Vol 23 (Dégagement R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P30
Vol 17 (Dégagement R+2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P30

Vol 35 (Dégagement R+4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P30
Vol 29 (Dégagement R+3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P30
Vol 11 (Local poubelle)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S83
Vol 27 (Local V.O R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S84
Vol 23 (Dégagement R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S85
Vol 23 (Dégagement R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S86
Vol 17 (Dégagement R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S88
Vol 17 (Dégagement R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S89
Vol 17 (Dégagement R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S90
Vol 33 (Local V.O R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S91
Vol 29 (Dégagement R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S92
Vol 29 (Dégagement R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S93
Vol 39 (Local V.O R+4)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S94
Vol 35 (Dégagement R+4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S95
Vol 35 (Dégagement R+4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S96
Vol 35 (Dégagement R+4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S97
Vol 43 (Toiture terrasse)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S98
Vol 43 (Toiture terrasse)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S99

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.
Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :
Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.
Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas éffectués.
Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.
Les matériaux présents sous le bardage (plaques rouges) présent en façade.
Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.
Les élèments ponctuels et tous les matériaux présents sous le complexe d'étanchéité recouvrant la toiture invisibles sans dégradations de celui-ci.
Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées…)
Les matériaux présents autour des menuiseries des étages supérieures (joints et reprises d'étanchéités) non accessibles sans accéder aux logements des locataires afin de réaliser un repérage exhaustif.Commentaire n°2 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, plafond...)

Une peinture épaisse recouvre l'ensemble des façades du bâtiment. Il est donc impossible d'être exhaustif sur les matériaux présents sous la peinture.
Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaire en cas de réhabilitation des façades.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
R+3 & R+4 - Vol 32 (Box privée R+3)	pièce non visée par le présent diagnostic	le diagnostic de ce local est à réaliser avec le logement auquel il est attitré
RDC - Vol 16 (Box privée Rdc)	pièce non visée par le présent diagnostic	le diagnostic de ce local est à réaliser avec le logement auquel il est attitré
R+3 & R+4 - Vol 37 (ascenseur R+4)	Moyen investigation non mis a disposition	aucune personne habilitée pour acceder au cage d'ascenseurs lors du diagnostic
R+1 & R+2 - Vol 20 (Box privée R+2)	pièce non visée par le présent diagnostic	le diagnostic de ce local est à réaliser avec le logement auquel il est attitré
R+1 & R+2 - Vol 25 (ascenseur R+1)	Moyen investigation non mis a disposition	aucune personne habilitée pour acceder au cage d'ascenseurs lors du diagnostic
RDC - Vol 15 (ascenseur RDC)	Moyen investigation non mis a disposition	aucune personne habilitée pour acceder au cage d'ascenseurs lors du diagnostic
R+3 & R+4 - Vol 38 (Box privée R+4)	pièce non visée par le présent diagnostic	le diagnostic de ce local est à réaliser avec le logement auquel il est attitré
R+1 & R+2 - Vol 26 (Box privée R+1)	pièce non visée par le présent diagnostic	le diagnostic de ce local est à réaliser avec le logement auquel il est attitré
R+1 & R+2 - Vol 19 (ascenseur R+2)	Moyen investigation non mis a disposition	aucune personne habilitée pour acceder au cage d'ascenseurs lors du diagnostic
R+3 & R+4 - Vol 31 (ascenseur R+3)	Moyen investigation non mis a disposition	aucune personne habilitée pour acceder au cage d'ascenseurs lors du diagnostic

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Coffrages perdus

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Coffrages perdus

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1 & R+2	Vol 23 (Dégagement R+1)	Fond de coffrage	plaque fibreuse sous plaque métallique	P21	Réalisation d'un prélevement	au sol des gaines électrique	002OY000235 n°21 - 1 - 002OY000235 n°21 - 2	P21	Matériau fibreux blanc en vrac avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
R+1 & R+2	Vol 18 (Local technique R+2)	Fond de coffrage	plaque fibreuse sous plaque métallique	S68 (P21)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	au sol des gaines électrique	002OY000235 n°21 - 1 - 002OY000235 n°21 - 2	P21	Matériau fibreux blanc en vrac avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
R+3 & R+4	Vol 36 (Local technique R+4)	Fond de coffrage	plaque fibreuse sous plaque métallique	S69 (P21)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	au sol des gaines électrique	002OY000235 n°21 - 1 - 002OY000235 n°21 - 2	P21	Matériau fibreux blanc en vrac avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
R+3 & R+4	Vol 30 (Local technique R+3)	Fond de coffrage	plaque fibreuse sous plaque métallique	S70 (P21)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	au sol des gaines électrique	002OY000235 n°21 - 1 - 002OY000235 n°21 - 2	P21	Matériau fibreux blanc en vrac avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
SOUS-SOL	Vol 5 (Accès sous-sol)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P7	Réalisation d'un prélevement	bitumineux noir	002OY000235 n°7 - 1 - 002OY000235 n°7 - 2	P7	Matériau bitumineux noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 11 (Local poubelle)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S83	Résalisation d'un sondage		S83 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+1 & R+2	Vol 27 (Local V.O R+1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S84	Résalisation d'un sondage		S84 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+1 & R+2	Vol 23 (Dégagement R+1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S85	Résalisation d'un sondage	dans chappe maigre gaines gaz	S85 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+1 & R+2	Vol 23 (Dégagement R+1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S86	Résalisation d'un sondage	dans chappe maigre gaines gaz	S86 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S88	Résalisation d'un sondage		S88 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S89	Résalisation d'un sondage	dans chappe maigre gaines gaz	S89 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S90	Résalisation d'un sondage	dans chappe maigre gaines gaz	S90 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+3 & R+4	Vol 33 (Local V.O R+3)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S91	Résalisation d'un sondage		S91 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+3 & R+4	Vol 29 (Dégagement R+3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S92	Résalisation d'un sondage	dans chappe maigre gaines gaz	S92 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+3 & R+4	Vol 29 (Dégagement R+3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S93	Résalisation d'un sondage	dans chappe maigre gaines gaz	S93 - 1 - S93 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+3 & R+4	Vol 39 (Local V.O R+4)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S94	Résalisation d'un sondage		S94 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+3 & R+4	Vol 35 (Dégagement R+4)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S95	Résalisation d'un sondage	dans chappe maigre gaines gaz	S95 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+3 & R+4	Vol 35 (Dégagement R+4)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S96	Résalisation d'un sondage	dans chappe maigre gaines gaz	S96 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+3 & R+4	Vol 35 (Dégagement R+4)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S97	Résalisation d'un sondage	dans chappe maigre gaines gaz	S97 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse et toiture	Vol 43 (Toiture terrasse)	Conduit air	joint d'étanchéité circuit V.M.C	P34	Réalisation d'un prélevement		002OY000235 n°34 - 1 - 002OY000235 n°34 - 2	P34	Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse et toiture	Vol 43 (Toiture terrasse)	Conduit air	joint d'étanchéité circuit V.M.C	P34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34		002OY000235 n°34 - 1 - 002OY000235 n°34 - 2	P34	Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse et toiture	Vol 43 (Toiture terrasse)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S98	Résalisation d'un sondage		S98 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse et toiture	Vol 43 (Toiture terrasse)	Murs	Enduit ciment	P35	Réalisation d'un prélevement	conduits cheminée +peintures grises	002OY000235 n°35 - 1 - 002OY000235 n°35 - 2	P35	Enduit compact gris + peinture avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse et toiture	Vol 43 (Toiture terrasse)	Murs	Enduit ciment	P35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35	conduits cheminée +peintures grises	002OY000235 n°35 - 1 - 002OY000235 n°35 - 2	P35	Enduit compact gris + peinture avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 9 (SAS d'entrée RDC)	Murs	Enduits projetés	P37	Réalisation d'un prélevement	Gris + peinture épaisse bleu	002OY000235 n°37 - 1 - 002OY000235 n°37 - 2	P37	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (SAS d'entrée RDC)	Murs	Enduits projetés	P37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37	Gris + peinture épaisse bleu	002OY000235 n°37 - 1 - 002OY000235 n°37 - 2	P37	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant droite	Vol 46 (Façade avant droite)	Bardages	joints entre élément préfa	P38	Réalisation d'un prélevement	souple gris	002OY000235 n°38 - 1 - 002OY000235 n°38 - 2	P38	Mousse grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant droite	Vol 46 (Façade avant droite)	Bardages	joints entre élément préfa	P38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38	souple gris	002OY000235 n°38 - 1 - 002OY000235 n°38 - 2	P38	Mousse grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant gauche	Vol 45 (Façade avant gauche)	Bardages	joints entre élément préfa	S184	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38	souple gris	002OY000235 n°38 - 1 - 002OY000235 n°38 - 2	P38	Mousse grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
pignon droit	Vol 47 (pignon droit)	Bardages	joints entre élément préfa	S185	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38	souple gris	002OY000235 n°38 - 1 - 002OY000235 n°38 - 2	P38	Mousse grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
façade arrière	Vol 48 (façade arrière)	Bardages	joints entre élément préfa	S186	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38	souple gris	002OY000235 n°38 - 1 - 002OY000235 n°38 - 2	P38	Mousse grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant droite	Vol 46 (Façade avant droite)	Murs	allège de fenêtres	S100	rigide rouge		S100 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Façade avant gauche	Vol 45 (Façade avant gauche)	Murs	allège de fenêtres	S100	rigide rouge		S100 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
façade arrière	Vol 48 (façade arrière)	Murs	allège de fenêtres	S100	rigide rouge		S100 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Façade avant droite	Vol 46 (Façade avant droite)	Bardages	colle de faience présente sous la peinture plastique beige	P40	Réalisation d'un prélevement		002OY000235 n°40 - 1 - 002OY000235 n°40 - 2	P40	Colle grise + matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant gauche	Vol 45 (Façade avant gauche)	Bardages	colle de faience présente sous la peinture plastique beige	S191 - S192	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P40		002OY000235 n°40 - 1 - 002OY000235 n°40 - 2	P40	Colle grise + matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
pignon droit	Vol 47 (pignon droit)	Bardages	colle de faience présente sous la peinture plastique beige	S193	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P40		002OY000235 n°40 - 1 - 002OY000235 n°40 - 2	P40	Colle grise + matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
façade arrière	Vol 48 (façade arrière)	Bardages	colle de faience présente sous la peinture plastique beige	S194	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P40		002OY000235 n°40 - 1 - 002OY000235 n°40 - 2	P40	Colle grise + matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
pignon droit	Vol 47 (pignon droit)	Murs	Enduits projetés	P41	Réalisation d'un prélevement	Enduit soubassement	002OY000235 n°41 - 1 - 002OY000235 n°41 - 2	P41	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
façade arrière	Vol 48 (façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S187	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P41	Enduit soubassement	002OY000235 n°41 - 1 - 002OY000235 n°41 - 2	P41	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
SOUS-SOL	Vol 1 (Rampe accès sous-sol)	Murs	Enduit ciment	P44	Réalisation d'un prélevement	murs d'accès sous-sol	002OY000235 n°44 - 1 - 002OY000235 n°44 - 2	P44	Enduit compact gris + peinture avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
SOUS-SOL	Vol 3 (Accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélevement	joints de scellement des parpaings	002OY000235 n°1 - 1 - 002OY000235 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
SOUS-SOL	Vol 3 (Accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	joints de scellement des parpaings	002OY000235 n°1 - 1 - 002OY000235 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Dégagement RDC) - Vol 14 (Local technique RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S9 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	joints de scellement des parpaings	002OY000235 n°1 - 1 - 002OY000235 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2) - Vol 23 (Dégagement R+1) - Vol 18 (Local technique R+2) - Vol 24 (Local technique R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S15 - S16 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	joints de scellement des parpaings	002OY000235 n°1 - 1 - 002OY000235 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+3 & R+4	Vol 35 (Dégagement R+4) - Vol 29 (Dégagement R+3) - Vol 36 (Local technique R+4) - Vol 30 (Local technique R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S17 - S18 - S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	joints de scellement des parpaings	002OY000235 n°1 - 1 - 002OY000235 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
SOUS-SOL	Vol 3 (Accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélevement	enduits de débullage béton banché	002OY000235 n°2 - 1 - 002OY000235 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
SOUS-SOL	Vol 3 (Accès caves) - Vol 2 (Local à velo) - Vol 5 (Accès sous-sol) - Vol 4 (local) - Vol 7 (Local commun) - Vol 41 (Vide Sanitaires 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2 - S2 - S5 - S71 - S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	enduits de débullage béton banché	002OY000235 n°2 - 1 - 002OY000235 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Dégagement RDC) - Vol 14 (Local technique RDC) - Vol 11 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S10 - S31 - S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	enduits de débullage béton banché	002OY000235 n°2 - 1 - 002OY000235 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 23 (Dégagement R+1) - Vol 17 (Dégagement R+2) - Vol 18 (Local technique R+2) - Vol 24 (Local technique R+1) - Vol 27 (Local V.O R+1) - Vol 21 (Local V.O R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S11 - S12 - S32 - S33 - S52 - S53	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	enduits de débullage béton banché	002OY000235 n°2 - 1 - 002OY000235 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+3 & R+4	Vol 35 (Dégagement R+4) - Vol 29 (Dégagement R+3) - Vol 36 (Local technique R+4) - Vol 30 (Local technique R+3) - Vol 33 (Local V.O R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S13 - S14 - S34 - S35 - S54 - S55	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	enduits de débullage béton banché	002OY000235 n°2 - 1 - 002OY000235 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
SOUS-SOL	Vol 2 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P5	Réalisation d'un prélevement	gris	002OY000235 n°5 - 1 - 002OY000235 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
SOUS-SOL	Vol 2 (Local à velo) - Vol 5 (Accès sous-sol) - Vol 3 (Accès caves)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P5 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	gris	002OY000235 n°5 - 1 - 002OY000235 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Local technique RDC)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	gris	002OY000235 n°5 - 1 - 002OY000235 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 21 (Local V.O R+2) - Vol 27 (Local V.O R+1) - Vol 18 (Local technique R+2) - Vol 24 (Local technique R+1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S56 - S59 - S60	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	gris	002OY000235 n°5 - 1 - 002OY000235 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 39 (Local V.O R+4) - Vol 33 (Local V.O R+3) - Vol 36 (Local technique R+4) - Vol 30 (Local technique R+3)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S57 - S58 - S61 - S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	gris	002OY000235 n°5 - 1 - 002OY000235 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
SOUS-SOL	Vol 3 (Accès caves)	Menuiseries	Reprise de scellements des portes	P6	Réalisation d'un prélevement		002OY000235 n°6 - 1 - 002OY000235 n°6 - 2	P6	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
SOUS-SOL	Vol 3 (Accès caves)	Menuiseries	Reprise de scellements des portes	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002OY000235 n°6 - 1 - 002OY000235 n°6 - 2	P6	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Dégagement RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélevement	gaines techniques gaz	002OY000235 n°8 - 1 - 002OY000235 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Dégagement RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	gaines techniques gaz	002OY000235 n°8 - 1 - 002OY000235 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2) - Vol 23 (Dégagement R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	gaines techniques gaz	002OY000235 n°8 - 1 - 002OY000235 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 35 (Dégagement R+4) - Vol 29 (Dégagement R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	gaines techniques gaz	002OY000235 n°8 - 1 - 002OY000235 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélevement	doublage placoplatre	002OY000235 n°9 - 1 - 002OY000235 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S101	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	doublage placoplatre	002OY000235 n°9 - 1 - 002OY000235 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélevement	sur mur dernière la peinture décoratives	002OY000235 n°11 - 1 - 002OY000235 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Hall d'entrée RDC) - Vol 13 (Dégagement RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11 - S102	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	sur mur dernière la peinture décoratives	002OY000235 n°11 - 1 - 002OY000235 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2) - Vol 23 (Dégagement R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S103 - S104	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	sur mur dernière la peinture décoratives	002OY000235 n°11 - 1 - 002OY000235 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 35 (Dégagement R+4) - Vol 29 (Dégagement R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S105 - S106	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	sur mur dernière la peinture décoratives	002OY000235 n°11 - 1 - 002OY000235 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Dégagement RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P12	Réalisation d'un prélevement	blanches pailleté rouge/jaune	002OY000235 n°12 - 1 - 002OY000235 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	blanches pailleté rouge/jaune	002OY000235 n°12 - 1 - 002OY000235 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 23 (Dégagement R+1) - Vol 17 (Dégagement R+2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S107 - S108	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	blanches pailleté rouge/jaune	002OY000235 n°12 - 1 - 002OY000235 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 35 (Dégagement R+4) - Vol 29 (Dégagement R+3)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S109 - S110	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	blanches pailleté rouge/jaune	002OY000235 n°12 - 1 - 002OY000235 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Local technique RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P15	Réalisation d'un prélevement	de lissage locaux techniques	002OY000235 n°15 - 1 - 002OY000235 n°15 - 2	P15	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	de lissage locaux techniques	002OY000235 n°15 - 1 - 002OY000235 n°15 - 2	P15	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1 & R+2	Vol 18 (Local technique R+2) - Vol 24 (Local technique R+1) - Vol 27 (Local V.O R+1) - Vol 21 (Local V.O R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S37 - S38 - S47 - S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	de lissage locaux techniques	002OY000235 n°15 - 1 - 002OY000235 n°15 - 2	P15	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 36 (Local technique R+4) - Vol 30 (Local technique R+3) - Vol 33 (Local V.O R+3) - Vol 39 (Local V.O R+4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S39 - S40 - S49 - S50	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	de lissage locaux techniques	002OY000235 n°15 - 1 - 002OY000235 n°15 - 2	P15	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 30 (Local technique R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélevement	coffre béton préfabriqué	002OY000235 n°16 - 1 - 002OY000235 n°16 - 2	P16	Enduit compact gris hétérogène avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 30 (Local technique R+3) - Vol 33 (Local V.O R+3) - Vol 36 (Local technique R+4) - Vol 39 (Local V.O R+4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P16 - S41 - S113 - S114	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	coffre béton préfabriqué	002OY000235 n°16 - 1 - 002OY000235 n°16 - 2	P16	Enduit compact gris hétérogène avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Local technique RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S119	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	coffre béton préfabriqué	002OY000235 n°16 - 1 - 002OY000235 n°16 - 2	P16	Enduit compact gris hétérogène avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1 & R+2	Vol 21 (Local V.O R+2) - Vol 18 (Local technique R+2) - Vol 24 (Local technique R+1) - Vol 27 (Local V.O R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S115 - S116 - S117 - S118	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	coffre béton préfabriqué	002OY000235 n°16 - 1 - 002OY000235 n°16 - 2	P16	Enduit compact gris hétérogène avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P17	Réalisation d'un prélevement	coffrage recouverts d'enduit platre	002OY000235 n°17 - 1 - 002OY000235 n°17 - 2	P17	Enduit compact blanc en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
SOUS-SOL	Vol 42 (Vide Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S73	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	coffrage recouverts d'enduit platre	002OY000235 n°17 - 1 - 002OY000235 n°17 - 2	P17	Enduit compact blanc en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P22	Réalisation d'un prélevement	goutteletté de la cage d'escaliers +peinture verte cloisons	002OY000235 n°22 - 1 - 002OY000235 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 22 (cage d'escalier R+2) - Vol 28 (cage d'escalier R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S144 - S145	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	goutteletté de la cage d'escaliers +peinture verte cloisons	002OY000235 n°22 - 1 - 002OY000235 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+3 & R+4	Vol 40 (cage d'escalier R+4) - Vol 34 (cage d'escalier R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S146 - S147	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	gouttelette de la cage d'escaliers +peinture verte cloisons	002OY000235 n°22 - 1 - 002OY000235 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P23	Réalisation d'un prélevement	Enduit autour poteaux rond = peinture gouttelé verte claire	002OY000235 n°23 - 1 - 002OY000235 n°23 - 2	P23	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 28 (cage d'escalier R+1) - Vol 22 (cage d'escalier R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S148 - S149	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Enduit autour poteaux rond = peinture gouttelé verte claire	002OY000235 n°23 - 1 - 002OY000235 n°23 - 2	P23	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 40 (cage d'escalier R+4) - Vol 34 (cage d'escalier R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S150 - S151	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Enduit autour poteaux rond = peinture gouttelé verte claire	002OY000235 n°23 - 1 - 002OY000235 n°23 - 2	P23	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
machinerie	Vol 49 (Machinerie ascenseur)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P36	Réalisation d'un prélevement	lissés machinerie	002OY000235 n°36 - 1 - 002OY000235 n°36 - 2	P36	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
machinerie	Vol 49 (Machinerie ascenseur)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36	lissés machinerie	002OY000235 n°36 - 1 - 002OY000235 n°36 - 2	P36	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant gauche	Vol 45 (Façade avant gauche)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P39	Réalisation d'un prélevement	Entre menuiserie et façade / entre couvertine et façade	002OY000235 n°39 - 1 - 002OY000235 n°39 - 2	P39	Matériau souple blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant gauche	Vol 45 (Façade avant gauche)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39	Entre menuiserie et façade / entre couvertine et façade	002OY000235 n°39 - 1 - 002OY000235 n°39 - 2	P39	Matériau souple blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant droite	Vol 46 (Façade avant droite)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S195	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39	Entre menuiserie et façade / entre couvertine et façade	002OY000235 n°39 - 1 - 002OY000235 n°39 - 2	P39	Matériau souple blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
pignon droit	Vol 47 (pignon droit)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S196	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39	Entre menuiserie et façade / entre couvertine et façade	002OY000235 n°39 - 1 - 002OY000235 n°39 - 2	P39	Matériau souple blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
façade arrière	Vol 48 (façade arrière)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	S197 - S198	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39	Entre menuiserie et façade / entre couvertine et façade	002OY000235 n°39 - 1 - 002OY000235 n°39 - 2	P39	Matériau souple blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
SOUS-SOL	Vol 3 (Accès caves)	Plafonds	Panneaux vissés de fibralith	I1							Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
SOUS-SOL	Vol 2 (Local à velo)	Plafonds	Panneaux vissés de fibralith	I1							Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
SOUS-SOL	Vol 5 (Accès sous-sol)	Plafonds	Panneaux vissés de fibralith	I1							Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
SOUS-SOL	Vol 7 (Local commun)	Plafonds	Panneaux vissés de fibralith	I1							Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
SOUS-SOL	Vol 41 (Vide Sanitaires 3)	Plafonds	Panneaux vissés de fibralith	I1							Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
SOUS-SOL	Vol 42 (Vide Sanitaires 1)	Plafonds	Panneaux vissés de fibralith	I1							Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
SOUS-SOL	Vol 6 (Vide Sanitaires 2)	Plafonds	Panneaux vissés de fibralith	I1							Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
RDC	Vol 9 (SAS d'entrée RDC)	Plafonds	Panneaux vissés de fibralith	I1							Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 11 (Local poubelle)	Plafonds	Panneaux vissés de fibralith	I1							Impossible de voir de façon exhaustive tous les matériaux présents sous les panneaux.
SOUS-SOL	Vol 3 (Accès caves)	Plafonds	Enduit ciment	P4	Réalisation d'un prélevement	plafond brut sous panneaux de fibralith	002OY000235 n°4 - 1 - 002OY000235 n°4 - 2	P4	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
SOUS-SOL	Vol 5 (Accès sous-sol) - Vol 2 (Local à velo) - Vol 4 (local) - Vol 7 (Local commun) - Vol 41 (Vide Sanitaires 3) - Vol 42 (Vide Sanitaires 1) - Vol 6 (Vide Sanitaires 2)	Plafonds	Enduit ciment	S7 - S8 - S74 - S75 - S76 - S77 - S78 - S79	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	plafond brut sous panneaux de fibralith	002OY000235 n°4 - 1 - 002OY000235 n°4 - 2	P4	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (SAS d'entrée RDC) - Vol 11 (Local poubelle)	Plafonds	Enduit ciment	S23 - S44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	plafond brut sous panneaux de fibralith	002OY000235 n°4 - 1 - 002OY000235 n°4 - 2	P4	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P10	Réalisation d'un prélevement	plafonds placoplatre	002OY000235 n°10 - 1 - 002OY000235 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 13 (Dégagement RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P18	Réalisation d'un prélevement	enduits gouttelé sur plafonds droits	002OY000235 n°18 - 1 - 002OY000235 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2) - Vol 23 (Dégagement R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S120 - S121	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	enduits gouttelé sur plafonds droits	002OY000235 n°18 - 1 - 002OY000235 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 29 (Dégagement R+3)	Plafonds	Enduit plâtre	S122	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	enduits gouttelé sur plafonds droits	002OY000235 n°18 - 1 - 002OY000235 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 18 (Local technique R+2)	Plafonds	Enduit ciment	P19	Réalisation d'un prélevement	des locaux techniques	002OY000235 n°19 - 1 - 002OY000235 n°19 - 2	P19	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2) - Vol 21 (Local V.O R+2) - Vol 23 (Dégagement R+1) - Vol 27 (Local V.O R+1) - Vol 24 (Local technique R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S45 - S46 - S63 - S64 - S65	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	des locaux techniques	002OY000235 n°19 - 1 - 002OY000235 n°19 - 2	P19	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 14 (Local technique RDC) - Vol 13 (Dégagement RDC)	Plafonds	Enduit ciment	S127 - S143	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	des locaux techniques	002OY000235 n°19 - 1 - 002OY000235 n°19 - 2	P19	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 36 (Local technique R+4) - Vol 33 (Local V.O R+3) - Vol 39 (Local V.O R+4) - Vol 30 (Local technique R+3) - Vol 29 (Dégagement R+3) - Vol 35 (Dégagement R+4)	Plafonds	Enduit ciment	S123 - S124 - S125 - S126 - S140 - S141 - S142	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	des locaux techniques	002OY000235 n°19 - 1 - 002OY000235 n°19 - 2	P19	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P24	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre et enduit ciment + peinture gouttelé blanche sous face escalier	002OY000235 n°24 - 1 - 002OY000235 n°24 - 2	P24 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 28 (cage d'escalier R+1) - Vol 22 (cage d'escalier R+2)	Plafonds	Enduit plâtre	S152 - S153	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Enduit platre et enduit ciment + peinture gouttelé blanche sous face escalier	002OY000235 n°24 - 1 - 002OY000235 n°24 - 2	P24 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 40 (cage d'escalier R+4) - Vol 34 (cage d'escalier R+3)	Plafonds	Enduit plâtre	S154 - S155	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Enduit platre et enduit ciment + peinture gouttelé blanche sous face escalier	002OY000235 n°24 - 1 - 002OY000235 n°24 - 2	P24 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P24	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre et enduit ciment + peinture gouttelé blanche sous face escalier	002OY000235 n°24 - 1 - 002OY000235 n°24 - 2	P24 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 28 (cage d'escalier R+1) - Vol 22 (cage d'escalier R+2)	Plafonds	Enduit plâtre	S152 - S153	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Enduit platre et enduit ciment + peinture gouttelé blanche sous face escalier	002OY000235 n°24 - 1 - 002OY000235 n°24 - 2	P24 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 40 (cage d'escalier R+4) - Vol 34 (cage d'escalier R+3)	Plafonds	Enduit plâtre	S154 - S155	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Enduit platre et enduit ciment + peinture gouttelé blanche sous face escalier	002OY000235 n°24 - 1 - 002OY000235 n°24 - 2	P24 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 21 (Local V.O R+2)	Plafonds	Enduit ciment	P31	Réalisation d'un prélevement	rebouchage conduits des locaux techniques	002OY000235 n°31 - 1 - 002OY000235 n°31 - 2	P31	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 21 (Local V.O R+2) - Vol 18 (Local technique R+2) - Vol 24 (Local technique R+1) - Vol 27 (Local V.O R+1)	Plafonds	Enduit ciment	P31 - S87 - S177 - S178	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	rebouchage conduits des locaux techniques	002OY000235 n°31 - 1 - 002OY000235 n°31 - 2	P31	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 14 (Local technique RDC)	Plafonds	Enduit ciment	S183	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	rebouchage conduits des locaux techniques	002OY000235 n°31 - 1 - 002OY000235 n°31 - 2	P31	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 39 (Local V.O R+4) - Vol 36 (Local technique R+4) - Vol 33 (Local V.O R+3) - Vol 30 (Local technique R+3)	Plafonds	Enduit ciment	S179 - S180 - S181 - S182	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	rebouchage conduits des locaux techniques	002OY000235 n°31 - 1 - 002OY000235 n°31 - 2	P31	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 35 (Dégagement R+4)	Plafonds	Enduit plâtre	P32	Réalisation d'un prélevement	enduits gouttelé sur plafonds dernier étage	002OY000235 n°32 - 1 - 002OY000235 n°32 - 2	P32	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 40 (cage d'escalier R+4)	Plafonds	Enduit plâtre	P33	Réalisation d'un prélevement	enduits lissés cage d'escalier plafond dernier étage	002OY000235 n°33 - 1 - 002OY000235 n°33 - 2	P33	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant gauche	Vol 45 (Façade avant gauche)	Plafonds	Enduit ciment	P45	Réalisation d'un prélevement		002OY000235 n°45 - 1 - 002OY000235 n°45 - 2	P45 Phase 1	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant gauche	Vol 45 (Façade avant gauche)	Plafonds	Enduit ciment	P45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P45		002OY000235 n°45 - 1 - 002OY000235 n°45 - 2	P45 Phase 1	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant droite	Vol 46 (Façade avant droite)	Plafonds	Enduit ciment	S190	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P45		002OY000235 n°45 - 1 - 002OY000235 n°45 - 2	P45 Phase 1	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
pignon droit	Vol 47 (pignon droit)	Plafonds	Enduit ciment	S188	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P45		002OY000235 n°45 - 1 - 002OY000235 n°45 - 2	P45 Phase 1	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
façade arrière	Vol 48 (façade arrière)	Plafonds	Enduit ciment	S189	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P45		002OY000235 n°45 - 1 - 002OY000235 n°45 - 2	P45 Phase 1	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant gauche	Vol 45 (Façade avant gauche)	Plafonds	Enduit ciment	P45	Réalisation d'un prélevement		002OY000235 n°45 - 1 - 002OY000235 n°45 - 2	P45 Phase 2	Peintures multiples avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant gauche	Vol 45 (Façade avant gauche)	Plafonds	Enduit ciment	P45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P45		002OY000235 n°45 - 1 - 002OY000235 n°45 - 2	P45 Phase 2	Peintures multiples avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant droite	Vol 46 (Façade avant droite)	Plafonds	Enduit ciment	S190	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P45		002OY000235 n°45 - 1 - 002OY000235 n°45 - 2	P45 Phase 2	Peintures multiples avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
pignon droit	Vol 47 (pignon droit)	Plafonds	Enduit ciment	S188	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P45		002OY000235 n°45 - 1 - 002OY000235 n°45 - 2	P45 Phase 2	Peintures multiples avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
façade arrière	Vol 48 (façade arrière)	Plafonds	Enduit ciment	S189	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P45		002OY000235 n°45 - 1 - 002OY000235 n°45 - 2	P45 Phase 2	Peintures multiples avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélevement	marbré beige	002OY000235 n°13 - 1 - 002OY000235 n°13 - 2	P13	Colle beige en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 10 (Hall d'entrée RDC) - Vol 13 (Dégagement RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	marbré beige	002OY000235 n°13 - 1 - 002OY000235 n°13 - 2	P13	Colle beige en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
SOUS-SOL	Vol 5 (Accès sous-sol)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P3	Réalisation d'un prélevement	béton lissé	002OY000235 n°3 - 1 - 002OY000235 n°3 - 2	P3	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
SOUS-SOL	Vol 3 (Accès caves) - Vol 2 (Local à velo) - Vol 6 (Vide Sanitaires 2) - Vol 4 (local) - Vol 7 (Local commun)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S1 - S6 - S80 - S81 - S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	béton lissé	002OY000235 n°3 - 1 - 002OY000235 n°3 - 2	P3	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	béton lissé	002OY000235 n°3 - 1 - 002OY000235 n°3 - 2	P3	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Dégagement RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P14	Réalisation d'un prélevement	marbré beige	002OY000235 n°14 - 1 - 002OY000235 n°14 - 2	P14	Colle grise + joint cassant blanc avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 10 (Hall d'entrée RDC) - Vol 9 (SAS d'entrée RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S111 - S112	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	marbré beige	002OY000235 n°14 - 1 - 002OY000235 n°14 - 2	P14	Colle grise + joint cassant blanc avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 27 (Local V.O R+1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P20	Réalisation d'un prélevement	des locaux techniques	002OY000235 n°20 - 1 - 002OY000235 n°20 - 2	P20	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 24 (Local technique R+1) - Vol 23 (Dégagement R+1) - Vol 17 (Dégagement R+2) - Vol 18 (Local technique R+2) - Vol 21 (Local V.O R+2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S66 - S67 - S128 - S129 - S130	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	des locaux techniques	002OY000235 n°20 - 1 - 002OY000235 n°20 - 2	P20	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Local technique RDC) - Vol 13 (Dégagement RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S137 - S138 - S139	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	des locaux techniques	002OY000235 n°20 - 1 - 002OY000235 n°20 - 2	P20	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 35 (Dégagement R+4) - Vol 36 (Local technique R+4) - Vol 39 (Local V.O R+4) - Vol 29 (Dégagement R+3) - Vol 30 (Local technique R+3) - Vol 33 (Local V.O R+3)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S131 - S132 - S133 - S134 - S135 - S136	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	des locaux techniques	002OY000235 n°20 - 1 - 002OY000235 n°20 - 2	P20	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Revêtement de sol	marche escalier	P25	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment	002OY000235 n°25 - 1 - 002OY000235 n°25 - 2	P25	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 28 (cage d'escalier R+1) - Vol 22 (cage d'escalier R+2)	Revêtement de sol	marche escalier	S156 - S157	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Enduit ciment	002OY000235 n°25 - 1 - 002OY000235 n°25 - 2	P25	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 40 (cage d'escalier R+4) - Vol 34 (cage d'escalier R+3)	Revêtement de sol	marche escalier	S158 - S159	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Enduit ciment	002OY000235 n°25 - 1 - 002OY000235 n°25 - 2	P25	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Revêtement de sol	Ragréage	P26	Réalisation d'un prélevement	Sous linoléum marron (cages d'escalier)	002OY000235 n°26 - 1 - 002OY000235 n°26 - 2	P26	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 28 (cage d'escalier R+1) - Vol 22 (cage d'escalier R+2)	Revêtement de sol	Ragréage	S160 - S161	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Sous linoléum marron (cages d'escalier)	002OY000235 n°26 - 1 - 002OY000235 n°26 - 2	P26	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+3 & R+4	Vol 40 (cage d'escalier R+4) - Vol 34 (cage d'escalier R+3)	Revêtement de sol	Ragréage	S162 - S163	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Sous linoléum marron (cages d'escalier)	002OY000235 n°26 - 1 - 002OY000235 n°26 - 2	P26	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 28 (cage d'escalier R+1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P27	Réalisation d'un prélevement	linoléum marrons +colle jaune	002OY000235 n°27 - 1 - 002OY000235 n°27 - 2	P27	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 22 (cage d'escalier R+2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S164	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	linoléum marrons +colle jaune	002OY000235 n°27 - 1 - 002OY000235 n°27 - 2	P27	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S165	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	linoléum marrons +colle jaune	002OY000235 n°27 - 1 - 002OY000235 n°27 - 2	P27	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 40 (cage d'escalier R+4) - Vol 34 (cage d'escalier R+3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S166 - S167	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	linoléum marrons +colle jaune	002OY000235 n°27 - 1 - 002OY000235 n°27 - 2	P27	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1 & R+2	Vol 23 (Dégagement R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	P28	Réalisation d'un prélevement	gris d'origine sous dalles plastiques	002OY000235 n°28 - 1 - 002OY000235 n°28 - 2	P28	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2)	Revêtement de sol	Ragréage	S168	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	gris d'origine sous dalles plastiques	002OY000235 n°28 - 1 - 002OY000235 n°28 - 2	P28	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 & R+4	Vol 35 (Dégagement R+4) - Vol 29 (Dégagement R+3)	Revêtement de sol	Ragréage	S169 - S170	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	gris d'origine sous dalles plastiques	002OY000235 n°28 - 1 - 002OY000235 n°28 - 2	P28	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 & R+2	Vol 23 (Dégagement R+1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P29	Réalisation d'un prélevement	Grise marbré	002OY000235 n°29 - 1 - 002OY000235 n°29 - 2	P29	Dalle dure cassante bleue avec poussières	Positif	Présence sur analyse
R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S171 (P29)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Grise marbré	002OY000235 n°29 - 1 - 002OY000235 n°29 - 2	P29	Dalle dure cassante bleue avec poussières	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+3 & R+4	Vol 35 (Dégagement R+4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S172 (P29)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Grise marbré	002OY000235 n°29 - 1 - 002OY000235 n°29 - 2	P29	Dalle dure cassante bleue avec poussières	Positif	Présence sur analyse
R+3 & R+4	Vol 29 (Dégagement R+3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S173 (P29)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Grise marbré	002OY000235 n°29 - 1 - 002OY000235 n°29 - 2	P29	Dalle dure cassante bleue avec poussières	Positif	Présence sur analyse
R+1 & R+2	Vol 23 (Dégagement R+1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P30	Réalisation d'un prélevement	noire sous dalles plastiques	002OY000235 n°30 - 1 - 002OY000235 n°30 - 2	P30	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1 & R+2	Vol 17 (Dégagement R+2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S174 (P30)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	noire sous dalles plastiques	002OY000235 n°30 - 1 - 002OY000235 n°30 - 2	P30	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+3 & R+4	Vol 35 (Dégagement R+4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S175 (P30)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	noire sous dalles plastiques	002OY000235 n°30 - 1 - 002OY000235 n°30 - 2	P30	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+3 & R+4	Vol 29 (Dégagement R+3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S176 (P30)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	noire sous dalles plastiques	002OY000235 n°30 - 1 - 002OY000235 n°30 - 2	P30	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse et toiture	Vol 43 (Toiture terrasse)	Eléments ponctuels	Mitron	S99	Résalisation d'un sondage	en fibre-ciment au-dessus du vide ordure	S99 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse et toiture	Vol 43 (Toiture terrasse)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	I2			I2 - 1				Impossibilités de réaliser des prélèvements du complexe d' étanchéité recouvrant la toiture et ses massifs sans dégradations de celui-ci ; ce qui pourrait nuire à l' étanchéité de la toiture. De plus il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sous cette isolant.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse et toiture	Vol 44 (extérieures)	bordures	joint d'assemblage des bordures	P42	Réalisation d'un prélevement		002OY000235 n°42 - 1 - 002OY000235 n°42 - 2	P42	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse et toiture	Vol 44 (extérieures)	bordures	joint d'assemblage des bordures	P42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P42		002OY000235 n°42 - 1 - 002OY000235 n°42 - 2	P42	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse et toiture	Vol 44 (extérieures)	Revêtement routier	Ensemble Bitume couche supérieure (autour batiment)	P43	Réalisation d'un prélevement		002OY000235 n°43 - 1 - 002OY000235 n°43 - 2	P43	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse et toiture	Vol 44 (extérieures)	Revêtement routier	Ensemble Bitume couche supérieure (autour batiment)	P43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P43		002OY000235 n°43 - 1 - 002OY000235 n°43 - 2	P43	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	SOUS-SOL	SOUS-SOL - Plan de repérage - Actions menées
	SOUS-SOL	SOUS-SOL - Plan des prélèvements
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan des prélèvements
	RDC	RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+1 & R+2	R+1 & R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 & R+2	R+1 & R+2 - Plan des prélèvements
	R+1 & R+2	R+1 & R+2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1 & R+2	R+1 & R+2 - MPCA Revêtement de sol
	R+1 & R+2	R+1 & R+2 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+1 & R+2	R+1 & R+2 - MPCA Coffrages perdus
	R+3 & R+4	R+3 & R+4 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3 & R+4	R+3 & R+4 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3 & R+4	R+3 & R+4 -Plan des prélèvements
	R+3 & R+4	R+3 & R+4 - MPCA Revêtement de sol
	R+3 & R+4	R+3 & R+4 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+3 & R+4	R+3 & R+4 - MPCA Coffrages perdus
	Plan masse et toiture	Plan masse et toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse et toiture	Plan masse et toiture - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan masse et toiture	Plan masse et toiture - MPCA Toiture et étanchéité
	Plan masse et toiture	Plan masse et toiture - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façade avant gauche	Façade avant gauche - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant droite	Façade avant droite - Plan de repérage - Actions menées
	pignon droit	pignon droit - Plan de repérage - Actions menées
	façade arrière	façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	machinerie	machinerie - Plan de repérage - Actions menées

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000235

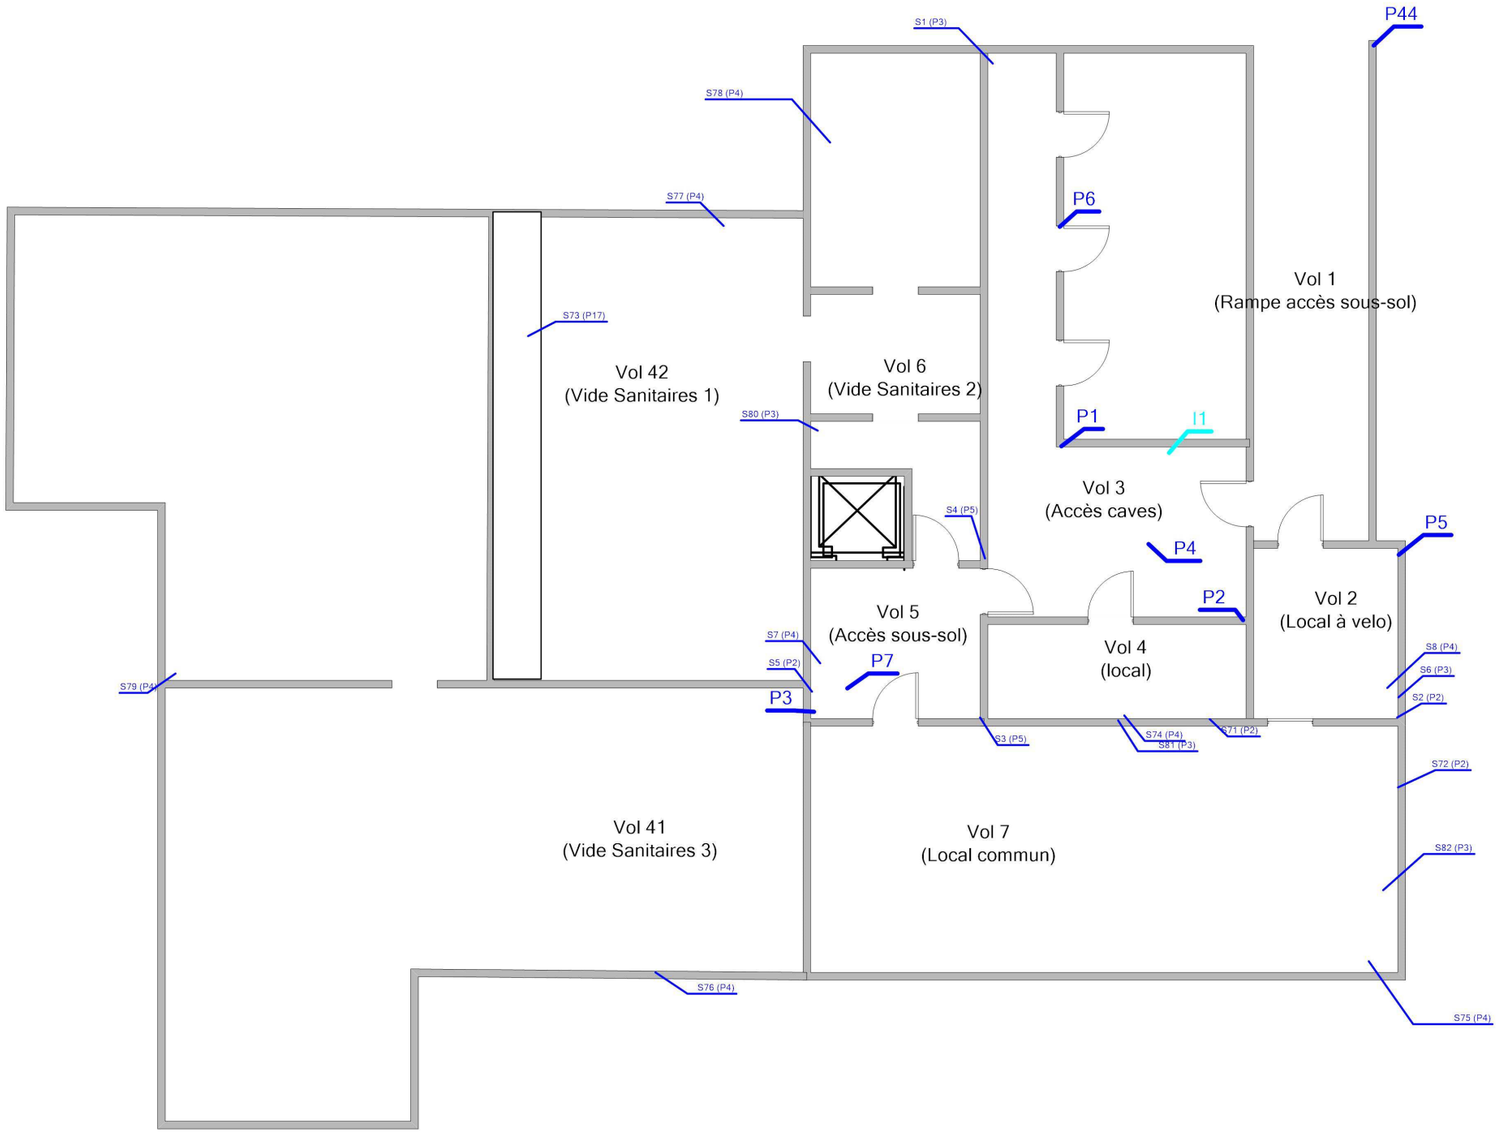

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

SOUS-SOL - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000235

Légende

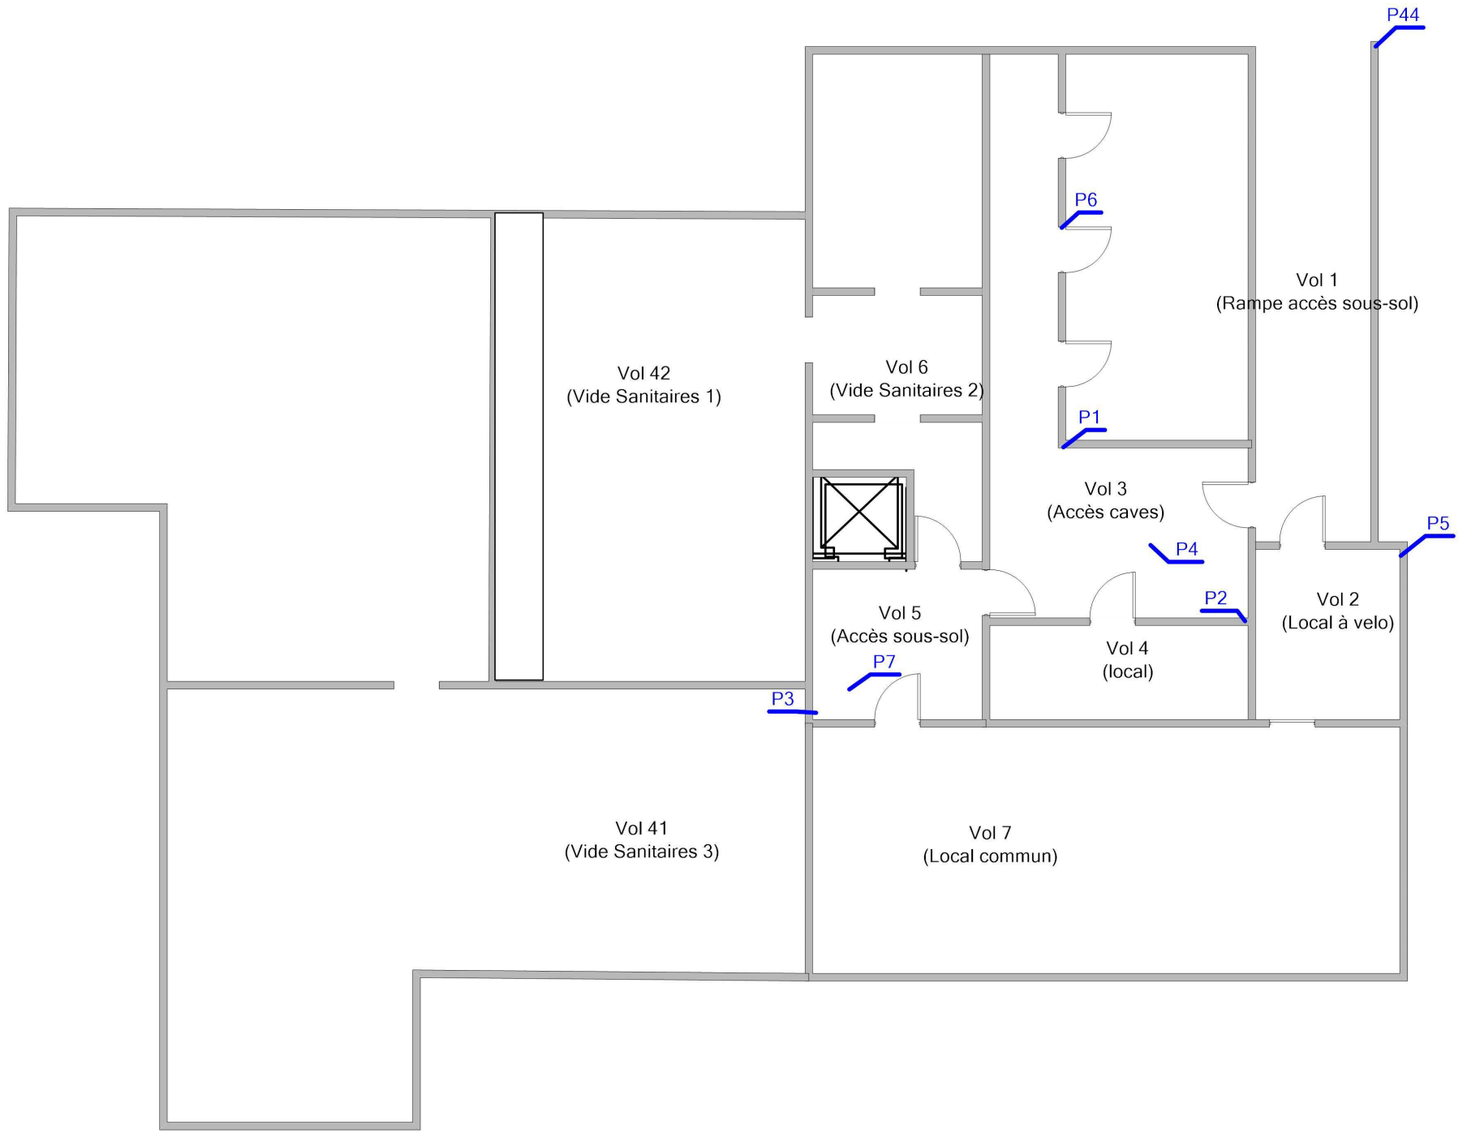

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000235

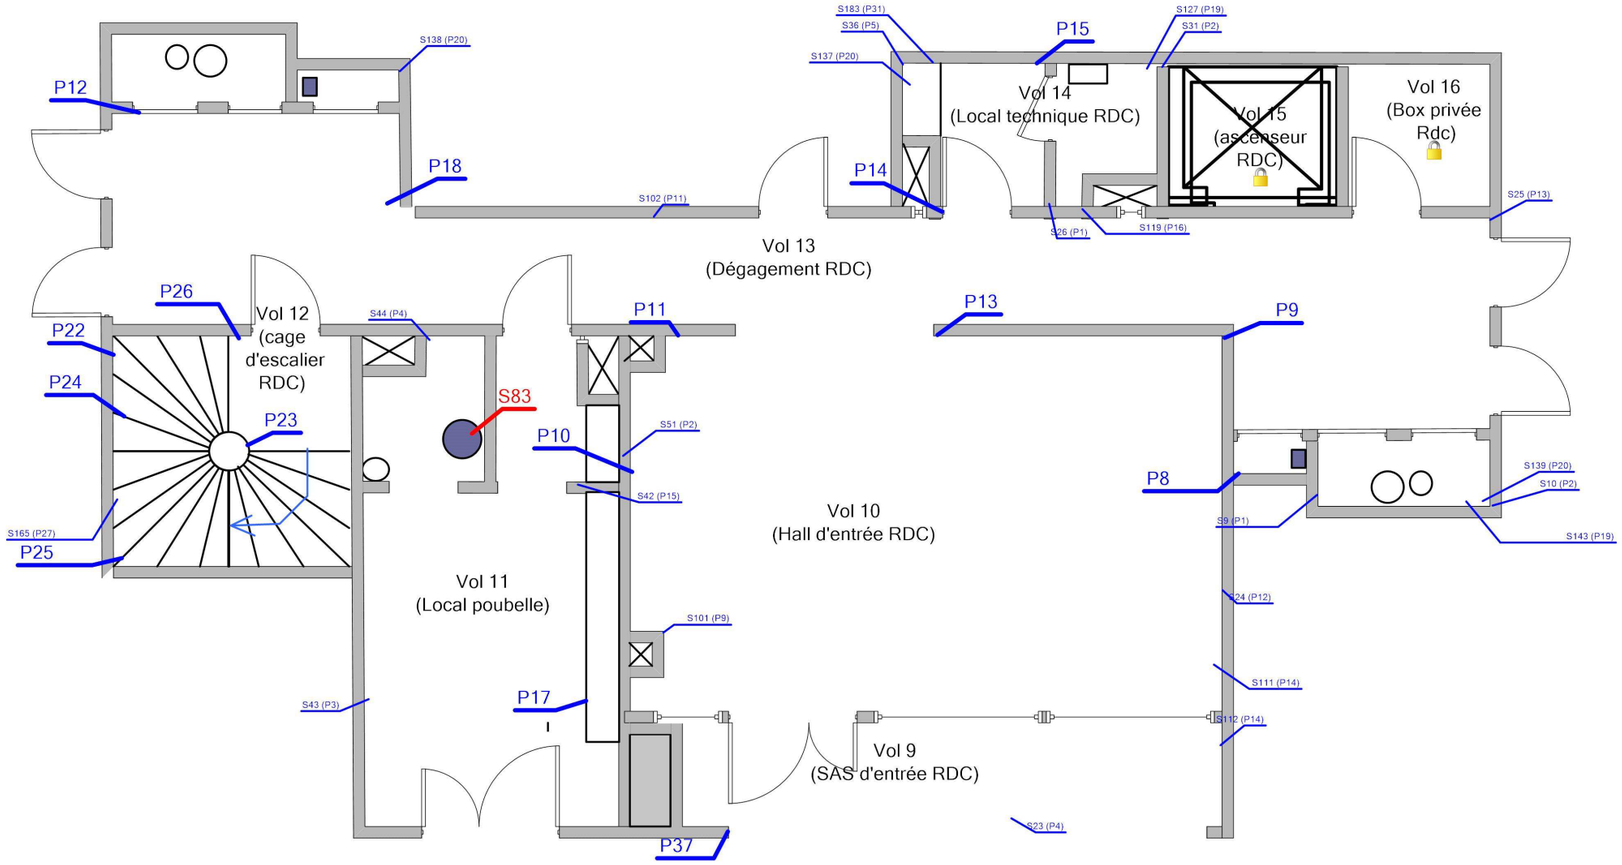

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

RDC - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000235

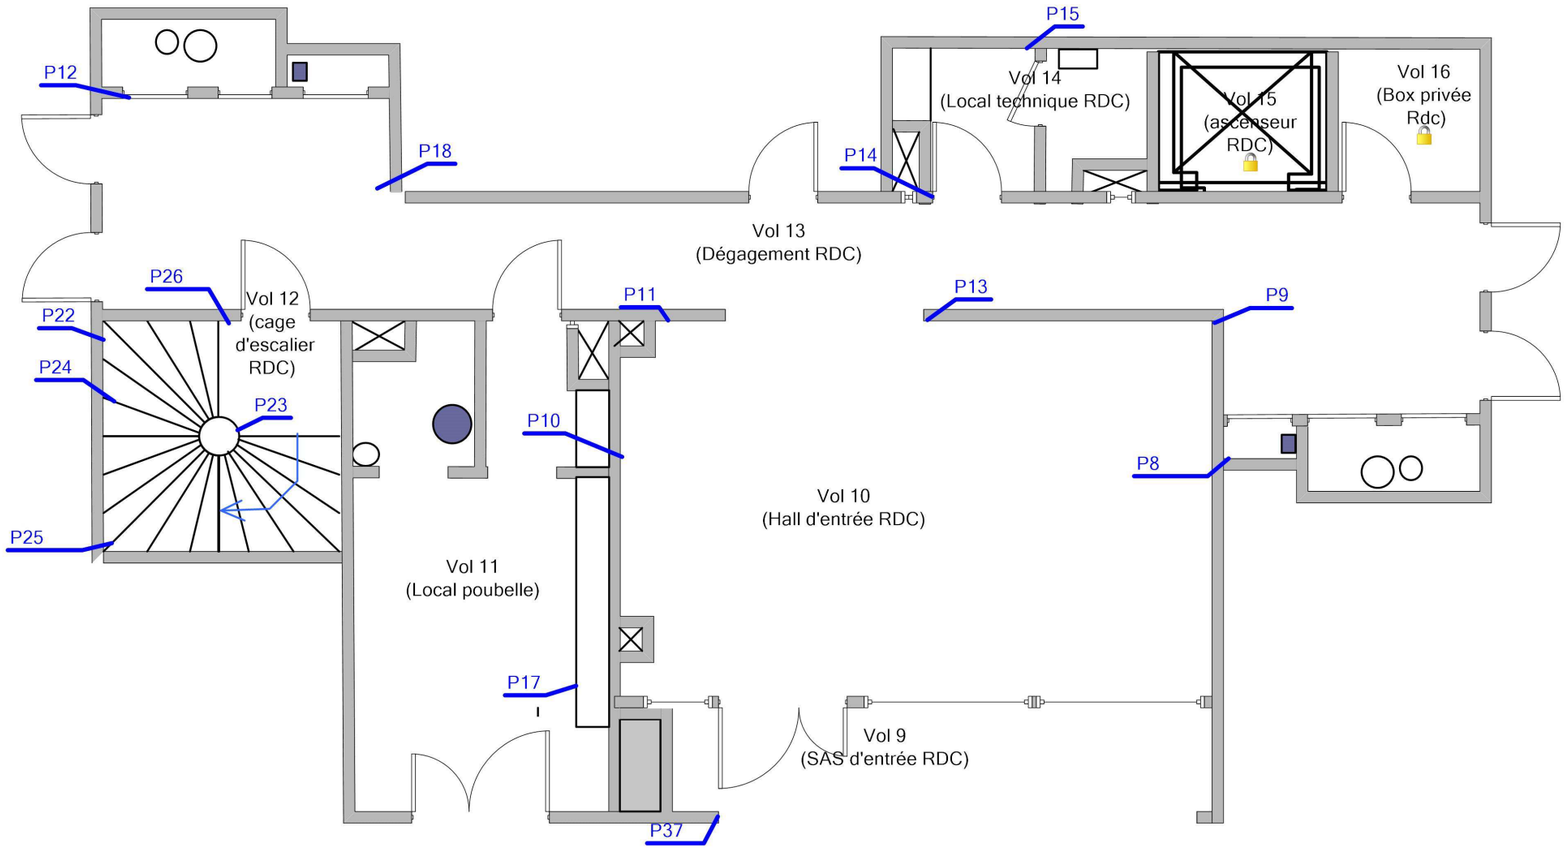

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002OY000235

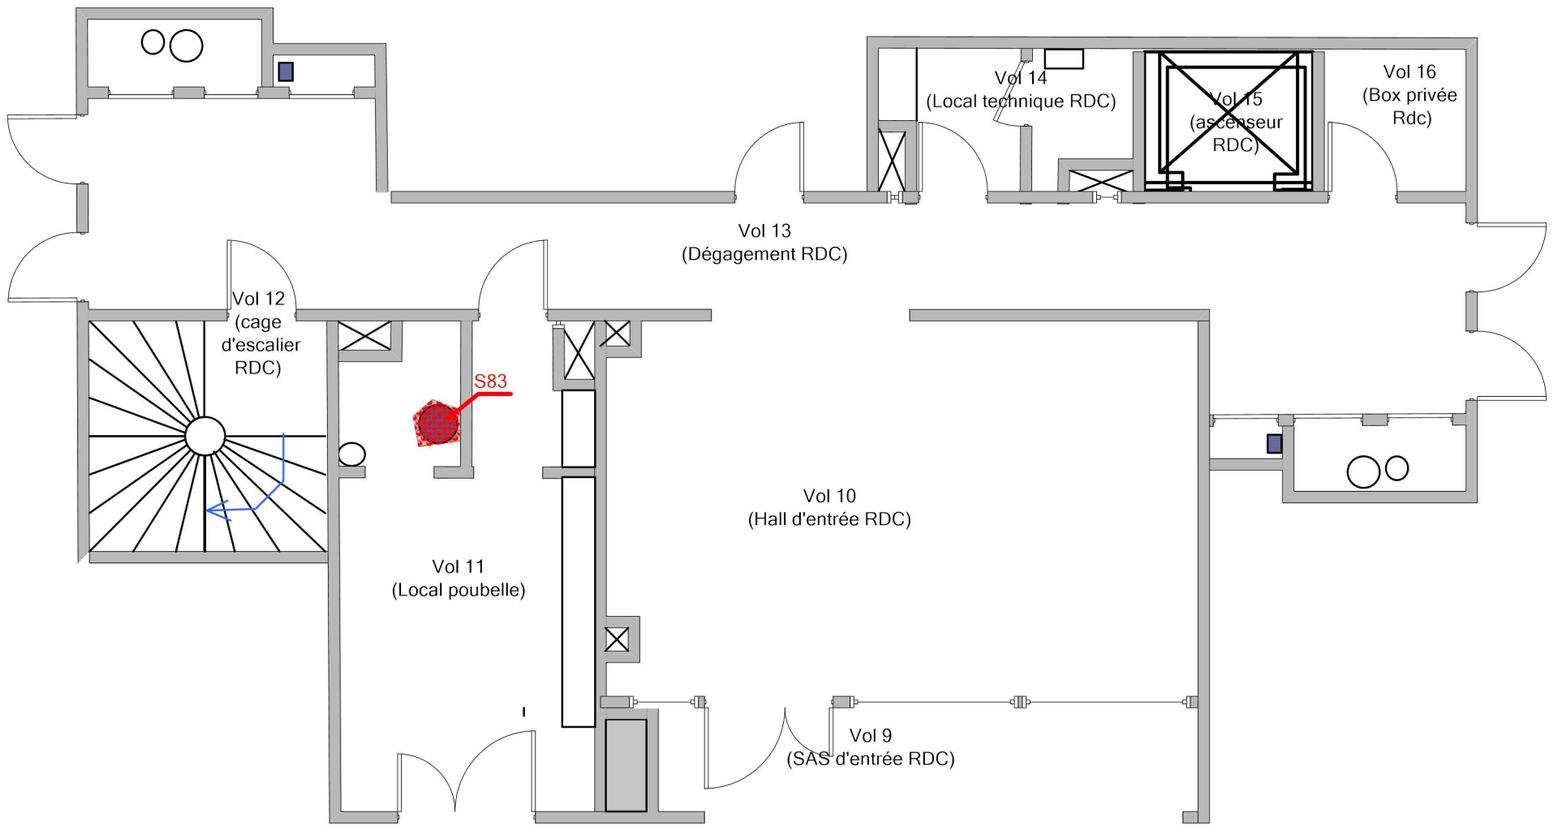

Légende

	S83: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

R+1 & R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002OY000235

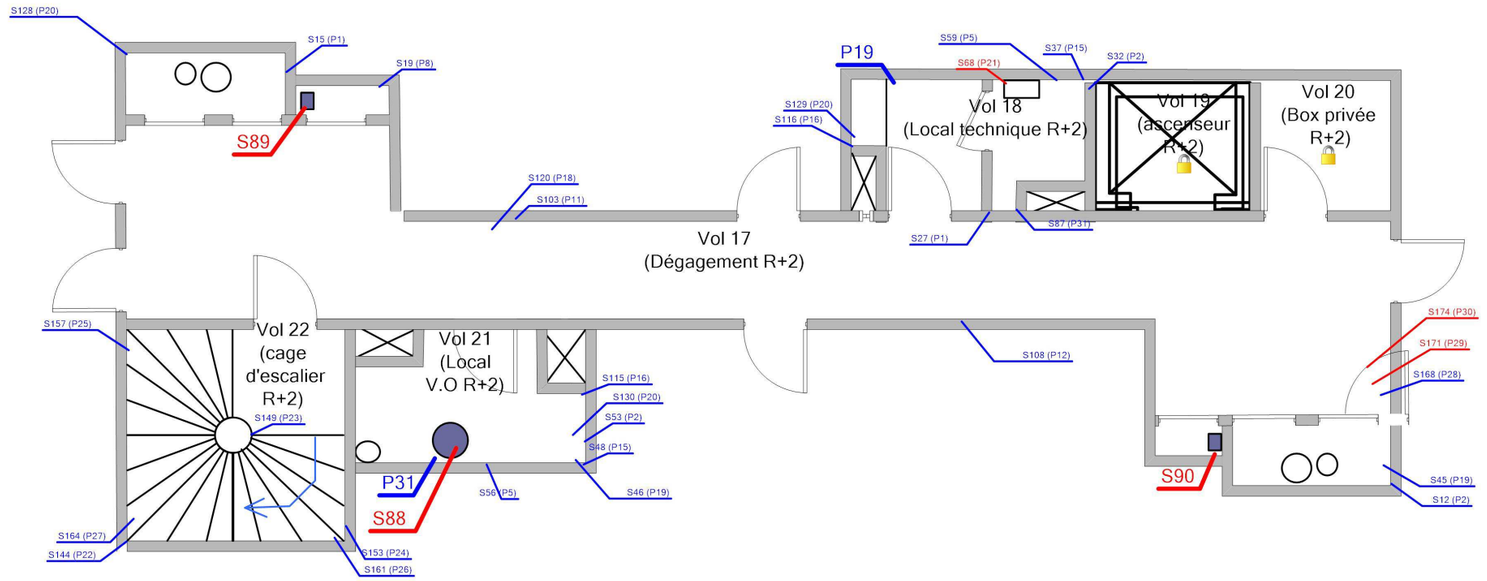

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

R+1 & R+2 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000235

Légende

	Volume non visité

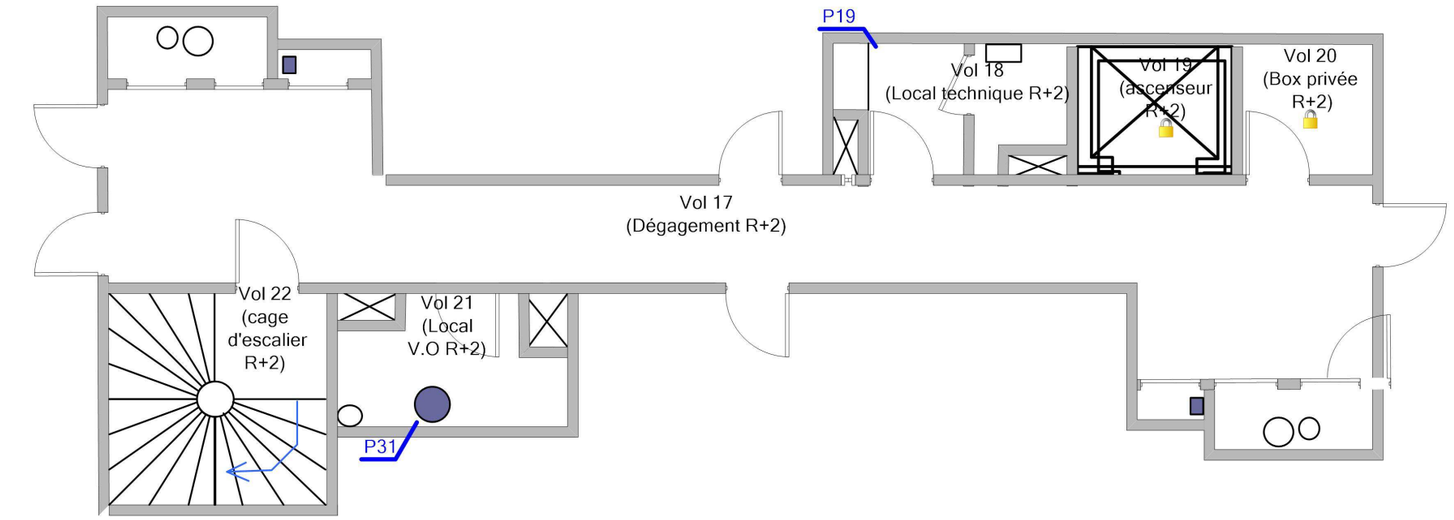

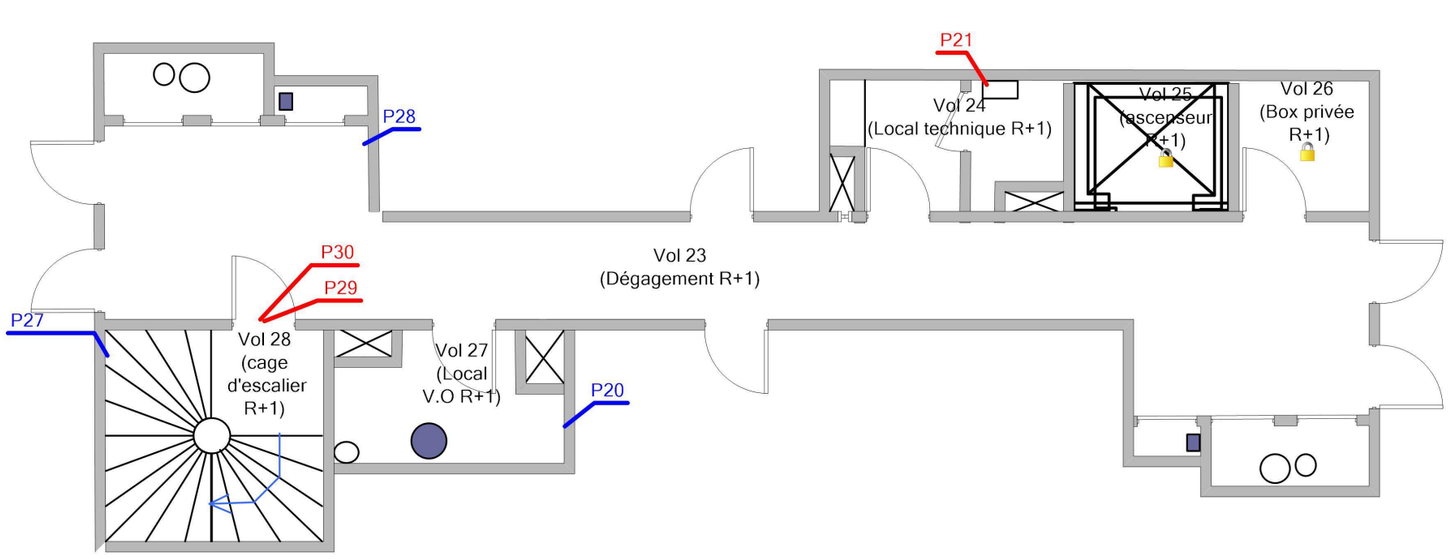

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

R+1 & R+2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002OY000235

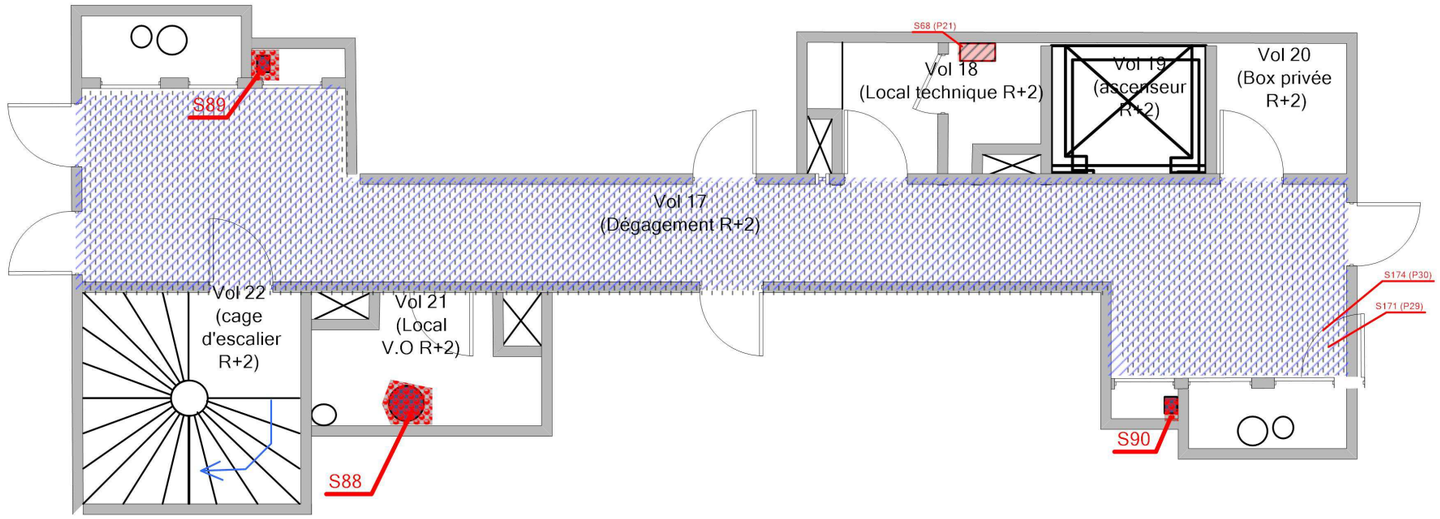

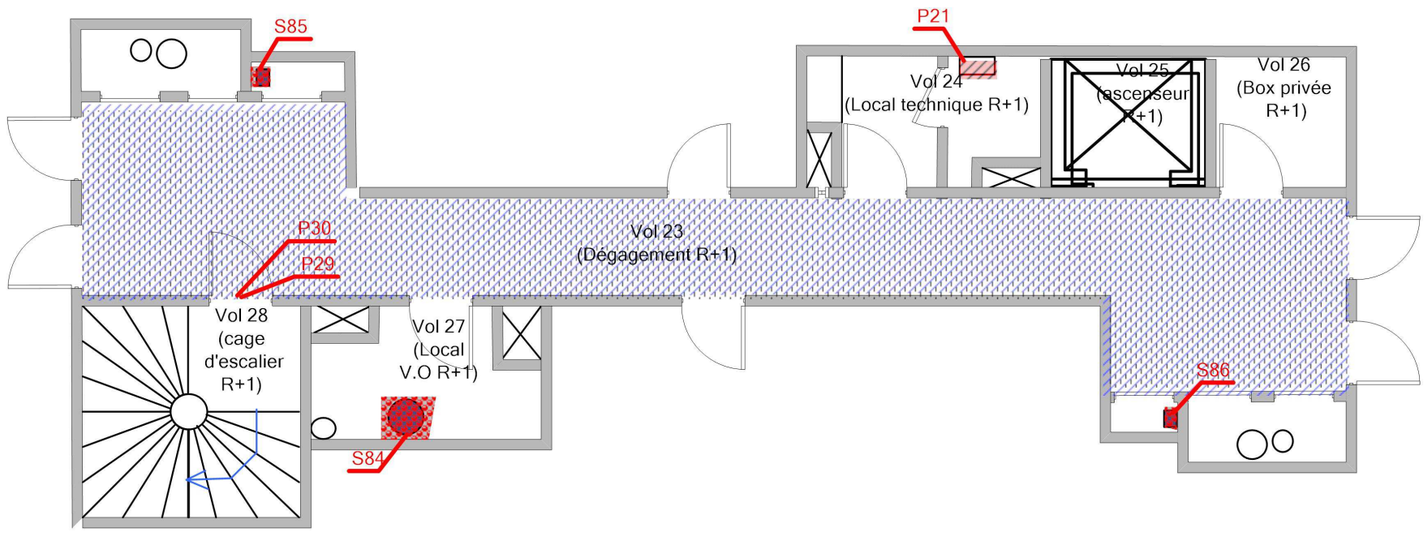

Légende

	P30 : Colle bitumeuses noire
	S84: Conduit en fibres-ciment
	S90: Conduit en fibres-ciment
	S86: Conduit en fibres-ciment
	P29 : Dalles plastiques dures cassantes bleues
	S88: Conduit en fibres-ciment
	S85: Conduit en fibres-ciment
	S89: Conduit en fibres-ciment
	P21 : plaque fibreuse sous plaque métallique

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

R+1 & R+2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002OY000235

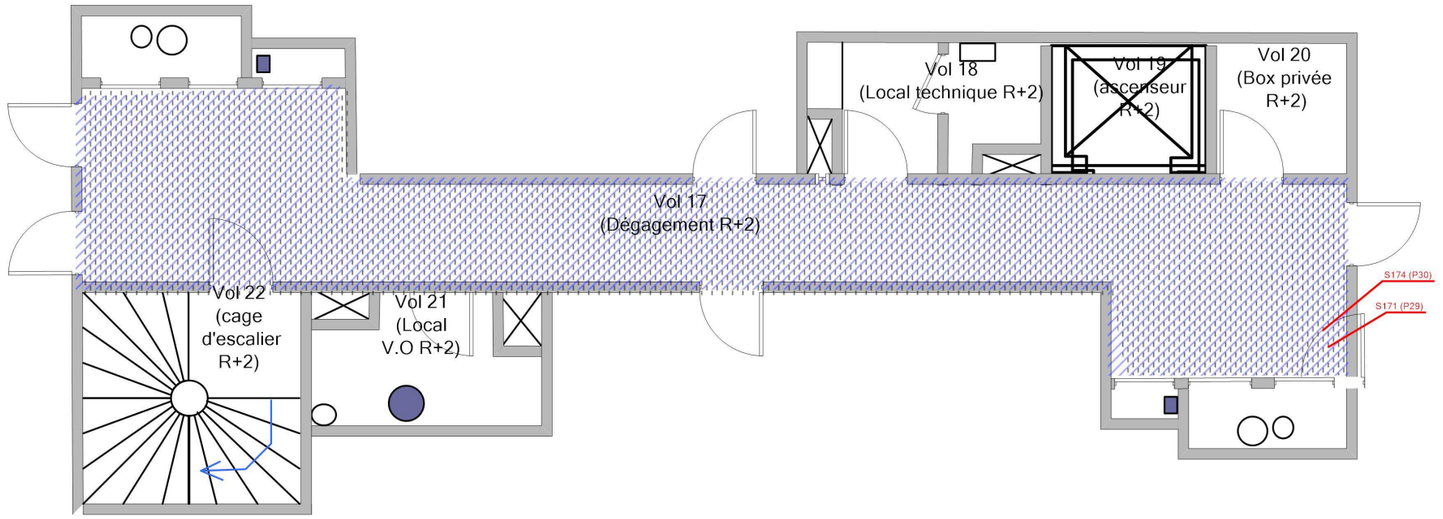

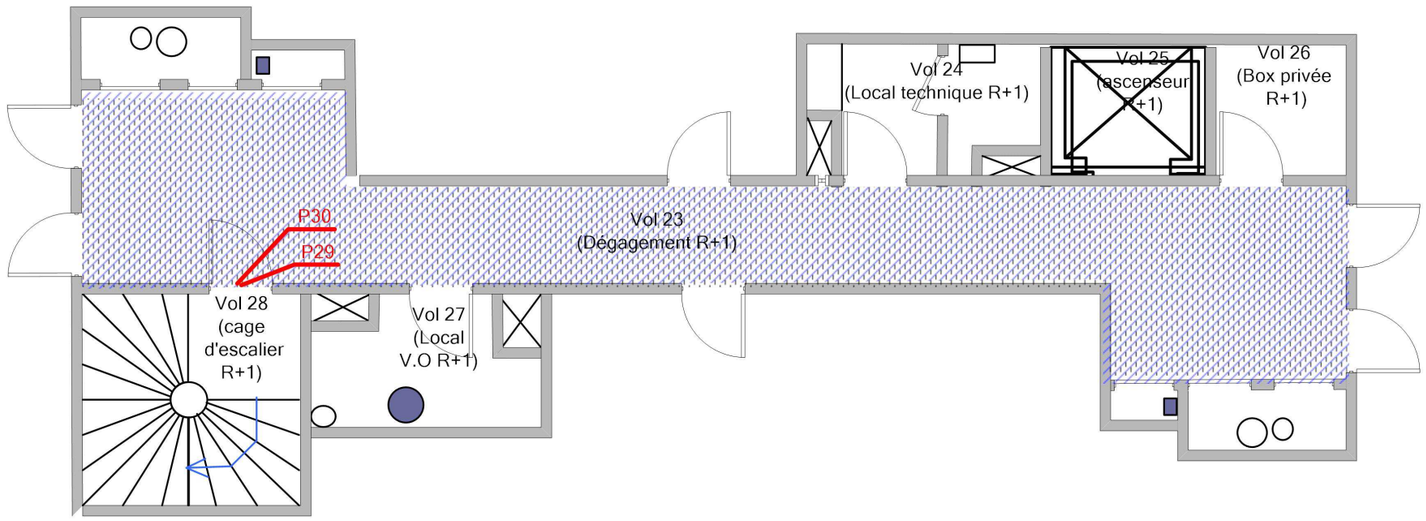

Légende

	P30 : Colle bitumeuses noire
	P29 : Dalles plastiques dures cassantes bleues

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

R+1 & R+2 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002OY000235

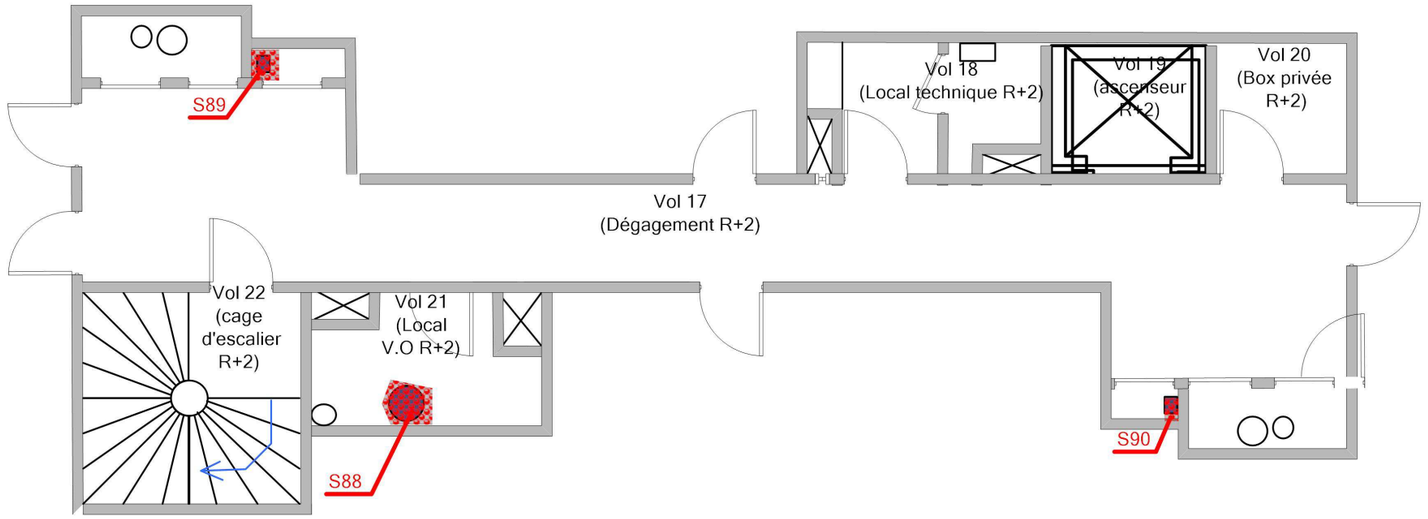

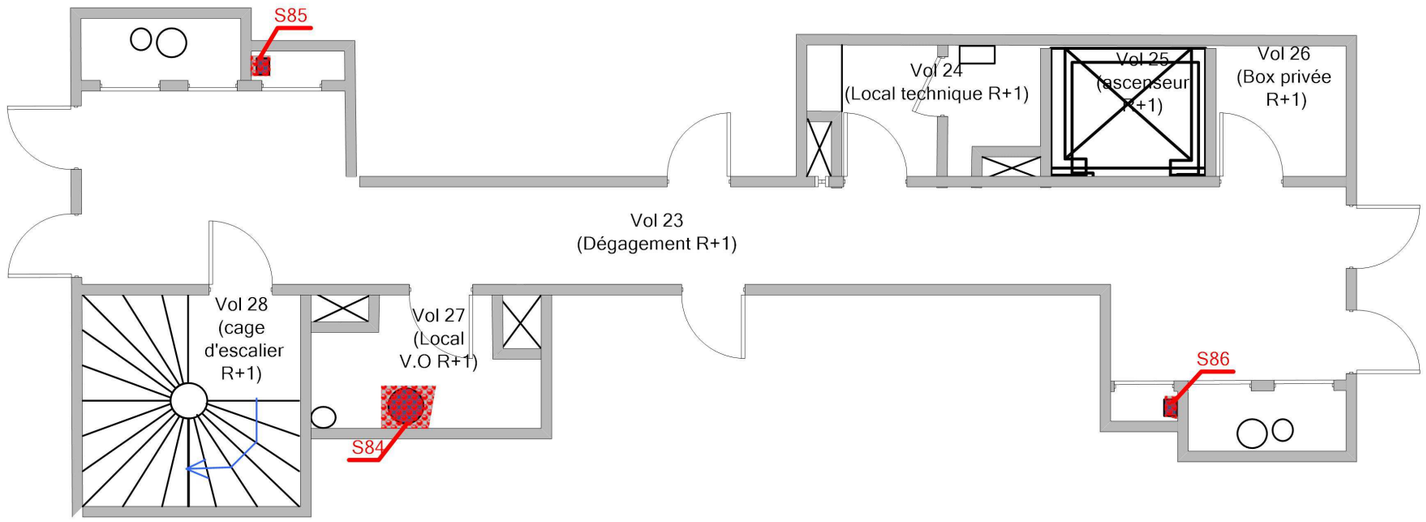

Légende

	S84: Conduit en fibres-ciment
	S90: Conduit en fibres-ciment
	S86: Conduit en fibres-ciment
	S88: Conduit en fibres-ciment
	S85: Conduit en fibres-ciment
	S89: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

R+1 & R+2 - MPCA COFFRAGES PERDUS

Référence: 002OY000235

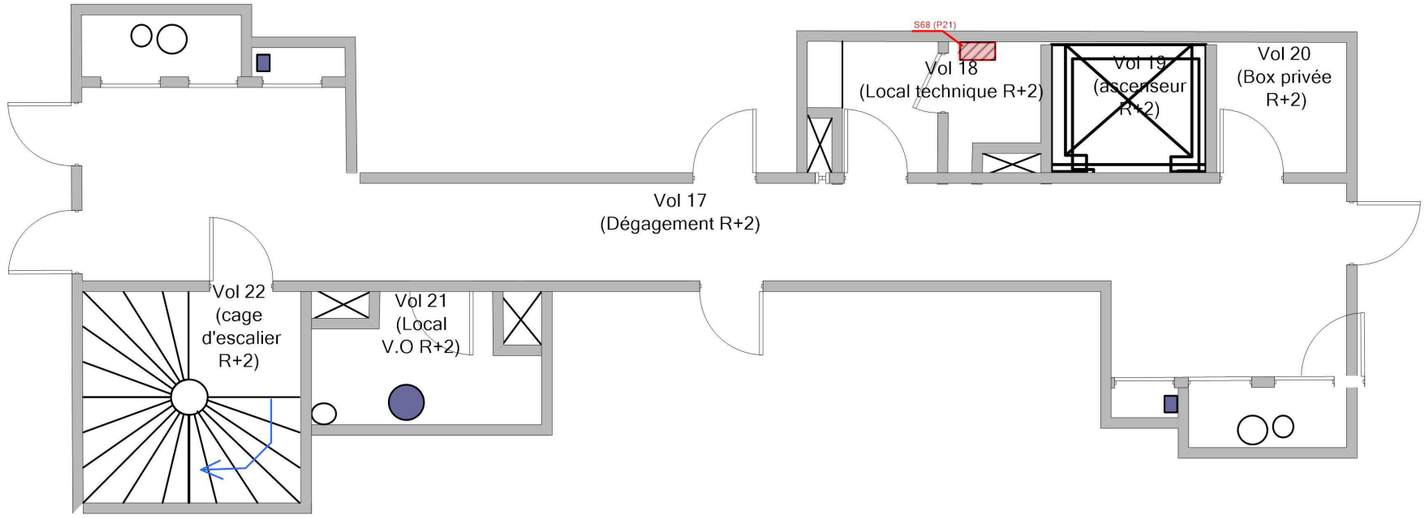

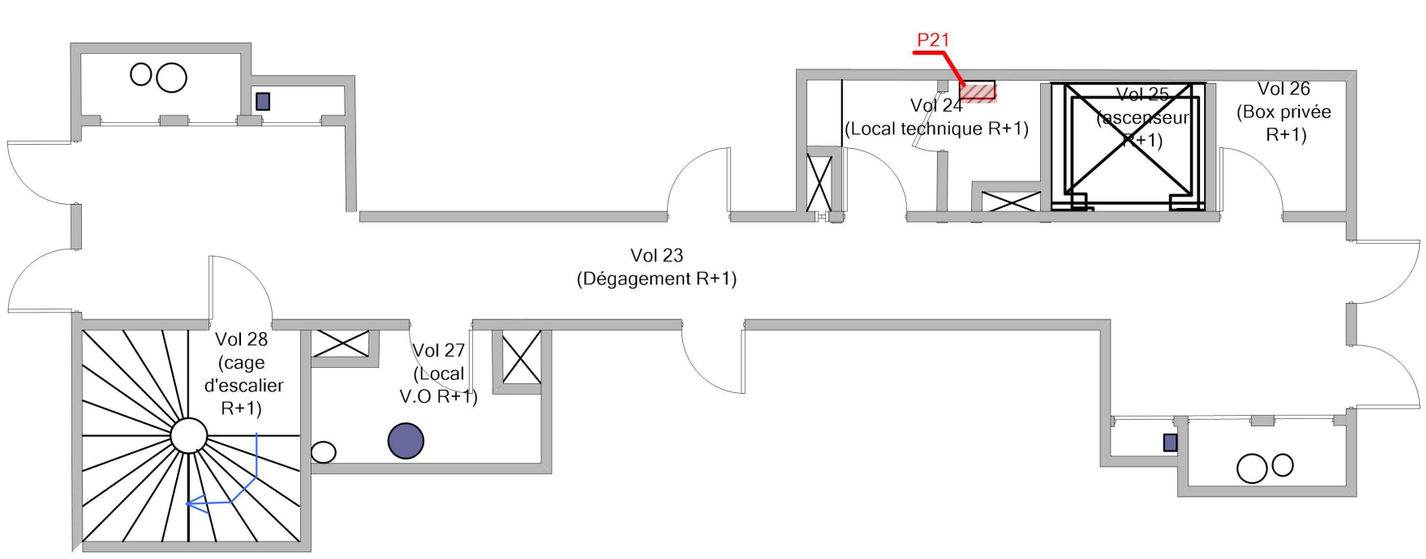

Légende

	P21 : plaque fibreuse sous plaque métallique

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

R+3 & R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000235

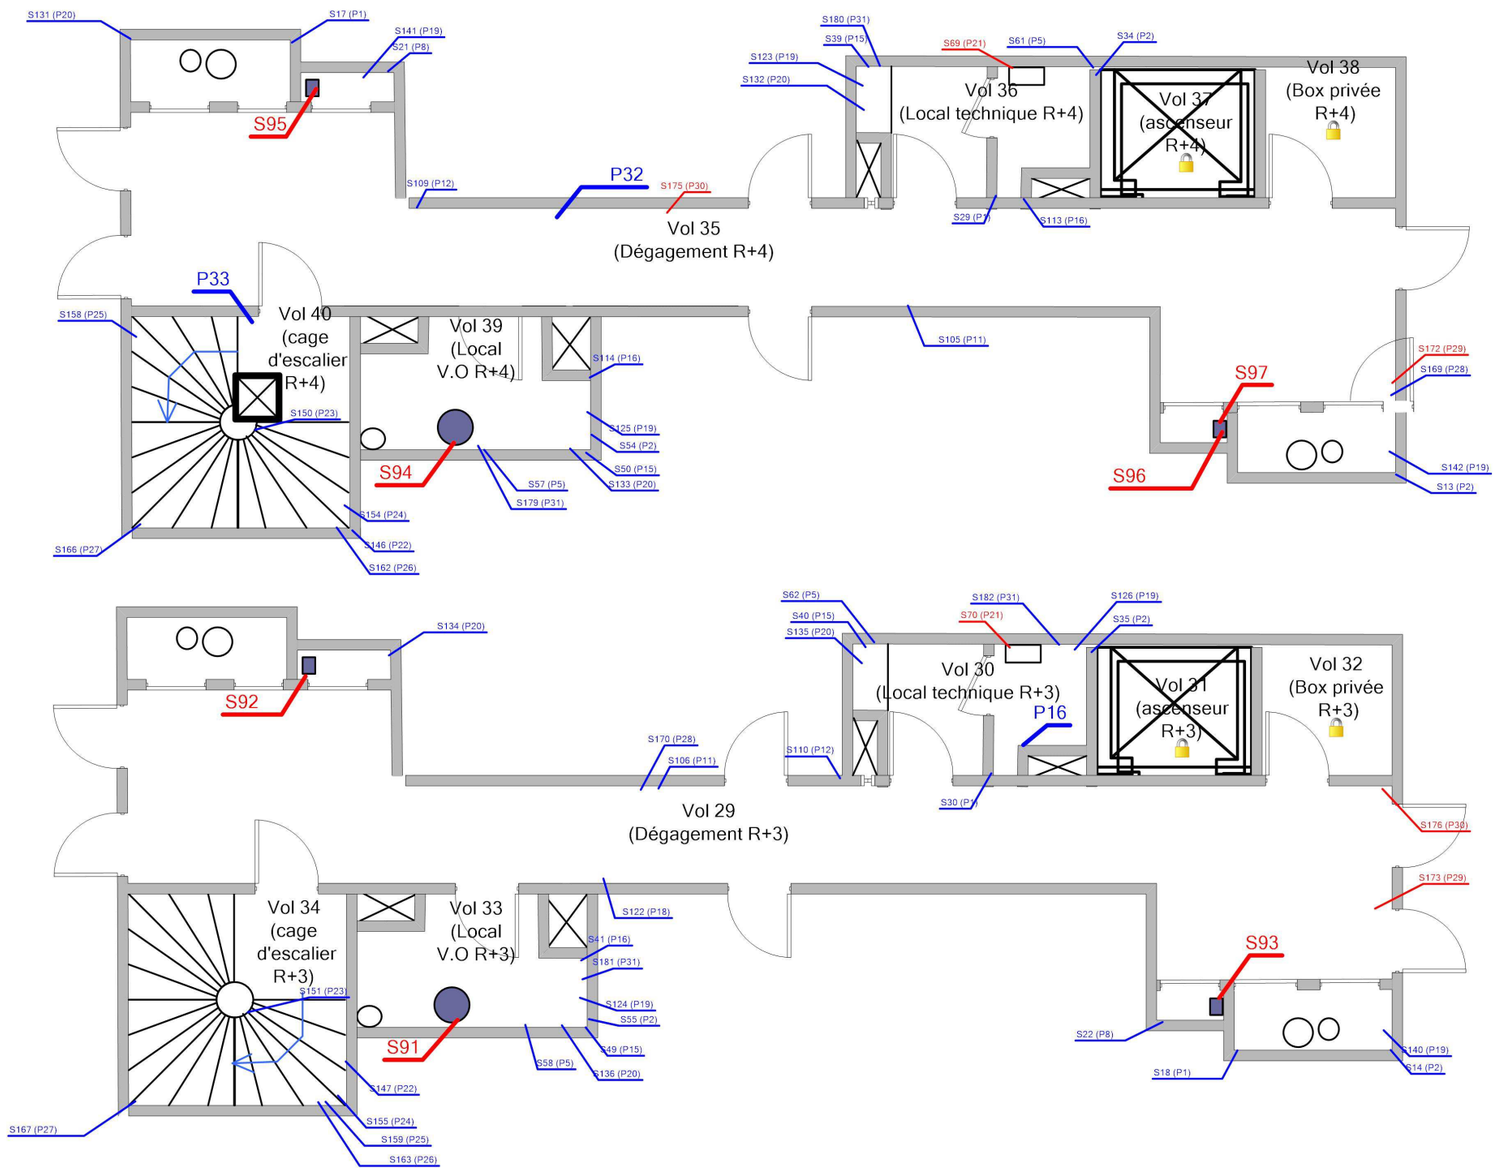

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

R+3 & R+4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence: 002OY000235

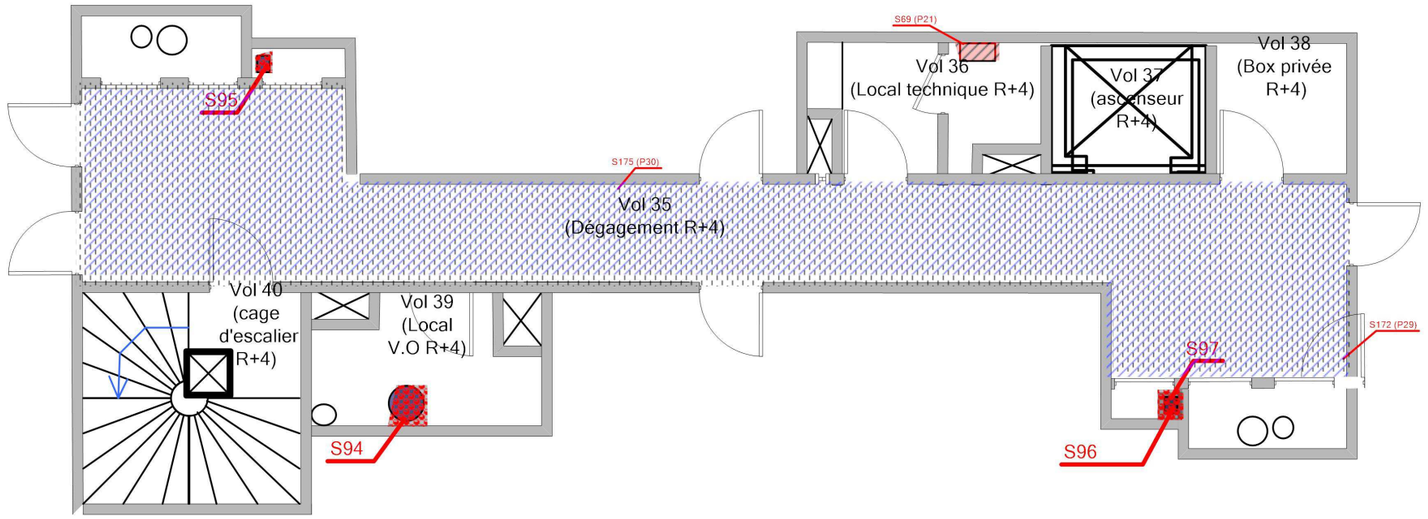

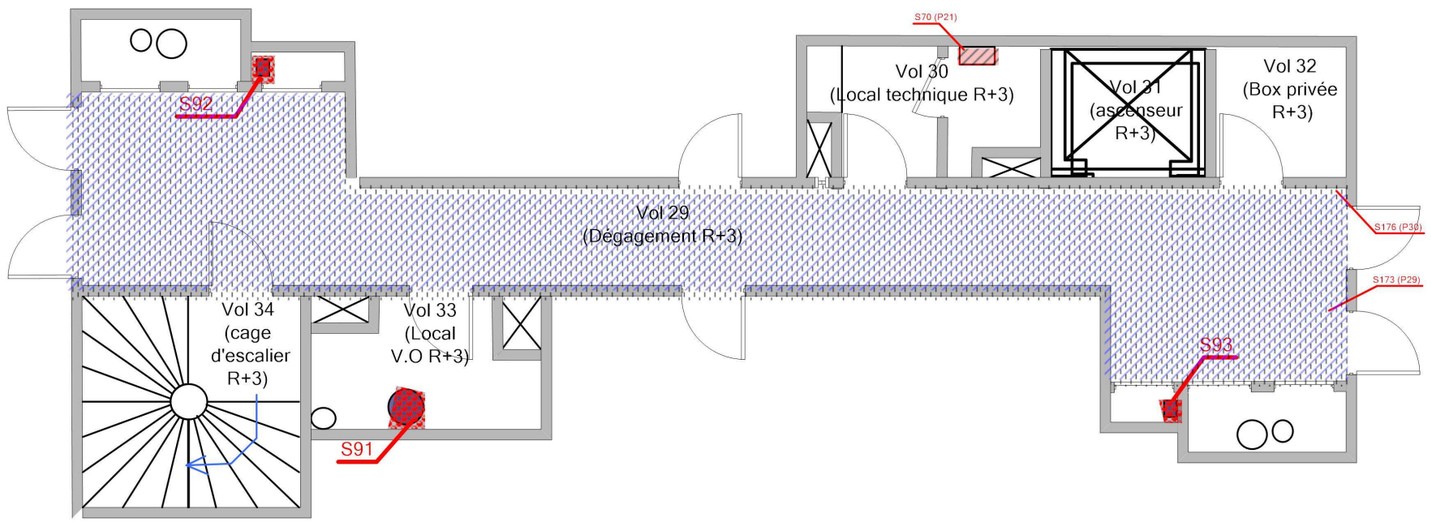

Légende

	P30 : Colle bitumeuses noire
	S95: Conduit en fibres-ciment
	S94: Conduit en fibres-ciment
	S91: Conduit en fibres-ciment
	S96: Conduit en fibres-ciment
	P29 : Dalles plastiques dures cassantes bleues
	S92: Conduit en fibres-ciment
	S93: Conduit en fibres-ciment
	S97: Conduit en fibres-ciment
	P21 : plaque fibreuse sous plaque métallique

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

R+3 & R+4 -PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000235

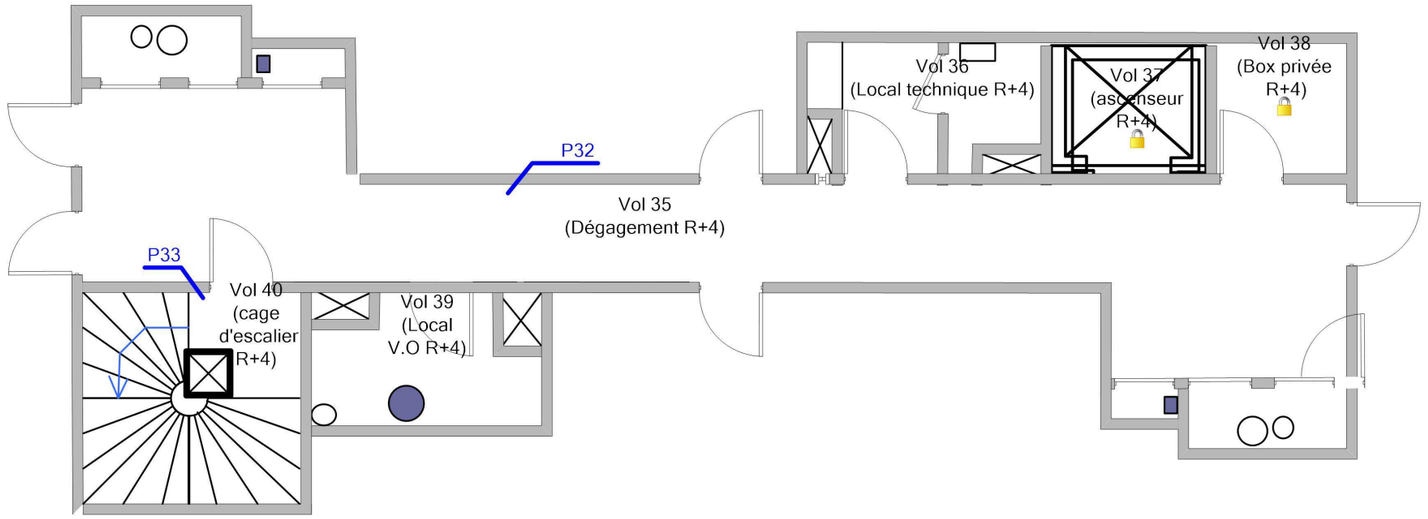

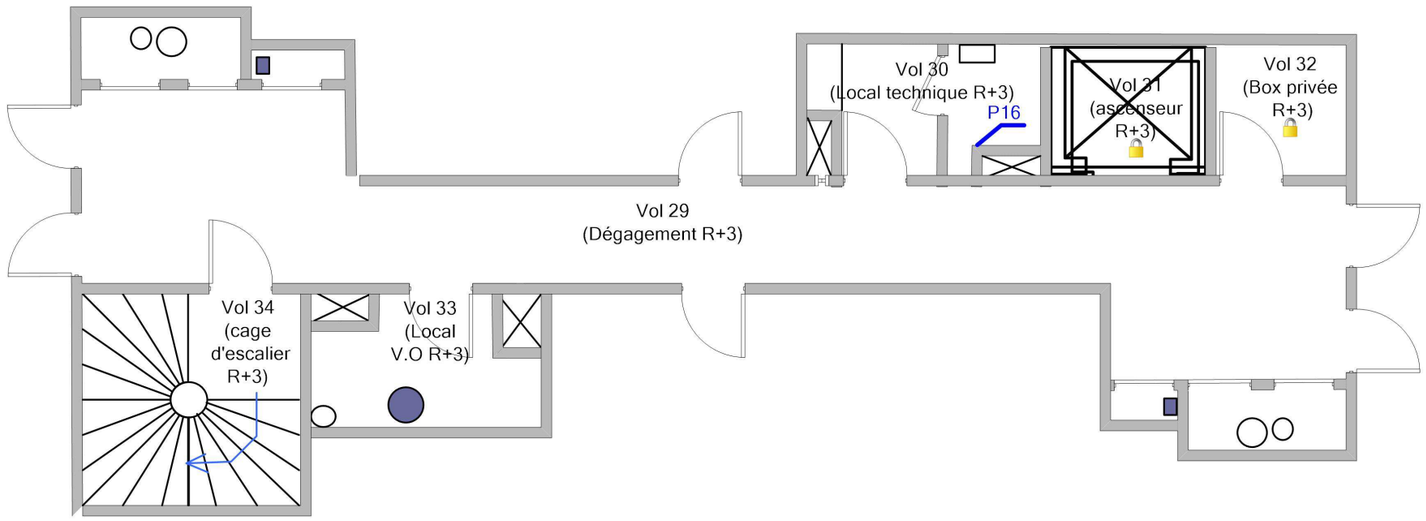

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

R+3 & R+4 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002OY000235

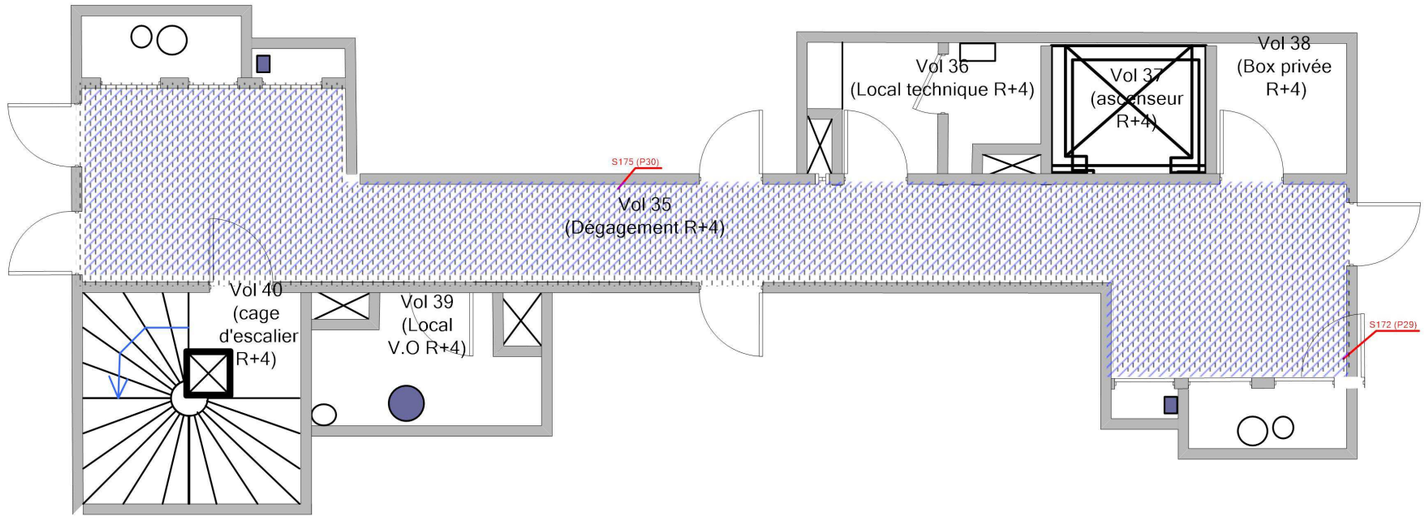

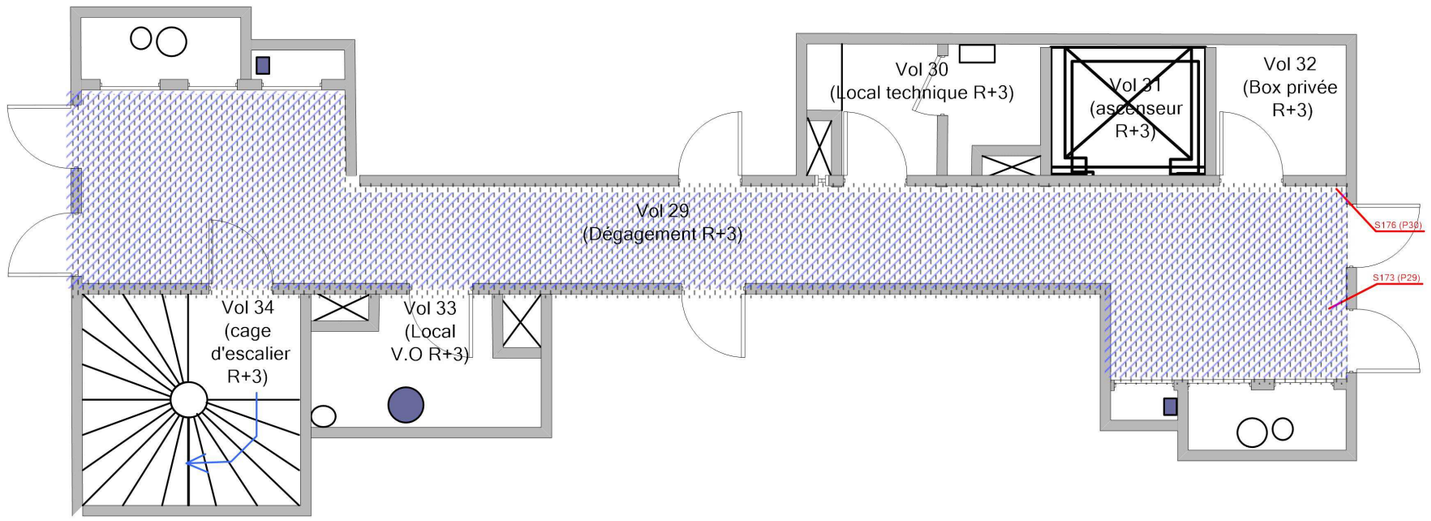

Légende

	P30 : Colle bitumeuses noire
	P29 : Dalles plastiques dures cassantes bleues

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

R+3 & R+4 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002OY000235

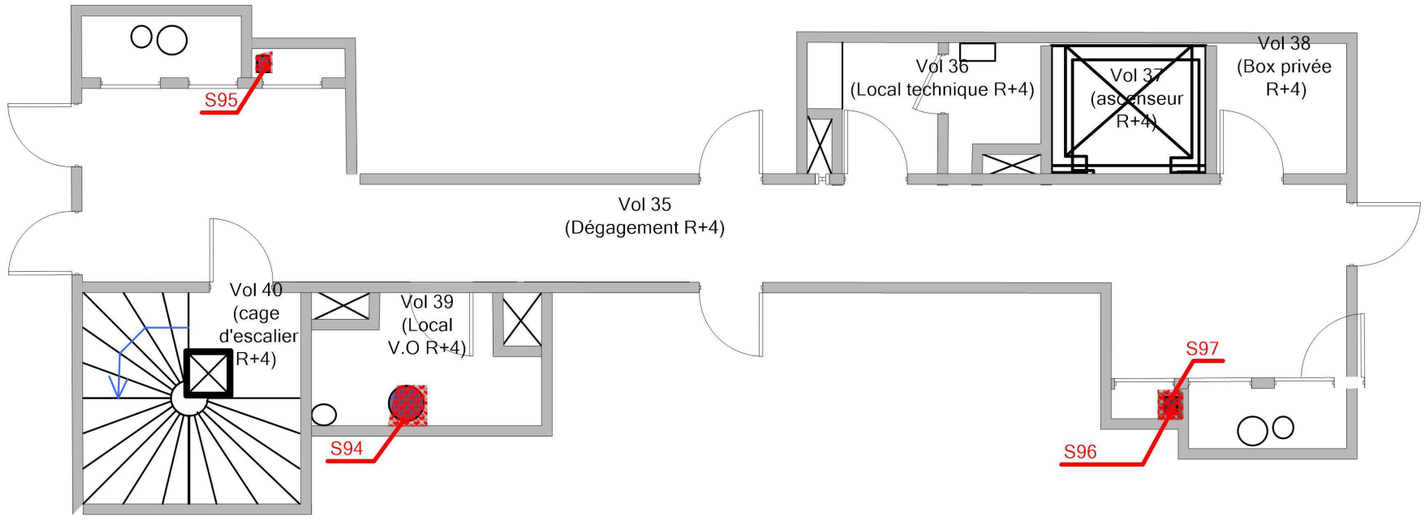

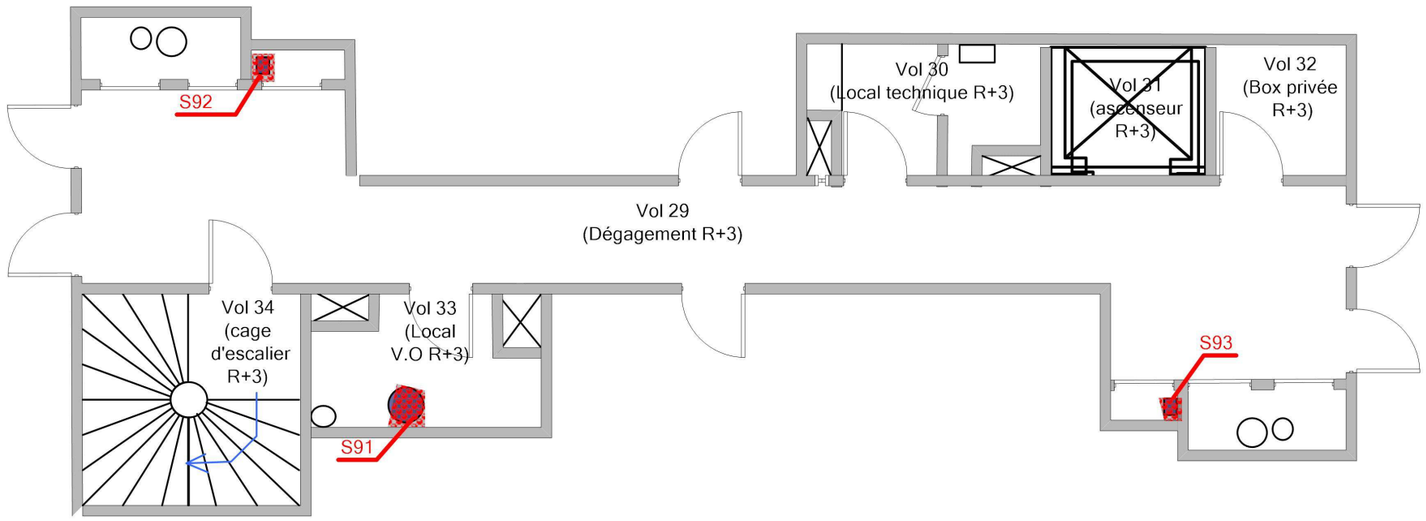

Légende

	S95: Conduit en fibres-ciment
	S94: Conduit en fibres-ciment
	S91: Conduit en fibres-ciment
	S96: Conduit en fibres-ciment
	S92: Conduit en fibres-ciment
	S93: Conduit en fibres-ciment
	S97: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

R+3 & R+4 - MPCA COFFRAGES PERDUS

Référence:
002OY000235

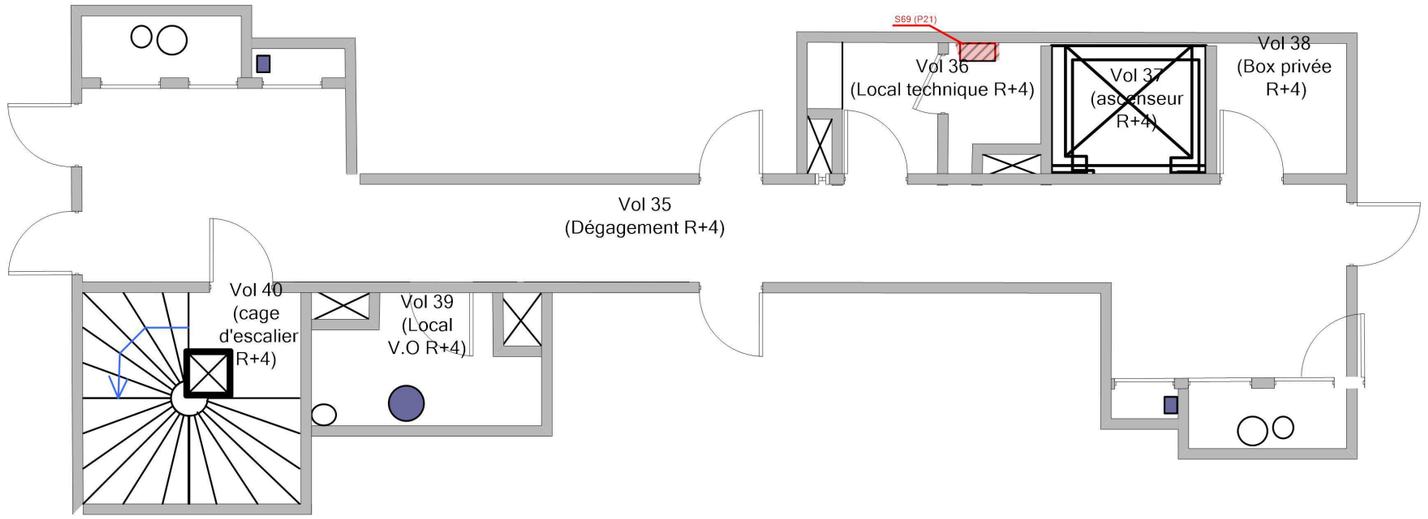

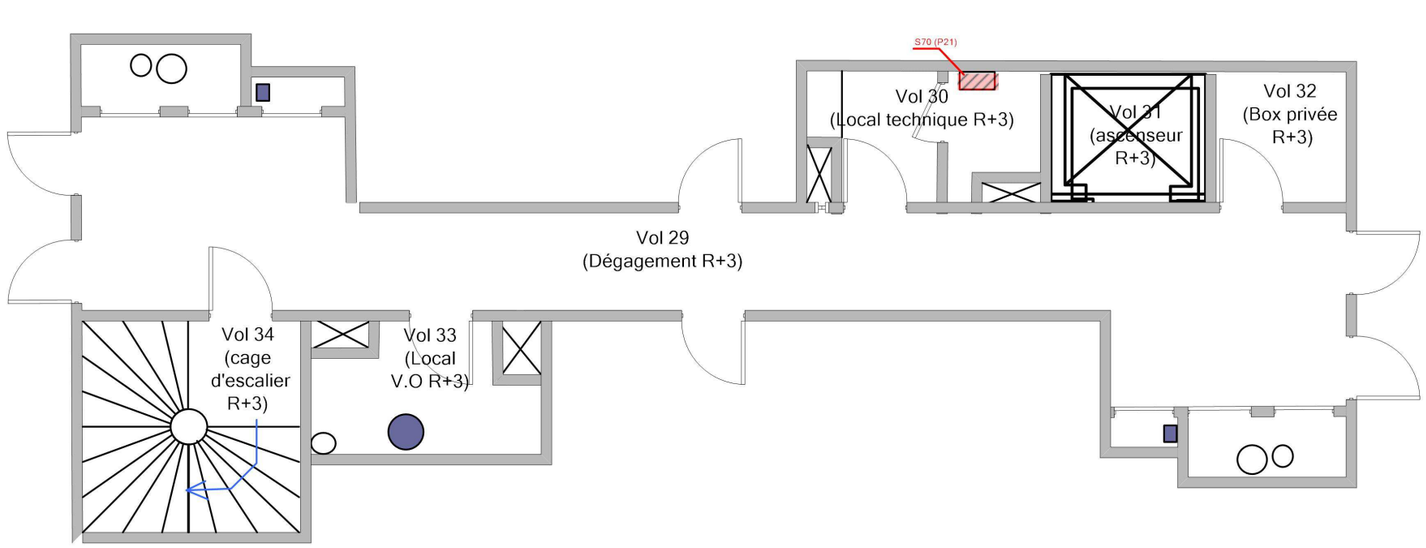

Légende

	P21 : plaque fibreuse sous plaque métallique

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

PLAN MASSE ET TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000235

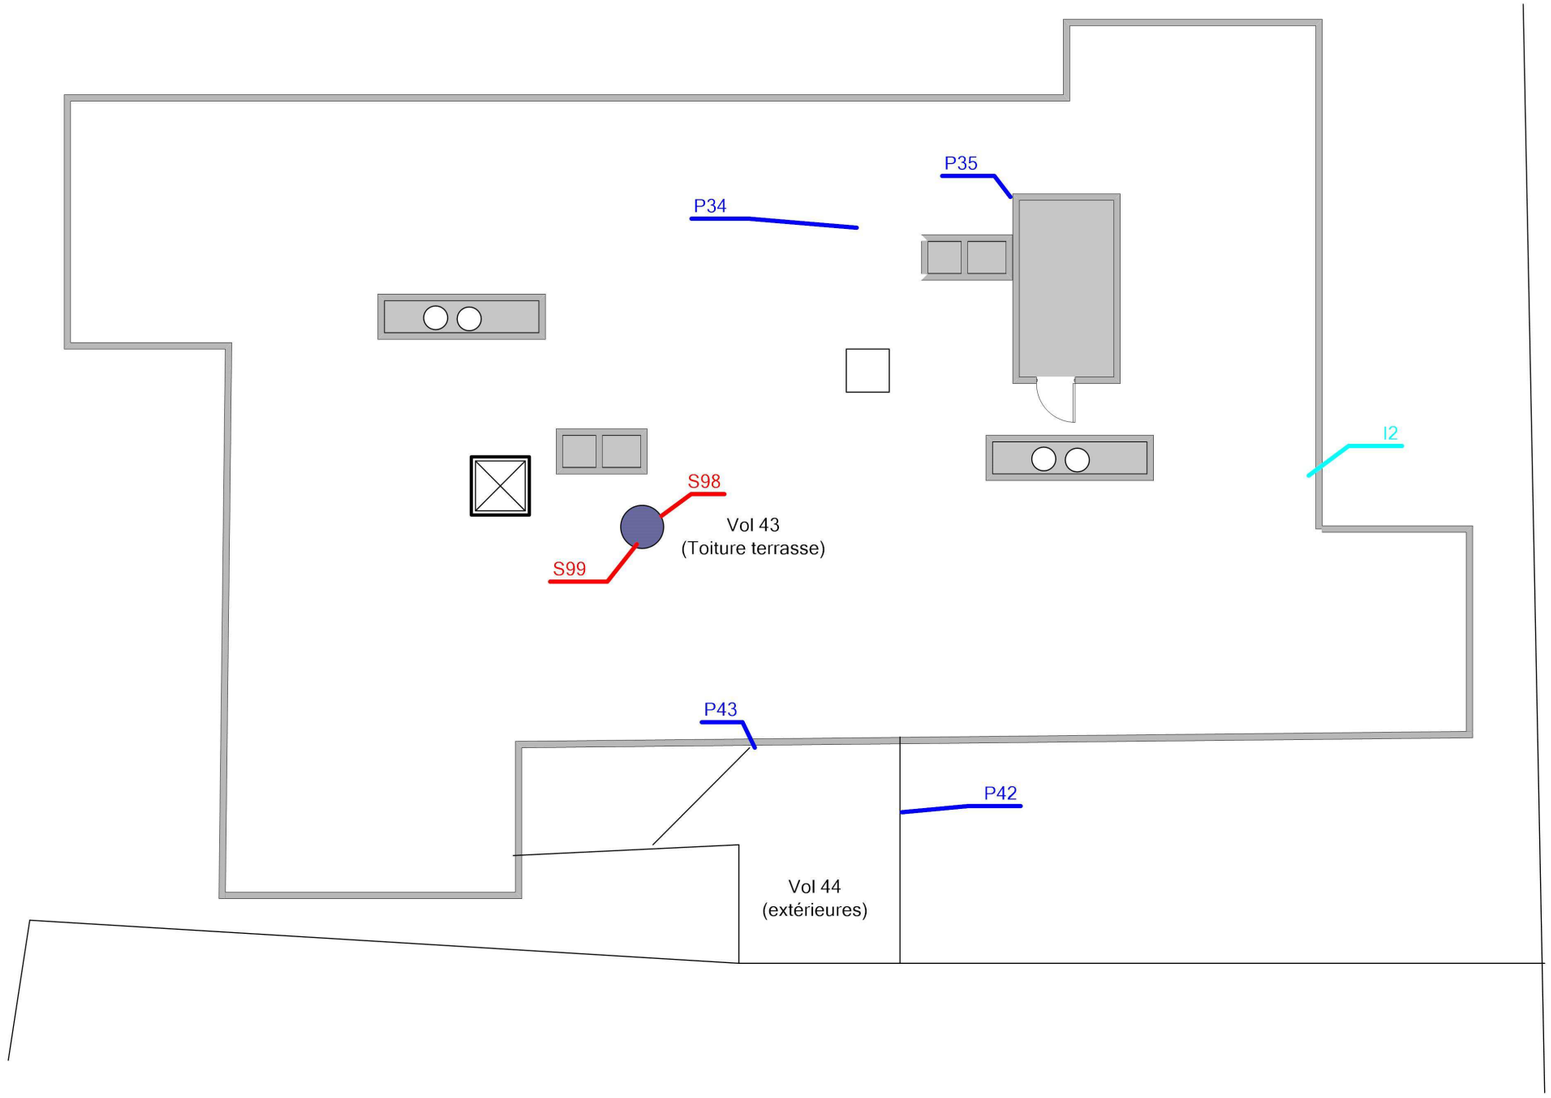

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

PLAN MASSE ET TOITURE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence: 002OY000235

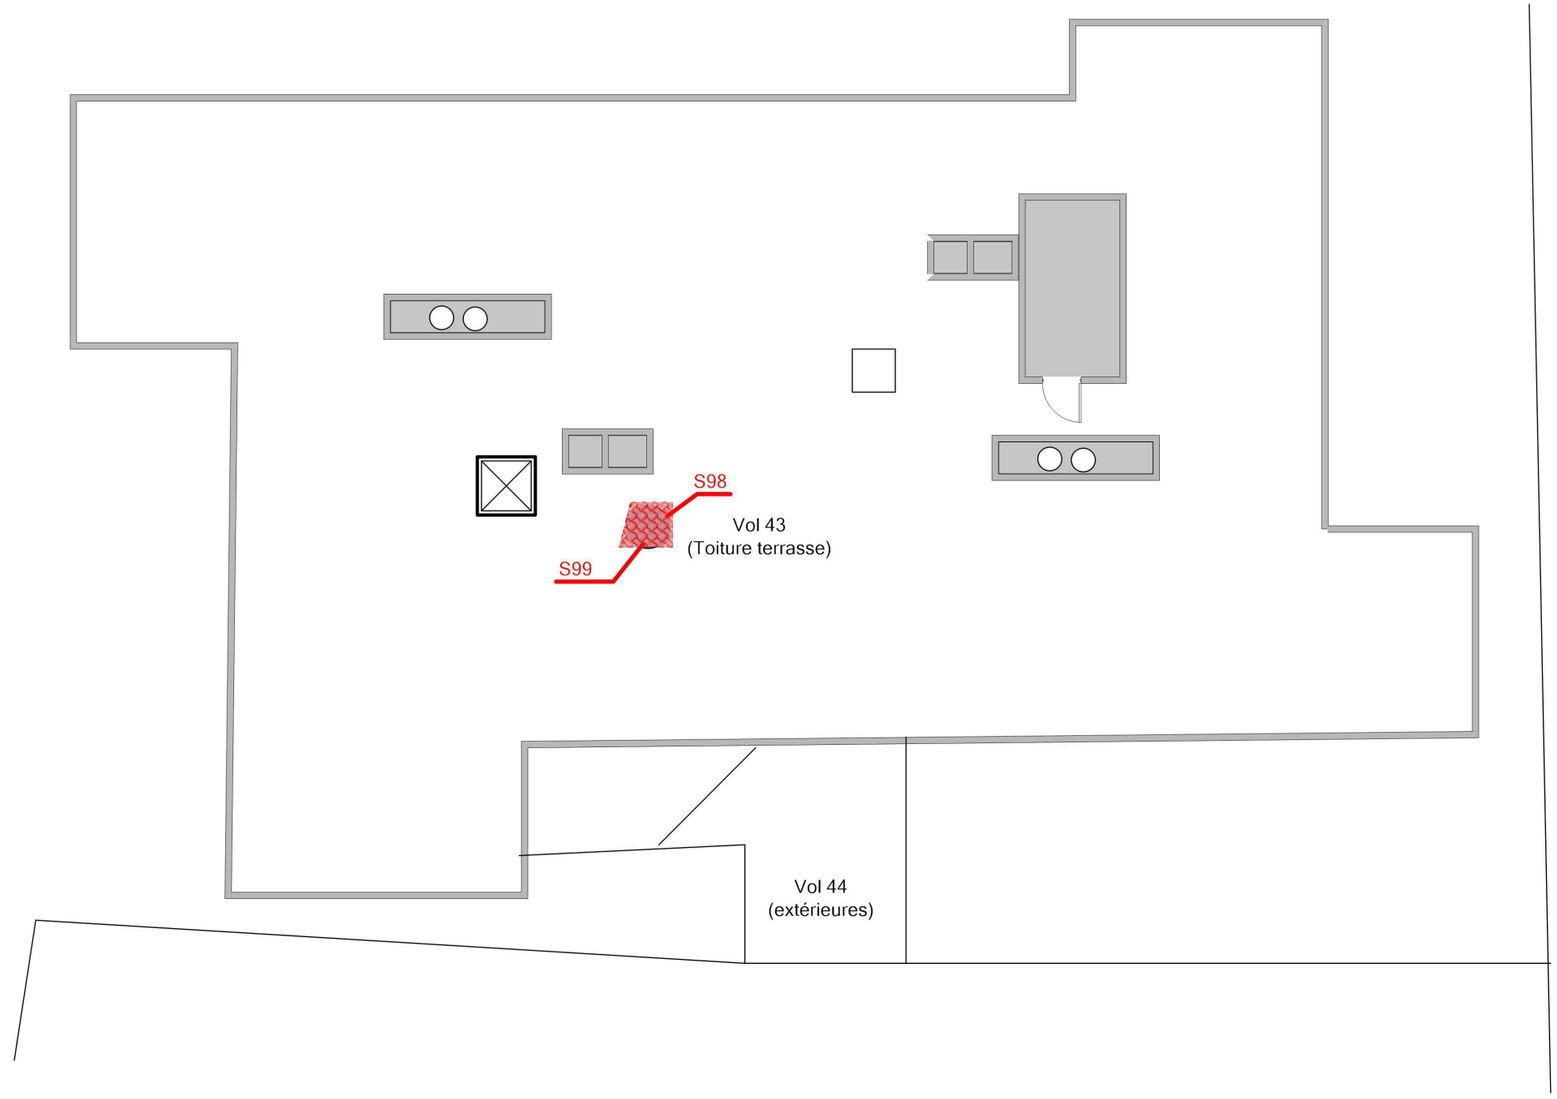

Légende

	S99: Mitron
	S98: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

PLAN MASSE ET TOITURE - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002OY000235

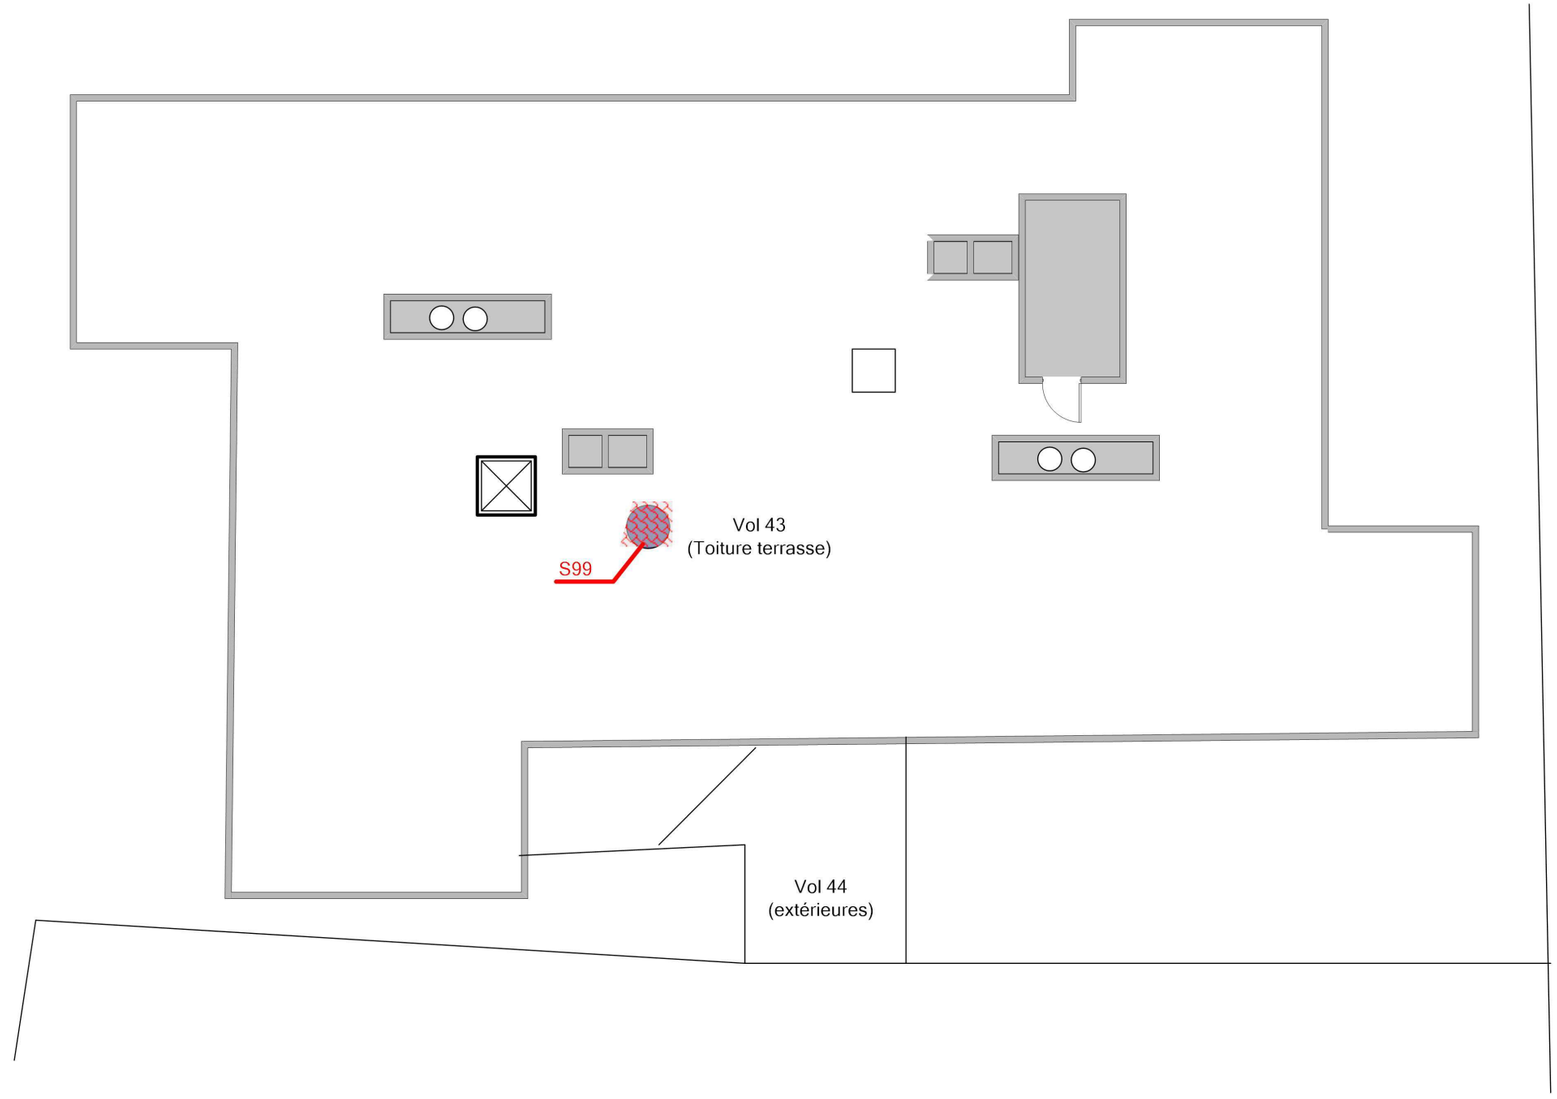

Légende

	S99: Mitron

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

PLAN MASSE ET TOITURE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence: 002OY000235

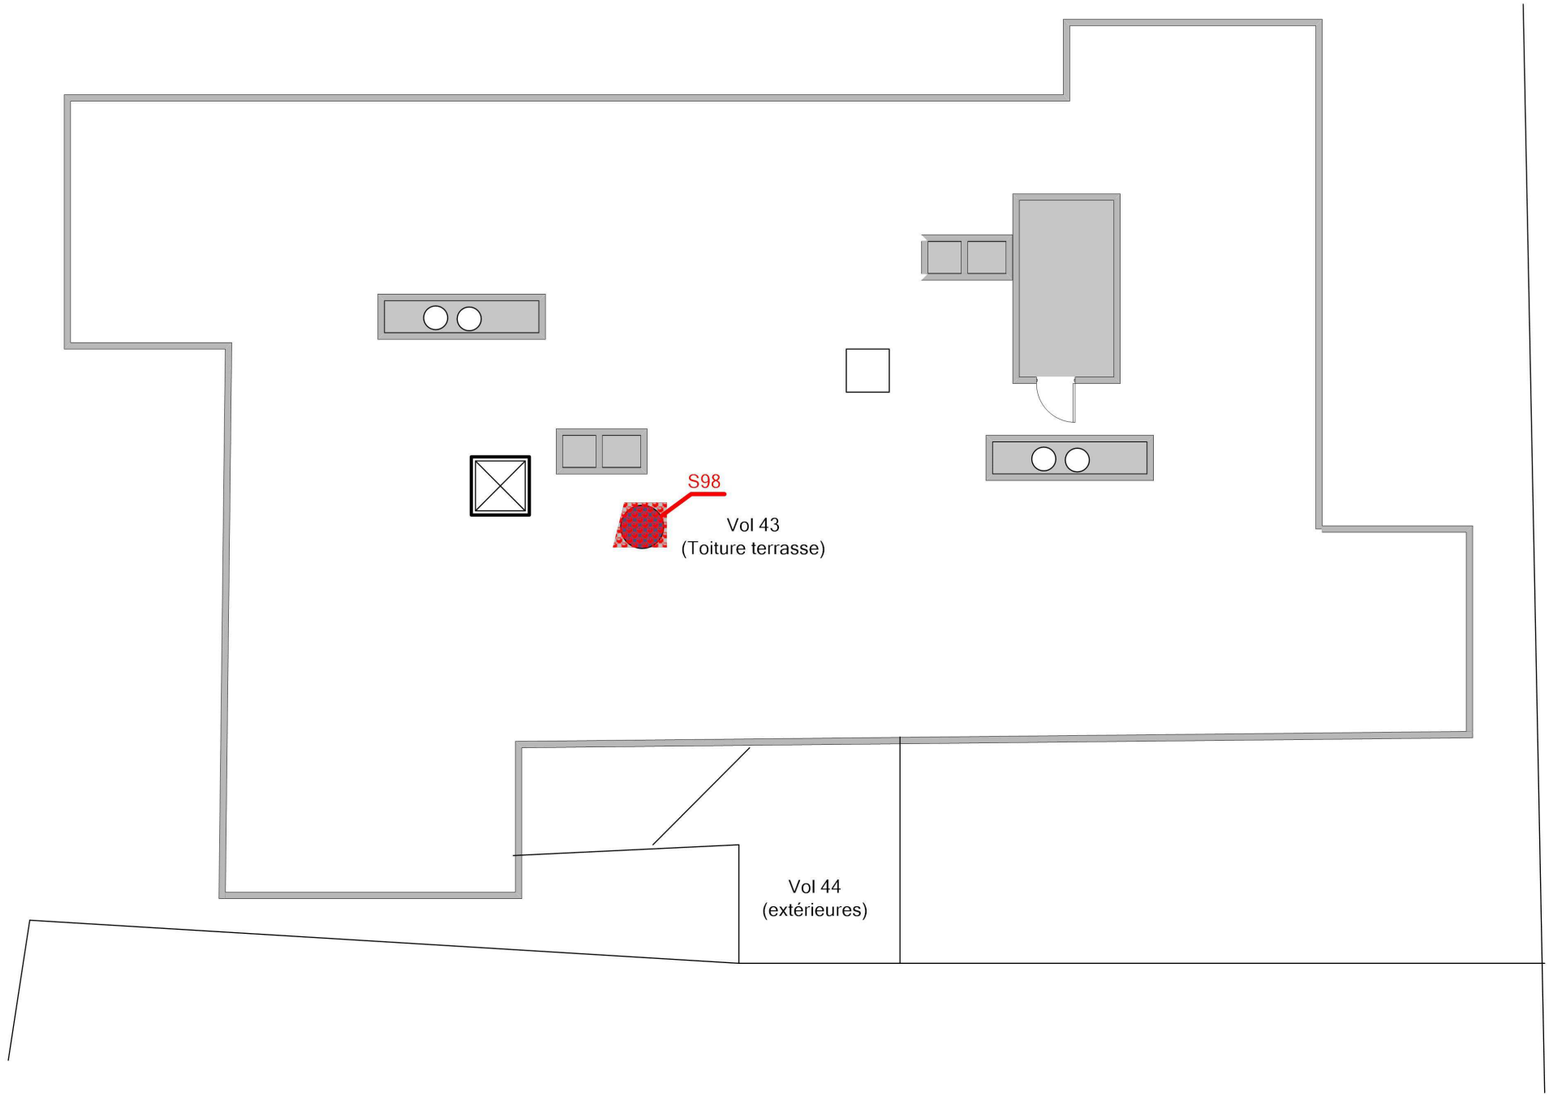

Légende

	S98: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

FAÇADE AVANT GAUCHE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000235

Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

FAÇADE AVANT DROITE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000235

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002OY000235

Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000235

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

MACHINERIE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000235

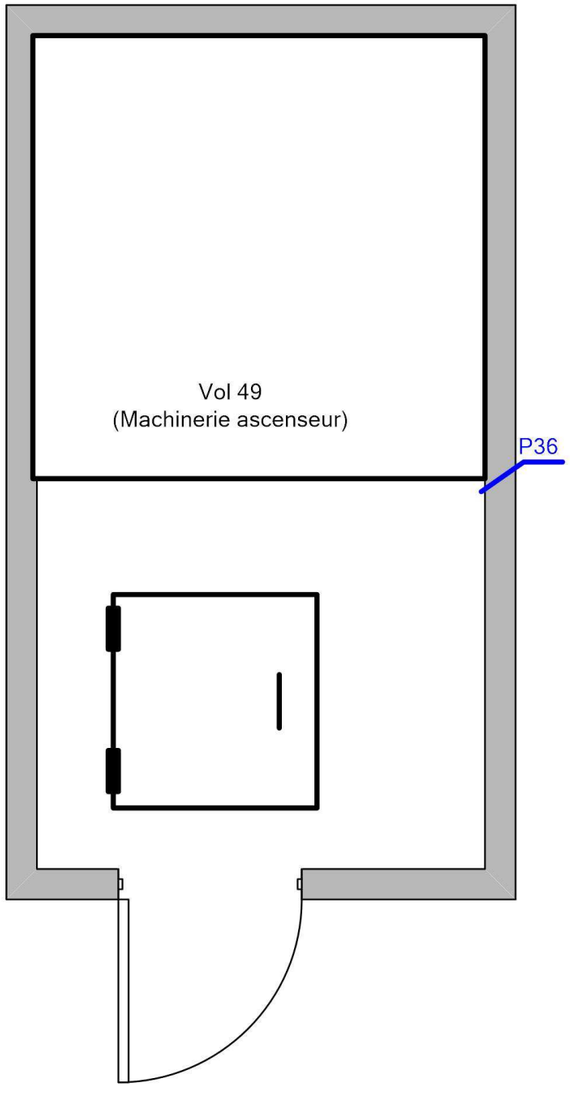

Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	09/11/2016	GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000235 n°38 - 1 (P38)	Façade avant droite - Vol 46 (Façade avant droite)	Prélevement négatif
002OY000235 n°38 - 2 (P38)	Façade avant droite - Vol 46 (Façade avant droite)	Prélevement négatif
S100 - 1 (A100)	Façade avant droite - Vol 46 (Façade avant droite)	Absence : pas d'amiante par nature
002OY000235 n°40 - 1 (P40)	Façade avant droite - Vol 46 (Façade avant droite)	Prélevement négatif
002OY000235 n°40 - 2 (P40)	Façade avant droite - Vol 46 (Façade avant droite)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000235 n°39 - 1 (P39)	Façade avant gauche - Vol 45 (Façade avant gauche)	Prélevement négatif
002OY000235 n°39 - 2 (P39)	Façade avant gauche - Vol 45 (Façade avant gauche)	Prélevement négatif
002OY000235 n°45 - 1 (P45)	Façade avant gauche - Vol 45 (Façade avant gauche)	Prélevement négatif
002OY000235 n°45 - 2 (P45)	Façade avant gauche - Vol 45 (Façade avant gauche)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000235 n°36 - 1 (P36)	machinerie - Vol 49 (Machinerie ascenseur)	Prélevement négatif
002OY000235 n°36 - 2 (P36)	machinerie - Vol 49 (Machinerie ascenseur)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000235 n°41 - 1 (P41)	pignon droit - Vol 47 (pignon droit)	Prélevement négatif
002OY000235 n°41 - 2 (P41)	pignon droit - Vol 47 (pignon droit)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000235 n°34 - 1 (P34)	Plan masse et toiture - Vol 43 (Toiture terrasse)	Prélevement négatif
002OY000235 n°34 - 2 (P34)	Plan masse et toiture - Vol 43 (Toiture terrasse)	Prélevement négatif
S98 - 1 (A98)	Plan masse et toiture - Vol 43 (Toiture terrasse)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S99 - 1 (A99)	Plan masse et toiture - Vol 43 (Toiture terrasse)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	Plan masse et toiture - Vol 43 (Toiture terrasse)	I2
002OY000235 n°35 - 1 (P35)	Plan masse et toiture - Vol 43 (Toiture terrasse)	Prélevement négatif
002OY000235 n°35 - 2 (P35)	Plan masse et toiture - Vol 43 (Toiture terrasse)	Prélevement négatif
002OY000235 n°42 - 1 (P42)	Plan masse et toiture - Vol 44 (extérieures)	Prélevement négatif
002OY000235 n°42 - 2 (P42)	Plan masse et toiture - Vol 44 (extérieures)	Prélevement négatif
002OY000235 n°43 - 1 (P43)	Plan masse et toiture - Vol 44 (extérieures)	Prélevement négatif
002OY000235 n°43 - 2 (P43)	Plan masse et toiture - Vol 44 (extérieures)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action

Référence	Localisation	Action
002OY000235 n°21 - 1 (P21)	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)	Prélevement positif
002OY000235 n°21 - 2 (P21)	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)	Prélevement positif
002OY000235 n°20 - 1 (P20)	R+1 & R+2 - Vol 27 (Local V.O R+1)	Prélevement négatif
002OY000235 n°20 - 2 (P20)	R+1 & R+2 - Vol 27 (Local V.O R+1)	Prélevement négatif
002OY000235 n°19 - 1 (P19)	R+1 & R+2 - Vol 18 (Local technique R+2)	Prélevement négatif
002OY000235 n°19 - 2 (P19)	R+1 & R+2 - Vol 18 (Local technique R+2)	Prélevement négatif
002OY000235 n°27 - 1 (P27)	R+1 & R+2 - Vol 28 (cage d'escalier R+1)	Prélevement négatif
002OY000235 n°27 - 2 (P27)	R+1 & R+2 - Vol 28 (cage d'escalier R+1)	Prélevement négatif
002OY000235 n°28 - 1 (P28)	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)	Prélevement négatif
002OY000235 n°28 - 2 (P28)	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)	Prélevement négatif
002OY000235 n°29 - 1 (P29)	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)	Prélevement positif
002OY000235 n°29 - 2 (P29)	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)	Prélevement positif
002OY000235 n°30 - 1 (P30)	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)	Prélevement positif
002OY000235 n°30 - 2 (P30)	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)	Prélevement positif
002OY000235 n°31 - 1 (P31)	R+1 & R+2 - Vol 21 (Local V.O R+2)	Prélevement négatif
002OY000235 n°31 - 2 (P31)	R+1 & R+2 - Vol 21 (Local V.O R+2)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
S84 - 1 (A84)	R+1 & R+2 - Vol 27 (Local V.O R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S85 - 1 (A85)	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S86 - 1 (A86)	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S88 - 1 (A88)	R+1 & R+2 - Vol 17 (Dégagement R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S89 - 1 (A89)	R+1 & R+2 - Vol 17 (Dégagement R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S90 - 1 (A90)	R+1 & R+2 - Vol 17 (Dégagement R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002OY000235 n°16 - 1 (P16)	R+3 & R+4 - Vol 30 (Local technique R+3)	Prélevement négatif
002OY000235 n°16 - 2 (P16)	R+3 & R+4 - Vol 30 (Local technique R+3)	Prélevement négatif
S91 - 1 (A91)	R+3 & R+4 - Vol 33 (Local V.O R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S92 - 1 (A92)	R+3 & R+4 - Vol 29 (Dégagement R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S93 - 1 (A93)	R+3 & R+4 - Vol 29 (Dégagement R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S93 - 2 (A93)	R+3 & R+4 - Vol 29 (Dégagement R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S94 - 1 (A94)	R+3 & R+4 - Vol 39 (Local V.O R+4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S95 - 1 (A95)	R+3 & R+4 - Vol 35 (Dégagement R+4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S96 - 1 (A96)	R+3 & R+4 - Vol 35 (Dégagement R+4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002OY000235 n°32 - 1 (P32)	R+3 & R+4 - Vol 35 (Dégagement R+4)	Prélevement négatif
002OY000235 n°32 - 2 (P32)	R+3 & R+4 - Vol 35 (Dégagement R+4)	Prélevement négatif
002OY000235 n°33 - 1 (P33)	R+3 & R+4 - Vol 40 (cage d'escalier R+4)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000235 n°33 - 2 (P33)	R+3 & R+4 - Vol 40 (cage d'escalier R+4)	Prélevement négatif
S97 - 1 (A97)	R+3 & R+4 - Vol 35 (Dégagement R+4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002OY000235 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 13 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°8 - 2 (P8)	RDC - Vol 13 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°9 - 2 (P9)	RDC - Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°10 - 2 (P10)	RDC - Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°11 - 2 (P11)	RDC - Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 13 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°12 - 2 (P12)	RDC - Vol 13 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 14 (Local technique RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°15 - 2 (P15)	RDC - Vol 14 (Local technique RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 13 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°14 - 2 (P14)	RDC - Vol 13 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 13 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°18 - 2 (P18)	RDC - Vol 13 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°13 - 2 (P13)	RDC - Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 11 (Local poubelle)	Prélevement négatif
002OY000235 n°17 - 2 (P17)	RDC - Vol 11 (Local poubelle)	Prélevement négatif
002OY000235 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000235 n°22 - 2 (P22)	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°23 - 2 (P23)	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°24 - 1 (P24)	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°24 - 2 (P24)	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000235 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°25 - 2 (P25)	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°26 - 2 (P26)	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
S83 - 1 (A83)	RDC - Vol 11 (Local poubelle)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002OY000235 n°37 - 1 (P37)	RDC - Vol 9 (SAS d'entrée RDC)	Prélevement négatif
002OY000235 n°37 - 2 (P37)	RDC - Vol 9 (SAS d'entrée RDC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000235 n°1 - 1 (P1)	SOUS-SOL - Vol 3 (Accès caves)	Prélevement négatif
002OY000235 n°1 - 2 (P1)	SOUS-SOL - Vol 3 (Accès caves)	Prélevement négatif
002OY000235 n°2 - 1 (P2)	SOUS-SOL - Vol 3 (Accès caves)	Prélevement négatif
002OY000235 n°2 - 2 (P2)	SOUS-SOL - Vol 3 (Accès caves)	Prélevement négatif
002OY000235 n°3 - 1 (P3)	SOUS-SOL - Vol 5 (Accès sous-sol)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000235 n°3 - 2 (P3)	SOUS-SOL - Vol 5 (Accès sous-sol)	Prélevement négatif
002OY000235 n°4 - 1 (P4)	SOUS-SOL - Vol 3 (Accès caves)	Prélevement négatif
002OY000235 n°4 - 2 (P4)	SOUS-SOL - Vol 3 (Accès caves)	Prélevement négatif
002OY000235 n°5 - 1 (P5)	SOUS-SOL - Vol 2 (Local à velo)	Prélevement négatif
002OY000235 n°5 - 2 (P5)	SOUS-SOL - Vol 2 (Local à velo)	Prélevement négatif
002OY000235 n°6 - 1 (P6)	SOUS-SOL - Vol 3 (Accès caves)	Prélevement négatif
002OY000235 n°6 - 2 (P6)	SOUS-SOL - Vol 3 (Accès caves)	Prélevement négatif
002OY000235 n°7 - 1 (P7)	SOUS-SOL - Vol 5 (Accès sous-sol)	Prélevement négatif
002OY000235 n°7 - 2 (P7)	SOUS-SOL - Vol 5 (Accès sous-sol)	Prélevement négatif
002OY000235 n°44 - 1 (P44)	SOUS-SOL - Vol 1 (Rampe accès sous-sol)	Prélevement négatif
002OY000235 n°44 - 2 (P44)	SOUS-SOL - Vol 1 (Rampe accès sous-sol)	Prélevement négatif

002OY000235 n°1 - 1 (P1)

002OY000235 n°1 - 2 (P1)

002OY000235 n°2 - 1 (P2)

002OY000235 n°2 - 2 (P2)

002OY000235 n°3 - 1 (P3)

002OY000235 n°3 - 2 (P3)

002OY000235 n°4 - 1 (P4)

002OY000235 n°4 - 2 (P4)

002OY000235 n°5 - 1 (P5)

002OY000235 n°5 - 2 (P5)

002OY000235 n°6 - 1 (P6)

002OY000235 n°6 - 2 (P6)

002OY000235 n°7 - 1 (P7)

002OY000235 n°7 - 2 (P7)

002OY000235 n°8 - 1 (P8)

002OY000235 n°8 - 2 (P8)

002OY000235 n°9 - 1 (P9)

002OY000235 n°9 - 2 (P9)

002OY000235 n°10 - 1 (P10)

002OY000235 n°10 - 2 (P10)

002OY000235 n°11 - 1 (P11)

002OY000235 n°11 - 2 (P11)

002OY000235 n°12 - 1 (P12)

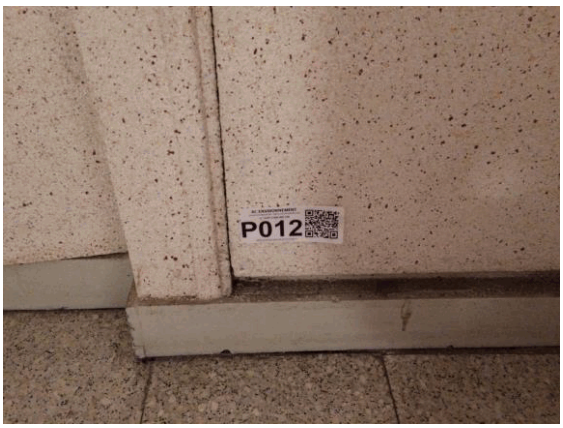

002OY000235 n°12 - 2 (P12)

002OY000235 n°15 - 1 (P15)

002OY000235 n°15 - 2 (P15)

002OY000235 n°14 - 1 (P14)

002OY000235 n°14 - 2 (P14)

002OY000235 n°18 - 1 (P18)

002OY000235 n°18 - 2 (P18)

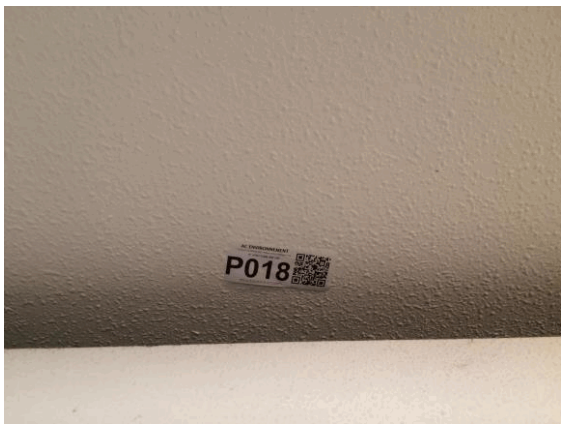

002OY000235 n°13 - 1 (P13)

002OY000235 n°13 - 2 (P13)

002OY000235 n°17 - 1 (P17)

002OY000235 n°17 - 2 (P17)

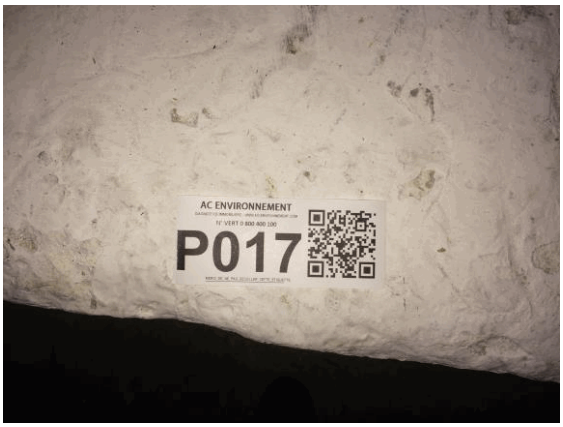

002OY000235 n°22 - 1 (P22)

002OY000235 n°22 - 2 (P22)

002OY000235 n°21 - 1 (P21)

002OY000235 n°21 - 2 (P21)

002OY000235 n°20 - 1 (P20)

002OY000235 n°20 - 2 (P20)

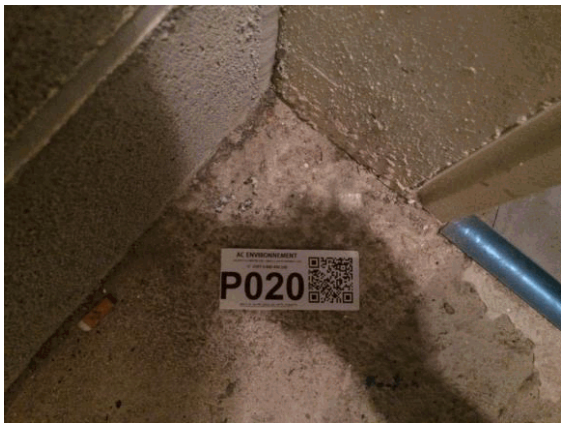

002OY000235 n°19 - 1 (P19)

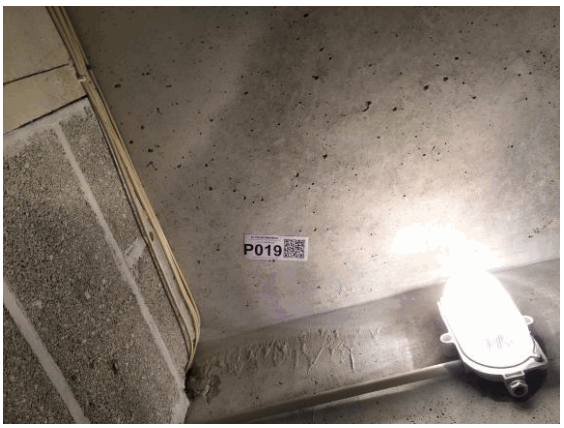

002OY000235 n°19 - 2 (P19)

002OY000235 n°23 - 1 (P23)

002OY000235 n°23 - 2 (P23)

002OY000235 n°24 - 1 (P24)

002OY000235 n°24 - 2 (P24)

002OY000235 n°25 - 1 (P25)

002OY000235 n°25 - 2 (P25)

002OY000235 n°26 - 1 (P26)

002OY000235 n°26 - 2 (P26)

002OY000235 n°27 - 1 (P27)

002OY000235 n°27 - 2 (P27)

002OY000235 n°28 - 1 (P28)

002OY000235 n°28 - 2 (P28)

002OY000235 n°29 - 1 (P29)

002OY000235 n°29 - 2 (P29)

002OY000235 n°30 - 1 (P30)

002OY000235 n°30 - 2 (P30)

002OY000235 n°16 - 1 (P16)

002OY000235 n°16 - 2 (P16)

002OY000235 n°31 - 1 (P31)

002OY000235 n°31 - 2 (P31)

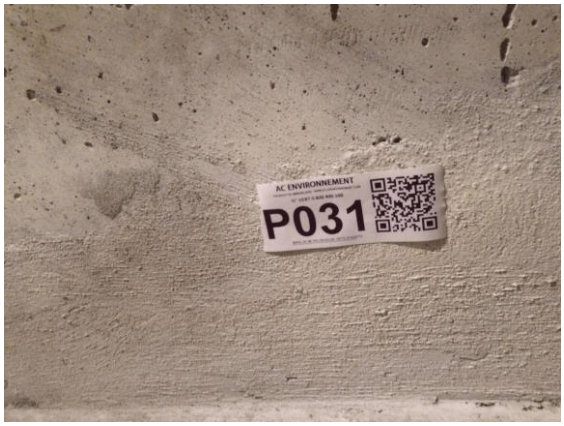

S84 - 1 (A84)

S85 - 1 (A85)

S86 - 1 (A86)

S83 - 1 (A83)

S88 - 1 (A88)

S89 - 1 (A89)

S90 - 1 (A90)

S91 - 1 (A91)

S92 - 1 (A92)

S93 - 1 (A93)

S93 - 2 (A93)

S94 - 1 (A94)

S95 - 1 (A95)

S96 - 1 (A96)

002OY000235 n°32 - 1 (P32)

002OY000235 n°32 - 2 (P32)

002OY000235 n°33 - 1 (P33)

002OY000235 n°33 - 2 (P33)

S97 - 1 (A97)

002OY000235 n°34 - 1 (P34)

002OY000235 n°34 - 2 (P34)

S98 - 1 (A98)

S99 - 1 (A99)

I2 - 1

002OY000235 n°35 - 1 (P35)

002OY000235 n°35 - 2 (P35)

002OY000235 n°36 - 1 (P36)

002OY000235 n°36 - 2 (P36)

002OY000235 n°37 - 1 (P37)

002OY000235 n°37 - 2 (P37)

002OY000235 n°38 - 1 (P38)

002OY000235 n°38 - 2 (P38)

002OY000235 n°39 - 1 (P39)

002OY000235 n°39 - 2 (P39)

S100 - 1 (A100)

002OY000235 n°40 - 1 (P40)

002OY000235 n°40 - 2 (P40)

002OY000235 n°42 - 1 (P42)

002OY000235 n°42 - 2 (P42)

002OY000235 n°43 - 1 (P43)

002OY000235 n°43 - 2 (P43)

002OY000235 n°45 - 1 (P45)

002OY000235 n°45 - 2 (P45)

002OY000235 n°41 - 1 (P41)

002OY000235 n°41 - 2 (P41)

002OY000235 n°44 - 1 (P44)

002OY000235 n°44 - 2 (P44)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable - joints de scellement des parpaings -	SOUS-SOL - Vol 3 (Accès caves)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + peinture en faible quantité non séparable - enduits de débullage béton banché -	SOUS-SOL - Vol 3 (Accès caves)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - béton lissé -	SOUS-SOL - Vol 5 (Accès sous-sol)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable - plafond brut sous panneaux de fibralith -	SOUS-SOL - Vol 3 (Accès caves)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - gris -	SOUS-SOL - Vol 2 (Local à velo)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable - -	SOUS-SOL - Vol 3 (Accès caves)	
P7	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau bitumineux noir avec poussières - bitumineux noir -	SOUS-SOL - Vol 5 (Accès sous-sol)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - gaines techniques gaz -	RDC - Vol 13 (Dégagement RDC)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable - doublage placoplatre -	RDC - Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable - plafonds placoplatre -	RDC - Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - sur mur dernière la peinture décoratives -	RDC - Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - blanches pailleté rouge/jaune -	RDC - Vol 13 (Dégagement RDC)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac avec poussières - marbré beige -	RDC - Vol 10 (Hall d'entrée RDC)	

P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + joint cassant blanc avec poussières non séparable - marbré beige -	RDC - Vol 13 (Dégagement RDC)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - de lissage locaux techniques -	RDC - Vol 14 (Local technique RDC)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène avec poussières + peinture en faible quantité non séparable - coffre béton préfabriqué -	R+3 & R+4 - Vol 30 (Local technique R+3)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact blanc en vrac avec poussières - coffrage recouverts d'enduit platre -	RDC - Vol 11 (Local poubelle)	
P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - enduits gouttelé sur plafonds droits -	RDC - Vol 13 (Dégagement RDC)	
P19	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène - des locaux techniques -	R+1 & R+2 - Vol 18 (Local technique R+2)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + peinture - des locaux techniques -	R+1 & R+2 - Vol 27 (Local V.O R+1)	
P21	Coffrages perdus	Fond de coffrage	Matériau fibreux blanc en vrac avec fibres visibles - au sol des gaines électrique -	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)	
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - gouttelette de la cage d'escaliers +peinture verte cloisons -	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples - Enduit autour poteaux rond = peinture gouttelé verte claire -	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	

P24 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène - Enduit platre et enduit ciment + peinture gouttelé blanche sous face escalier -	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	
P24 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples - Enduit platre et enduit ciment + peinture gouttelé blanche sous face escalier -	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples - Enduit ciment -	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable - Sous linoléum marron (cages d'escalier) -	RDC - Vol 12 (cage d'escalier RDC)	
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris - linoléum marrons +colle jaune -	R+1 & R+2 - Vol 28 (cage d'escalier R+1)	
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - gris d'origine sous dalles plastiques -	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)	
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante bleue avec poussières - Grise marbré -	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)	

P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable - noire sous dalles plastiques -	R+1 & R+2 - Vol 23 (Dégagement R+1)	
P31	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable - rebouchage conduits des locaux techniques -	R+1 & R+2 - Vol 21 (Local V.O R+2)	
P32	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - enduits gouttelé sur plafonds dernier étage -	R+3 & R+4 - Vol 35 (Dégagement R+4)	
P33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau en faible quantité non séparable + peinture non séparable - enduits lissés cage d'escalier plafond dernier étage -	R+3 & R+4 - Vol 40 (cage d'escalier R+4)	
P34	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable - -	Plan masse et toiture - Vol 43 (Toiture terrasse)	
P35	Façades	Murs	Enduit compact gris + peinture avec poussières - conduits cheminée +peintures grises -	Plan masse et toiture - Vol 43 (Toiture terrasse)	
P36	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable - lissés machinerie -	machinerie - Vol 49 (Machinerie ascenseur)	
P37	Façades	Murs	Enduit compact gris + peintures multiples - Gris + peinture épaisse bleu -	RDC - Vol 9 (SAS d'entrée RDC)	
P38	Façades	Bardages	Mousse grise + peinture - souple gris -	Façade avant droite - Vol 46 (Façade avant droite)	
P39	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable - Entre menuiserie et façade / entre couvertine et façade -	Façade avant gauche - Vol 45 (Façade avant gauche)	
P40	Façades	Bardages	Colle grise + matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable - -	Façade avant droite - Vol 46 (Façade avant droite)	
P41	Façades	Murs	Enduit compact gris + peintures multiples - Enduit soubassement -	pignon droit - Vol 47 (pignon droit)	
P42	Voies et réseaux divers	bordures	Matériau compact gris hétérogène - -	Plan masse et toiture - Vol 44 (extérieures)	

P43	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 - -	Plan masse et toiture - Vol 44 (extérieures)	
P44	Façades	Murs	Enduit compact gris + peinture avec poussières - murs d'accès sous-sol -	SOUS-SOL - Vol 1 (Rampe accès sous-sol)	
P45 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris - -	Façade avant gauche - Vol 45 (Façade avant gauche)	
P45 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples avec poussières - -	Façade avant gauche - Vol 45 (Façade avant gauche)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1629 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1629
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (Accès caves)

Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 04/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1630 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1630
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (Accès caves)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture en faible quantité non séparable	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1631 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1631
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 5 (Accès sous-sol)

Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META le 04/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1632 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1632
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 3 (Accès caves)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1633 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1633
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 2 (Local à velo)

Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1634 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1634
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235006 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise de scellements des portes / Vol 3 (Accès caves)

Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	META le 04/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1635 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1635
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235007 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage / Vol 5 (Accès sous-sol)

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau bitumineux noir avec poussières	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1636 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1636
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 13 (Dégagement RDC)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 04/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1637 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1637
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 10 (Hall d'entrée RDC)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	META le 04/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1638 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1638
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235010 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 10 (Hall d'entrée RDC)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Matériau beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	META le 04/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1639 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1639
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 10 (Hall d'entrée RDC)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1640 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1640
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 13 (Dégagement RDC)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 04/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1641 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1641
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 10 (Hall d'entrée RDC)

Description ITGA	Colle beige en vrac avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige en vrac avec poussières	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1642 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1642
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 13 (Dégagement RDC)

Description ITGA	Colle grise / Joint cassant blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + joint cassant blanc avec poussières non séparable	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1643 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1643
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 14 (Local technique RDC)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1644 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1644
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 30 (Local technique R+3)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène avec poussières / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1645 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1645
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 11 (Local poubelle)

Description ITGA	Enduit compact blanc en vrac avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact blanc en vrac avec poussières	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1646 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1646
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235018 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 13 (Dégagement RDC)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 04/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1647 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1647
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235019 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 18 (Local technique R+2)

Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène	META le 04/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1648 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1648
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 27 (Local V.O R+1)

Description ITGA	Matériau compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris + peinture	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1649 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1649
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235021 / Coffrages perdus / Fond de coffrage / plaque fibreuse sous plaque métallique / Vol 23 (Dégagement R+1)

Description ITGA	Matériau fibreux blanc en vrac avec fibres visibles

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux blanc en vrac avec fibres visibles	MOLP le 05/01/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1650 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1650
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235022 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 12 (cage d'escalier RDC)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 04/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1651 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1651
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 12(cage d'escalier RDC)

Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples	META le 04/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1652 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1652
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235024 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 12 (cage d'escalier RDC)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1
Peintures multiples	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1653 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1653
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235025 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / marche escalier / Vol 12 (cage d'escalier RDC)

Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1654 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1654
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235026 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 12 (cage d'escalier RDC)

Description ITGA	Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1655 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1655
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235027 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 28 (cage d'escalier R+1)

Description ITGA	Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1656 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1656
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235028 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 23 (Dégagement R+1)

Description ITGA	Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1657 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1657
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235029 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 23 (Dégagement R+1)

Description ITGA	Dalle dure cassante bleue avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante bleue avec poussières	META le 05/01/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1658 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1658
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235030 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses / Vol 23 (Dégagement R+1)

Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 05/01/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1659 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1659
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235031 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 21 (Local V.O R+2)

Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 04/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1660 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1660
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235032 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 35 (Dégagement R+4)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1661 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1661
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235033 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 40 (cage d'escalier R+4)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau en faible quantité / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1662 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1662
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235034 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / joint d'étanchéité circuit V.M.C / Vol 43 (Toiture terrasse)

Description ITGA	Matériau souple noir / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1663 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1663
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235035 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 43 (Toiture terrasse)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture avec poussières	META le 04/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1664 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1664
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235036 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 49 (Machinerie ascenseur)

Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1665 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1665
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235037 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 9 (SAS d'entrée RDC)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peintures multiples	META le 04/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1666 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1666
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235038 / Façades / Bardages / joints entre élément préfa / Vol 46 (Façade avant droite)

Description ITGA	Mousse grise / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Mousse grise + peinture	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1667 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1667
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235039 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté / Vol 45 (Façade avant gauche)

Description ITGA	Matériau souple blanc / Matériau gris en faible quantité / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1668 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1668
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235040 / Façades / Bardages / colle de faience présente sous la peinture plastique beige / Vol 46 (Façade avant droite)

Description ITGA	Colle grise / Matériau beige en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1669 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1669
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235041 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 47 (pignon droit)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peintures multiples	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1670 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1670
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235042 / Voies et réseaux divers / bordures / joint d'assemblage des bordures / Vol 44 (extérieures)

Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1671 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1671
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235043 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Ensemble Bitume couche supérieure (autour batiment) / Vol 44 (extérieures)

Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1672 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1672
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235044 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 1 (Rampe accès sous-sol)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture avec poussières	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-1673 EN DATE DU 06/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-249
Echantillon ITGA : IT071701-1673
Reçu au laboratoire le : 02/01/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000235
Dossier client	_0015600005_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002OY000235045 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 45 (Façade avant gauche)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1
Peintures multiples avec poussières	META le 05/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
