Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LE GRD BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_0032600011_
Date du repérage :	28/06/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Présence d'amiante	Oui
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_0032600011_
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

AC Environnement
Diagnostics Immobiliers

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	L.GARDENAT (0 800 400 100)
Date de repérage	28/06/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2
Délivré le : 03/04/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 26/07/2016
A Riorges, le 26/07/2016

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

RDC 27 A.RALU - Vol 1 (SAS ext)
RDC 27 A.RALU - Vol 2 (accès lgt RDC)
RDC 27 A.RALU - Vol 3 (GT)
RDC 27 A.RALU - Vol 4 (VO)
RDC 27 A.RALU - Vol 5 (DGT)
RDC 27 A.RALU - Vol 6 (local vélo)
Etage 27 A.RALU - Vol 7 (accès lgt R+1)
Etage 27 A.RALU - Vol 8 (GT R+1)
Etage 27 A.RALU - Vol 9 (VO R+1)
Etage 27 A.RALU - Vol 10 (accès lgt R+2)
Etage 27 A.RALU - Vol 11 (GT R+2)
Etage 27 A.RALU - Vol 12 (VO R+2)
Etage 27 A.RALU - Vol 13 (accès lgt R+3)
Etage 27 A.RALU - Vol 14 (GT R+3)
Etage 27 A.RALU - Vol 15 (VO R+3)
RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)
RDC 27 A.RALU - Vol 17 (SAS ext)
RDC 15 J-B COLBERT - Vol 18 (SAS ext)
RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)
RDC 15 J-B COLBERT - Vol 21 (VO)
RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22 (accès cave RDC)
Etage 15 J-B COLBERT - Vol 23 (GT R+1)
Etage 15 J-B COLBERT - Vol 24 (VO R+1)
Etage 15 J-B COLBERT - Vol 25 (accès lgt R+1)
Etage 15 J-B COLBERT - Vol 26 (GT R+2)
Etage 15 J-B COLBERT - Vol 27 (VO R+2)
Etage 15 J-B COLBERT - Vol 28 (accès lgt R+2)
Etage 15 J-B COLBERT - Vol 29 (GT R+3)
Etage 15 J-B COLBERT - Vol 30 (VO R+3)
Etage 15 J-B COLBERT - Vol 31 (accès lgt R+3)
Etage 15 J-B COLBERT - Vol 32 (accès cave R+3)
RDC 15 J-B COLBERT - Vol 33 (SAS ext)
Façade n°1 - Vol 34 (Façade n°1)
Façade n°2 - Vol 35 (Façade n°2)
Façade n°3 - Vol 36 (Façade n°3)
Façade n°4 - Vol 37 (Façade n°4)
Façade n°5 - Vol 38 (Façade n°5)
Toiture - Vol 39 (toiture)
Combles 27 A.RALU - Vol 40 (combles VMC)
Combles 27 A.RALU - Vol 41 (combles innaccessible)
Plan masse - Vol 42 (Plan de masse)

AC Environnement
Diagnostics Immobiliers

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Façades	RDC 27 A.RALU	Vol 1 (SAS ext) - Vol 17 (SAS ext)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC) - Vol 3 (GT) - Vol 4 (VO) - Vol 5 (DGT) - Vol 6 (local vélo)	
Plafond et faux-plafonds	RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC) - Vol 3 (GT) - Vol 4 (VO) - Vol 5 (DGT) - Vol 6 (local vélo)	
Revêtement de mur	RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC)	
Revêtement de sol	RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC) - Vol 3 (GT) - Vol 4 (VO) - Vol 5 (DGT) - Vol 6 (local vélo)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC 27 A.RALU	Vol 4 (VO)	
Parois verticales intérieures et enduits	Etage 27 A.RALU	Vol 7 (accès lgt R+1) - Vol 8 (GT R+1) - Vol 9 (VO R+1) - Vol 10 (accès lgt R+2) - Vol 11 (GT R+2) - Vol 12 (VO R+2) - Vol 13 (accès lgt R+3) - Vol 14 (GT R+3) - Vol 15 (VO R+3)	

Plafond et faux-plafonds	Etage 27 A.RALU	Vol 7 (accès lgt R+1) - Vol 8 (GT R+1) - Vol 9 (VO R+1) - Vol 10 (accès lgt R+2) - Vol 11 (GT R+2) - Vol 12 (VO R+2) - Vol 13 (accès lgt R+3) - Vol 14 (GT R+3) - Vol 15 (VO R+3)	
Revêtement de sol	Etage 27 A.RALU	Vol 7 (accès lgt R+1) - Vol 8 (GT R+1) - Vol 9 (VO R+1) - Vol 11 (GT R+2) - Vol 14 (GT R+3)	
Conduits, canalisations et équipements	Etage 27 A.RALU	Vol 9 (VO R+1)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC) - Vol 18 (SAS ext) - Vol 20 (GT) - Vol 21 (VO) - Vol 22 (accès cave RDC) - Vol 33 (SAS ext)	
Plafond et faux-plafonds	RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC) - Vol 20 (GT) - Vol 21 (VO) - Vol 22 (accès cave RDC)	
Revêtement de mur	RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC)	
Revêtement de sol	RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC) - Vol 20 (GT) - Vol 21 (VO) - Vol 22 (accès cave RDC)	
Façades	RDC 15 J-B COLBERT	Vol 18 (SAS ext) - Vol 33 (SAS ext)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC 15 J-B COLBERT	Vol 21 (VO)	
Parois verticales intérieures et enduits	Etage 15 J-B COLBERT	Vol 23 (GT R+1) - Vol 24 (VO R+1) - Vol 25 (accès lgt R+1) - Vol 26 (GT R+2) - Vol 27 (VO R+2) - Vol 28 (accès lgt R+2) - Vol 29 (GT R+3) - Vol 30 (VO R+3) - Vol 31 (accès lgt R+3) - Vol 32 (accès cave R+3)	
Plafond et faux-plafonds	Etage 15 J-B COLBERT	Vol 23 (GT R+1) - Vol 24 (VO R+1) - Vol 25 (accès lgt R+1) - Vol 26 (GT R+2) - Vol 27 (VO R+2) - Vol 28 (accès lgt R+2) - Vol 29 (GT R+3) - Vol 30 (VO R+3) - Vol 31 (accès lgt R+3) - Vol 32 (accès cave R+3)	
Revêtement de sol	Etage 15 J-B COLBERT	Vol 23 (GT R+1) - Vol 24 (VO R+1) - Vol 25 (accès lgt R+1) - Vol 26 (GT R+2) - Vol 30 (VO R+3) - Vol 32 (accès cave R+3)	
Conduits, canalisations et équipements	Etage 15 J-B COLBERT	Vol 24 (VO R+1)	
Façades	Façade n°1	Vol 34 (Façade n°1)	
Façades	Façade n°2	Vol 35 (Façade n°2)	
Façades	Façade n°3	Vol 36 (Façade n°3)	

Façades	Façade n°4	Vol 37 (Façade n°4)	
Façades	Façade n°5	Vol 38 (Façade n°5)	
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 39 (toiture)	
Toiture et étanchéité	Combles 27 A.RALU	Vol 40 (combles VMC)	

K — Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L — Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M — Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 33 (SAS ext)	Frisette bois	Impossible de voir les matériaux présent sous la frisette bois sans dépose de celle-ci
Vol 18 (SAS ext)	Frisette bois	Impossible de voir les matériaux présent sous la frisette bois sans dépose de celle-ci
Vol 17 (SAS ext)	Frisette bois	Impossible de voir les matériaux présent sous la frisette bois sans dépose de celle-ci
Vol 1 (SAS ext)	Frisette bois	Impossible de voir les matériaux présent sous la frisette bois sans dépose de celle-ci
Vol 24 (VO R+1)	conduit ventilation local vide ordure	Impossible de voir la nature du conduit sans destruction de la grille de protection
Vol 9 (VO R+1)	conduit ventilation local vide ordure	Impossible de voir la nature du conduit sans destruction de la grille de protection
Vol 39 (toiture)	toiture terrasse	Accès impossible à la toiture terrasse
Vol 40 (combles VMC)	coffre placo	impossible de voir les matériaux sous le placo sans dépose de celui-ci.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 18 (SAS ext)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P3
Vol 16 (accès lgt RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P3
Vol 33 (SAS ext)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P3

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : La reprise d'étanchéité (prélèvement n°3) présente sur les 2 menuiseries d'accès au partie commune du 15 J-B COLBERT n'est pas visible pour les 2 menuiseries de 27 A.RALU.
La reprise d'étanchéité est peut etre recouverte par le placo et l'enduit extérieur ou absente. (A voir en cas de dépose des menuiseries)Commentaire n°2 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.
Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :
Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.
Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas éffectués.
Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.
Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.
Les élèments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.
Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées…)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)
Commentaire n°3 : Dans ce diagnostic, les locaux commerciaux situés au RDC du batiment n'ont pas été pris en compte. Aucune information n'ayant été fourni sur l'appartenance des locaux.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Combles 15 J-B COLBERT - Vol 43 (combles VMC)	Inaccessible sans sondage destructif	Trappe bloquée

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 21 (VO)	Vide ordure	Béton + ciment	P19	Réalisation d'un prélevement	Conduit extérieur et intérieur	002HD001044 n°19 - 1 - 002HD001044 n°19 - 2	P19	Matériau compact gris + matériau gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 21 (VO)	Vide ordure	Béton + ciment	P19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Conduit extérieur et intérieur	002HD001044 n°19 - 1 - 002HD001044 n°19 - 2	P19	Matériau compact gris + matériau gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 4 (VO)	Vide ordure	Béton + ciment	S55	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Conduit extérieur et intérieur	002HD001044 n°19 - 1 - 002HD001044 n°19 - 2	P19	Matériau compact gris + matériau gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 9 (VO R+1)	Vide ordure	Béton + ciment	S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Conduit extérieur et intérieur	002HD001044 n°19 - 1 - 002HD001044 n°19 - 2	P19	Matériau compact gris + matériau gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 24 (VO R+1)	Vide ordure	Béton + ciment	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Conduit extérieur et intérieur	002HD001044 n°19 - 1 - 002HD001044 n°19 - 2	P19	Matériau compact gris + matériau gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 24 (VO R+1)	Conduit air	conduit ventilation local vide ordure	I2							Impossible de voir la nature du conduit sans destruction de la grille de protection

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 27 A.RALU	Vol 9 (VO R+1)	Conduit air	conduit ventilation local vide ordure	I2							Impossible de voir la nature du conduit sans destruction de la grille de protection

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade n°5	Vol 38 (Façade n°5)	Murs	Enduits projetés	P26	Réalisation d'un prélevement	Soubassement gris	002HD001044 n°26 - 1 - 002HD001044 n°26 - 2	P26	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 1 (SAS ext) - Vol 17 (SAS ext)	Murs	Enduits projetés	S83 - S84	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Soubassement gris	002HD001044 n°26 - 1 - 002HD001044 n°26 - 2	P26	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 33 (SAS ext) - Vol 18 (SAS ext)	Murs	Enduits projetés	S85 - S86	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Soubassement gris	002HD001044 n°26 - 1 - 002HD001044 n°26 - 2	P26	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade n°1	Vol 34 (Façade n°1)	Murs	Enduits projetés	S127	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Soubassement gris	002HD001044 n°26 - 1 - 002HD001044 n°26 - 2	P26	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade n°3	Vol 36 (Façade n°3)	Murs	Enduits projetés	S126	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Soubassement gris	002HD001044 n°26 - 1 - 002HD001044 n°26 - 2	P26	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade n°4	Vol 37 (Façade n°4)	Murs	Enduits projetés	S125	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Soubassement gris	002HD001044 n°26 - 1 - 002HD001044 n°26 - 2	P26	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade n°5	Vol 38 (Façade n°5)	Murs	Enduits projetés	P27	Réalisation d'un prélevement	beige gratté (enduit principal)	002HD001044 n°27 - 1 - 002HD001044 n°27 - 2	P27	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade n°1	Vol 34 (Façade n°1)	Murs	Enduits projetés	S124	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	beige gratté (enduit principal)	002HD001044 n°27 - 1 - 002HD001044 n°27 - 2	P27	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade n°2	Vol 35 (Façade n°2)	Murs	Enduits projetés	S123	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	beige gratté (enduit principal)	002HD001044 n°27 - 1 - 002HD001044 n°27 - 2	P27	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade n°3	Vol 36 (Façade n°3)	Murs	Enduits projetés	S122	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	beige gratté (enduit principal)	002HD001044 n°27 - 1 - 002HD001044 n°27 - 2	P27	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade n°4	Vol 37 (Façade n°4)	Murs	Enduits projetés	S121	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	beige gratté (enduit principal)	002HD001044 n°27 - 1 - 002HD001044 n°27 - 2	P27	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade n°3	Vol 36 (Façade n°3)	Murs	Enduits projetés	P28	Réalisation d'un prélevement	Gris sur poteaux et arcade	002HD001044 n°28 - 1 - 002HD001044 n°28 - 2	P28	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade n°3	Vol 36 (Façade n°3)	Murs	Enduits projetés	P28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Gris sur poteaux et arcade	002HD001044 n°28 - 1 - 002HD001044 n°28 - 2	P28	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade n°2	Vol 35 (Façade n°2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P29	Réalisation d'un prélevement	Reprise d'étanchéité des menuiseries des locaux commerciaux au RDC	002HD001044 n°29 - 1 - 002HD001044 n°29 - 2	P29	Matériau souple gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 18 (SAS ext)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P3	Réalisation d'un prélevement	Semi dur grise et blanche (intérieure et extérieure)	002HD001044 n°3 - 1 - 002HD001044 n°3 - 2	P3	Matériau mou gris + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S1 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Semi dur grise et blanche (intérieure et extérieure)	002HD001044 n°3 - 1 - 002HD001044 n°3 - 2	P3	Matériau mou gris + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 33 (SAS ext)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S2 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Semi dur grise et blanche (intérieure et extérieure)	002HD001044 n°3 - 1 - 002HD001044 n°3 - 2	P3	Matériau mou gris + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie	P4	Réalisation d'un prélevement		002HD001044 n°4 - 1 - 002HD001044 n°4 - 2	P4	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD001044 n°4 - 1 - 002HD001044 n°4 - 2	P4	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie	S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD001044 n°4 - 1 - 002HD001044 n°4 - 2	P4	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre + peinture gouttelé beige	002HD001044 n°5 - 1 - 002HD001044 n°5 - 2	P5	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Enduit platre + peinture gouttelé beige	002HD001044 n°5 - 1 - 002HD001044 n°5 - 2	P5	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Enduit platre + peinture gouttelé beige	002HD001044 n°5 - 1 - 002HD001044 n°5 - 2	P5	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 7 (accès lgt R+1) - Vol 10 (accès lgt R+2) - Vol 13 (accès lgt R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S34 - S88 - S89	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Enduit platre + peinture gouttelé beige	002HD001044 n°5 - 1 - 002HD001044 n°5 - 2	P5	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 25 (accès lgt R+1) - Vol 28 (accès lgt R+2) - Vol 31 (accès lgt R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S11 - S90 - S91	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Enduit platre + peinture gouttelé beige	002HD001044 n°5 - 1 - 002HD001044 n°5 - 2	P5	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 20 (GT)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P9	Réalisation d'un prélevement	Enduit débulage béton banché brut	002HD001044 n°9 - 1 - 002HD001044 n°9 - 2	P9	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 21 (VO) - Vol 22 (accès cave RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	002HD001044 n°9 - 1 - 002HD001044 n°9 - 2	P9	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 3 (GT) - Vol 5 (DGT) - Vol 4 (VO) - Vol 6 (local vélo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S42 - S61 - S62 - S68	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	002HD001044 n°9 - 1 - 002HD001044 n°9 - 2	P9	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 7 (accès lgt R+1) - Vol 9 (VO R+1) - Vol 11 (GT R+2) - Vol 12 (VO R+2) - Vol 14 (GT R+3) - Vol 15 (VO R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S73 - S74 - S96 - S97 - S98 - S99	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	002HD001044 n°9 - 1 - 002HD001044 n°9 - 2	P9	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 23 (GT R+1) - Vol 24 (VO R+1) - Vol 26 (GT R+2) - Vol 27 (VO R+2) - Vol 29 (GT R+3) - Vol 30 (VO R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S14 - S15 - S100 - S101 - S102 - S103	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	002HD001044 n°9 - 1 - 002HD001044 n°9 - 2	P9	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 20 (GT)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélevement	Joint d'assemblage des parpaings	002HD001044 n°10 - 1 - 002HD001044 n°10 - 2	P10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 22 (accès cave RDC) - Vol 21 (VO)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	002HD001044 n°10 - 1 - 002HD001044 n°10 - 2	P10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 27 A.RALU	Vol 3 (GT) - Vol 4 (VO) - Vol 6 (local vélo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S43 - S63 - S69	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	002HD001044 n°10 - 1 - 002HD001044 n°10 - 2	P10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 9 (VO R+1) - Vol 12 (VO R+2) - Vol 15 (VO R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S75 - S104 - S105	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	002HD001044 n°10 - 1 - 002HD001044 n°10 - 2	P10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 23 (GT R+1) - Vol 24 (VO R+1) - Vol 27 (VO R+2) - Vol 26 (GT R+2) - Vol 29 (GT R+3) - Vol 30 (VO R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S16 - S17 - S106 - S107 - S108 - S109	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	002HD001044 n°10 - 1 - 002HD001044 n°10 - 2	P10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 20 (GT)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des carreaux de platres	P12	Réalisation d'un prélevement		002HD001044 n°12 - 1 - 002HD001044 n°12 - 2	P12	Joint d'assemblage des carreaux de platres	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 20 (GT)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des carreaux de platres	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD001044 n°12 - 1 - 002HD001044 n°12 - 2	P12	Joint d'assemblage des carreaux de platres	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 3 (GT)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des carreaux de platres	S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD001044 n°12 - 1 - 002HD001044 n°12 - 2	P12	Joint d'assemblage des carreaux de platres	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 27 A.RALU	Vol 8 (GT R+1) - Vol 11 (GT R+2) - Vol 14 (GT R+3)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des carreaux de platres	S78 - S114 - S115	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD001044 n°12 - 1 - 002HD001044 n°12 - 2	P12	Joint d'assemblage des carreaux de platres	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 29 (GT R+3) - Vol 23 (GT R+1) - Vol 26 (GT R+2)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des carreaux de platres	S20 - S27 - S116	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD001044 n°12 - 1 - 002HD001044 n°12 - 2	P12	Joint d'assemblage des carreaux de platres	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 22 (accès cave RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélevement	Rebouchage autour porte	002HD001044 n°16 - 1 - 002HD001044 n°16 - 2	P16	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 20 (GT)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S70	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Rebouchage autour porte	002HD001044 n°16 - 1 - 002HD001044 n°16 - 2	P16	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 9 (VO R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S71	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Rebouchage autour porte	002HD001044 n°16 - 1 - 002HD001044 n°16 - 2	P16	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 21 (VO)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P18	Réalisation d'un prélevement	En partie basse du mur parpaings	002HD001044 n°18 - 1 - 002HD001044 n°18 - 2	P18	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 21 (VO)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	En partie basse du mur parpaings	002HD001044 n°18 - 1 - 002HD001044 n°18 - 2	P18	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 27 A.RALU	Vol 4 (VO)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	En partie basse du mur parpaings	002HD001044 n°18 - 1 - 002HD001044 n°18 - 2	P18	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 9 (VO R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S81	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	En partie basse du mur parpaings	002HD001044 n°18 - 1 - 002HD001044 n°18 - 2	P18	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 24 (VO R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	En partie basse du mur parpaings	002HD001044 n°18 - 1 - 002HD001044 n°18 - 2	P18	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 25 (accès lgt R+1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P20	Réalisation d'un prélevement	Doublage placoplatre + enduit gouttelé	002HD001044 n°20 - 1 - 002HD001044 n°20 - 2	P20	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 32 (accès cave R+3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Doublage placoplatre + enduit gouttelé	002HD001044 n°20 - 1 - 002HD001044 n°20 - 2	P20	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Doublage placoplatre + enduit gouttelé	002HD001044 n°20 - 1 - 002HD001044 n°20 - 2	P20	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 7 (accès lgt R+1) - Vol 8 (GT R+1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S57 - S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Doublage placoplatre + enduit gouttelé	002HD001044 n°20 - 1 - 002HD001044 n°20 - 2	P20	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 22 (accès cave RDC)	Murs et cloisons	Joint étanchéité semi dur violet	P23	Réalisation d'un prélevement		002HD001044 n°23 - 1 - 002HD001044 n°23 - 2	P23	Matériau souple gris + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles 27 A.RALU	Vol 40 (combles VMC)	Gaines et coffre verticaux	coffre placo	I4							impossible de voir les matériaux sous le placo sans dépose de celui-ci.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélevement	Sous face escalier	002HD001044 n°6 - 1 - 002HD001044 n°6 - 2 - 002HD001044 n°6 - 3	P6	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Sous face escalier	002HD001044 n°6 - 1 - 002HD001044 n°6 - 2 - 002HD001044 n°6 - 3	P6	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 7 (accès lgt R+1) - Vol 10 (accès lgt R+2)	Plafonds	Enduit plâtre	S36 - S93	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Sous face escalier	002HD001044 n°6 - 1 - 002HD001044 n°6 - 2 - 002HD001044 n°6 - 3	P6	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 25 (accès lgt R+1) - Vol 28 (accès lgt R+2)	Plafonds	Enduit plâtre	S12 - S92	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Sous face escalier	002HD001044 n°6 - 1 - 002HD001044 n°6 - 2 - 002HD001044 n°6 - 3	P6	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 33 (SAS ext)	Faux plafonds	Frisette bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présent sous la frisette bois sans dépose de celle-ci
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 18 (SAS ext)	Faux plafonds	Frisette bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présent sous la frisette bois sans dépose de celle-ci
RDC 27 A.RALU	Vol 17 (SAS ext)	Faux plafonds	Frisette bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présent sous la frisette bois sans dépose de celle-ci
RDC 27 A.RALU	Vol 1 (SAS ext)	Faux plafonds	Frisette bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présent sous la frisette bois sans dépose de celle-ci

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement	Plafond dur droit (enduit gouttelé)	002HD001044 n°7 - 1	P7	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond dur droit (enduit gouttelé)	002HD001044 n°7 - 1	P7	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 7 (accès lgt R+1) - Vol 10 (accès lgt R+2)	Plafonds	Enduit plâtre	S38 - S94	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond dur droit (enduit gouttelé)	002HD001044 n°7 - 1	P7	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 25 (accès lgt R+1) - Vol 28 (accès lgt R+2)	Plafonds	Enduit plâtre	S13 - S95	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond dur droit (enduit gouttelé)	002HD001044 n°7 - 1	P7	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P8	Réalisation d'un prélevement	Plafond placoplatre	002HD001044 n°8 - 1 - 002HD001044 n°8 - 2	P8	Joints panneau / plaques	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond placoplatre	002HD001044 n°8 - 1 - 002HD001044 n°8 - 2	P8	Joints panneau / plaques	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 13 (accès lgt R+3)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond placoplatre	002HD001044 n°8 - 1 - 002HD001044 n°8 - 2	P8	Joints panneau / plaques	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 31 (accès lgt R+3)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond placoplatre	002HD001044 n°8 - 1 - 002HD001044 n°8 - 2	P8	Joints panneau / plaques	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 20 (GT)	Plafonds	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélevement	Enduit débulage plafond brut	002HD001044 n°11 - 1 - 002HD001044 n°11 - 2	P11	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 21 (VO)	Plafonds	Enduit ciment	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit débulage plafond brut	002HD001044 n°11 - 1 - 002HD001044 n°11 - 2	P11	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 3 (GT) - Vol 4 (VO)	Plafonds	Enduit ciment	S44 - S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit débulage plafond brut	002HD001044 n°11 - 1 - 002HD001044 n°11 - 2	P11	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 9 (VO R+1) - Vol 8 (GT R+1) - Vol 12 (VO R+2) - Vol 11 (GT R+2)	Plafonds	Enduit ciment	S76 - S77 - S110 - S111	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit débulage plafond brut	002HD001044 n°11 - 1 - 002HD001044 n°11 - 2	P11	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 23 (GT R+1) - Vol 24 (VO R+1) - Vol 27 (VO R+2) - Vol 26 (GT R+2)	Plafonds	Enduit ciment	S18 - S19 - S112 - S113	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit débulage plafond brut	002HD001044 n°11 - 1 - 002HD001044 n°11 - 2	P11	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 22 (accès cave RDC)	Plafonds	Flocages	P17	Réalisation d'un prélevement		002HD001044 n°17 - 1 - 002HD001044 n°17 - 2	P17	Matériau cotonneux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 21 (VO)	Plafonds	Flocages	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001044 n°17 - 1 - 002HD001044 n°17 - 2	P17	Matériau cotonneux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 5 (DGT) - Vol 4 (VO) - Vol 6 (local vélo)	Plafonds	Flocages	S51 - S52 - S53	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001044 n°17 - 1 - 002HD001044 n°17 - 2	P17	Matériau cotonneux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 29 (GT R+3)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P21	Réalisation d'un prélevement	Plafond rampant + droit placoplatre	002HD001044 n°21 - 1 - 002HD001044 n°21 - 2	P21	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 30 (VO R+3) - Vol 31 (accès lgt R+3) - Vol 32 (accès cave R+3)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Plafond rampant + droit placoplatre	002HD001044 n°21 - 1 - 002HD001044 n°21 - 2	P21	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 13 (accès lgt R+3) - Vol 15 (VO R+3) - Vol 14 (GT R+3)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S58 - S59 - S60	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Plafond rampant + droit placoplatre	002HD001044 n°21 - 1 - 002HD001044 n°21 - 2	P21	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélevement	blanche (plinthes beiges)	002HD001044 n°2 - 1 - 002HD001044 n°2 - 2	P2	Colle blanche + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P25	Réalisation d'un prélevement	Grise (plinthes grises)	002HD001044 n°25 - 1 - 002HD001044 n°25 - 2	P25	Colle blanche + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Grise (plinthes grises)	002HD001044 n°25 - 1 - 002HD001044 n°25 - 2	P25	Colle blanche + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement	Grise (carreaux 30 X 30 Beige)	002HD001044 n°1 - 1 - 002HD001044 n°1 - 2	P1	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 20 (GT)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P13	Réalisation d'un prélevement	Grise	002HD001044 n°13 - 1 - 002HD001044 n°13 - 2	P13	Chappe maigre (base ciment)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 22 (accès cave RDC) - Vol 21 (VO)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Grise	002HD001044 n°13 - 1 - 002HD001044 n°13 - 2	P13	Chappe maigre (base ciment)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 3 (GT) - Vol 4 (VO) - Vol 5 (DGT) - Vol 6 (local vélo)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S46 - S65 - S66 - S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Grise	002HD001044 n°13 - 1 - 002HD001044 n°13 - 2	P13	Chappe maigre (base ciment)	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 9 (VO R+1) - Vol 8 (GT R+1) - Vol 11 (GT R+2) - Vol 14 (GT R+3)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S79 - S80 - S117 - S118	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Grise	002HD001044 n°13 - 1 - 002HD001044 n°13 - 2	P13	Chappe maigre (base ciment)	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 23 (GT R+1) - Vol 24 (VO R+1) - Vol 26 (GT R+2) - Vol 30 (VO R+3)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S21 - S22 - S119 - S120	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Grise	002HD001044 n°13 - 1 - 002HD001044 n°13 - 2	P13	Chappe maigre (base ciment)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC)	Revêtement de sol	Ragréage	P14	Réalisation d'un prélevement	Rose	002HD001044 n°14 - 1 - 002HD001044 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune + sous couche de ragréage grise non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC)	Revêtement de sol	Ragréage	S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Rose	002HD001044 n°14 - 1 - 002HD001044 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune + sous couche de ragréage grise non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 7 (accès lgt R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Rose	002HD001044 n°14 - 1 - 002HD001044 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune + sous couche de ragréage grise non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 25 (accès lgt R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Rose	002HD001044 n°14 - 1 - 002HD001044 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune + sous couche de ragréage grise non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélevement	Lino marron + colle jaune	002HD001044 n°15 - 1 - 002HD001044 n°15 - 2	P15	Revêtement souple beige avec fibres + revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Lino marron + colle jaune	002HD001044 n°15 - 1 - 002HD001044 n°15 - 2	P15	Revêtement souple beige avec fibres + revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 27 A.RALU	Vol 7 (accès lgt R+1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S50	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Lino marron + colle jaune	002HD001044 n°15 - 1 - 002HD001044 n°15 - 2	P15	Revêtement souple beige avec fibres + revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 25 (accès lgt R+1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Lino marron + colle jaune	002HD001044 n°15 - 1 - 002HD001044 n°15 - 2	P15	Revêtement souple beige avec fibres + revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 32 (accès cave R+3)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P22	Réalisation d'un prélevement	gratté	002HD001044 n°22 - 1 - 002HD001044 n°22 - 2	P22	Matériau compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P24	Réalisation d'un prélevement	Grise (carreaux 30 X 30 Gris)	002HD001044 n°24 - 1 - 002HD001044 n°24 - 2	P24	Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles 27 A.RALU	Vol 40 (combles VMC)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P30	Réalisation d'un prélevement	Laine de verre + pare vapeur		P30	Matériau fibreux jaune avec couche en papier et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 39 (toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S87							Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Toiture	Vol 39 (toiture)	toiture	toiture terrasse	I3							Accès impossible à la toiture terrasse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC 27 A.RALU	RDC 27 A.RALU - Plan de repérage - Actions menées
	RDC 27 A.RALU	RDC 27 A.RALU - Plan de prélèvements
	Etage 27 A.RALU	Etage 27 A.RALU - Plan de repérage - Actions menées
	Etage 27 A.RALU	Etage 27 A.RALU - Plan de prélèvements
	RDC 15 J-B COLBERT	RDC 15 J-B COLBERT - Plan de repérage - Actions menées
	RDC 15 J-B COLBERT	RDC 15 J-B COLBERT - Plan de prélèvements
	RDC 15 J-B COLBERT	RDC 15 J-B COLBERT - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Etage 15 J-B COLBERT	Etage 15 J-B COLBERT - Plan de repérage - Actions menées
	Etage 15 J-B COLBERT	Etage 15 J-B COLBERT - Plan de prélèvements
	Combles 15 J-B COLBERT	Combles 15 J-B COLBERT - Plan de repérage - Actions menées
	Combles 27 A.RALU	Combles 27 A.RALU - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade n°1	Façade n°1 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade n°2	Façade n°2 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade n°3	Façade n°3 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade n°4	Façade n°4 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade n°5	Façade n°5 - Plan de repérage - Actions menées

RDC 27 A.RALU - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001044

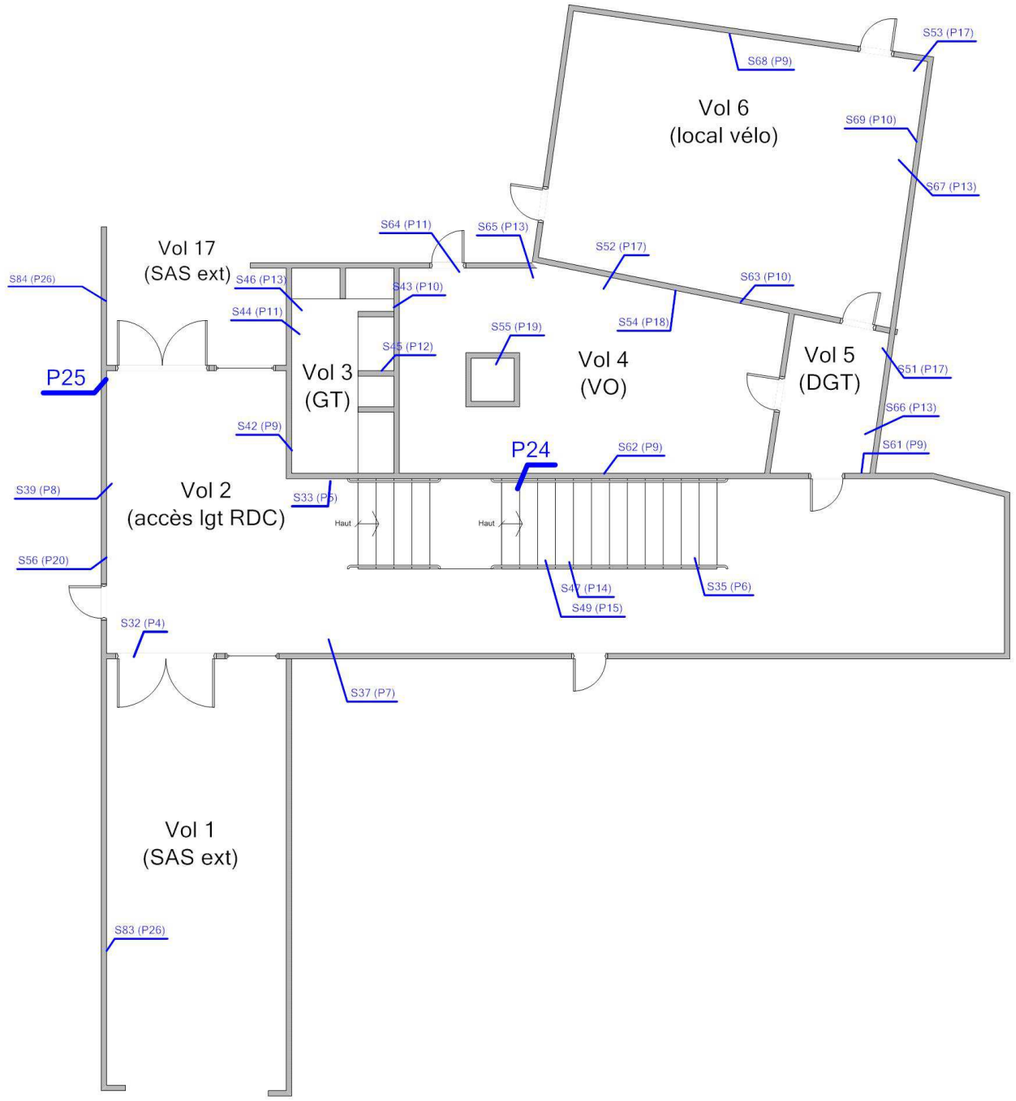

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

RDC 27 A.RALU - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001044

Légende

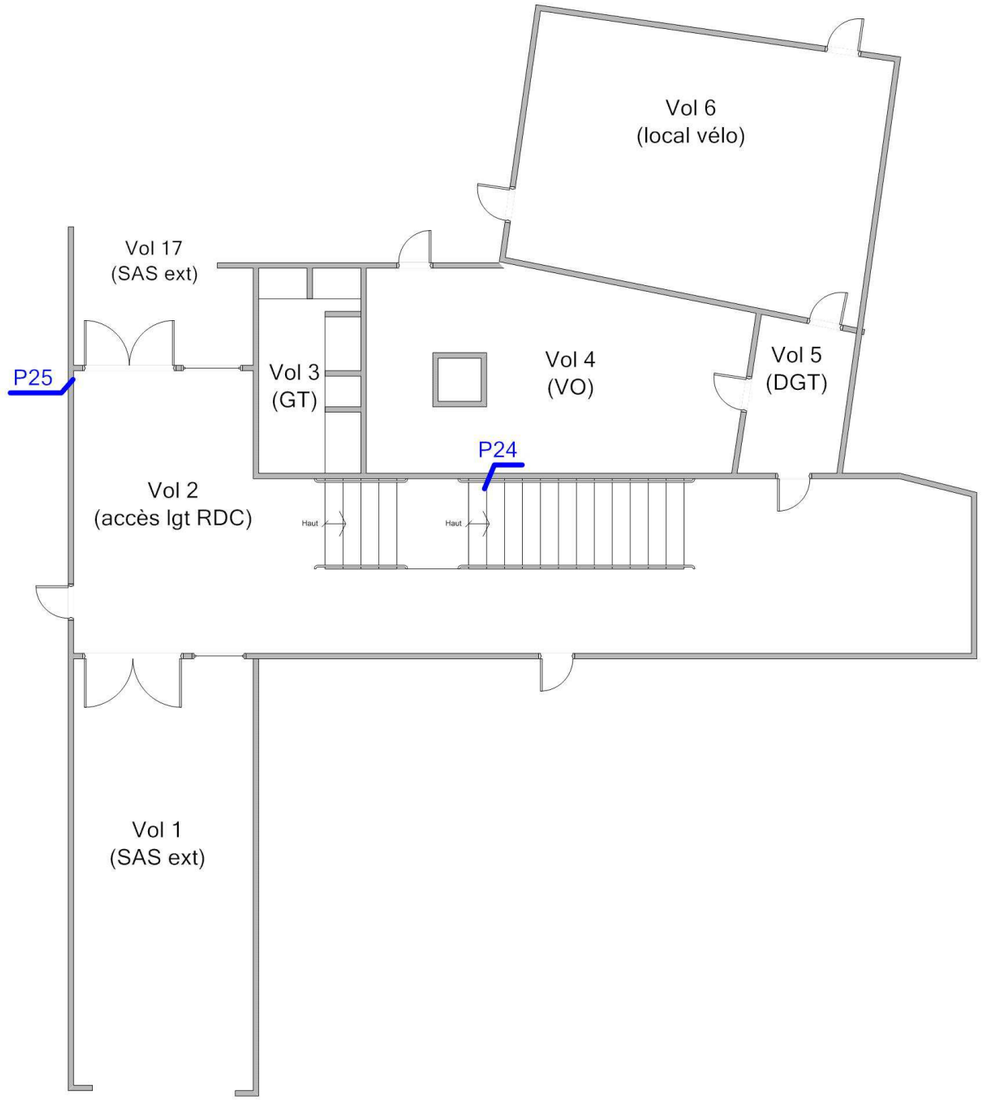

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

ETAGE 27 A.RALU - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001044

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

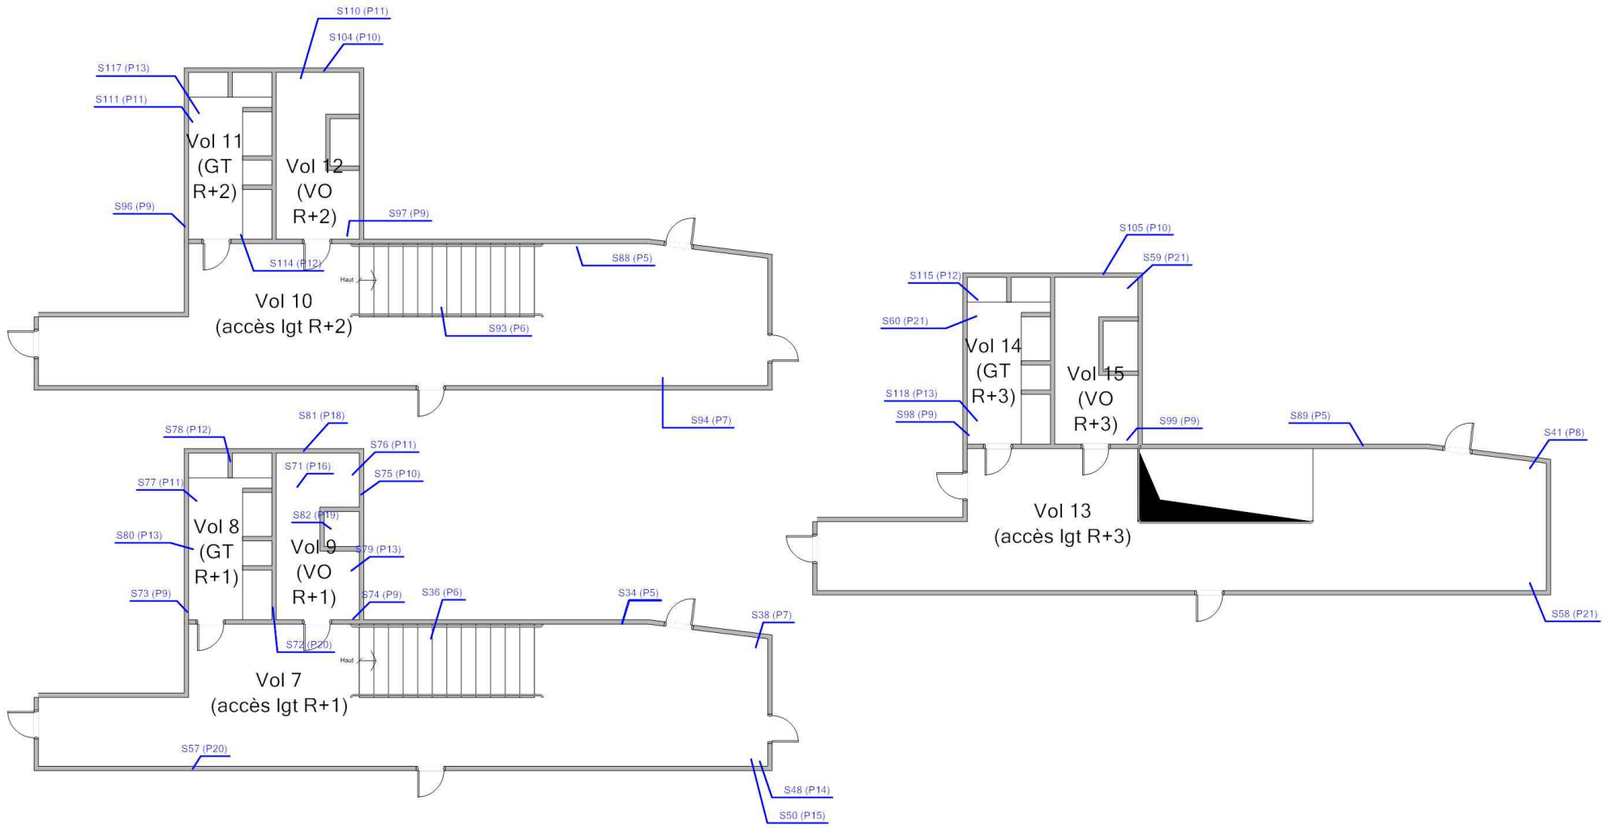

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

ETAGE 27 A.RALU - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001044

Légende

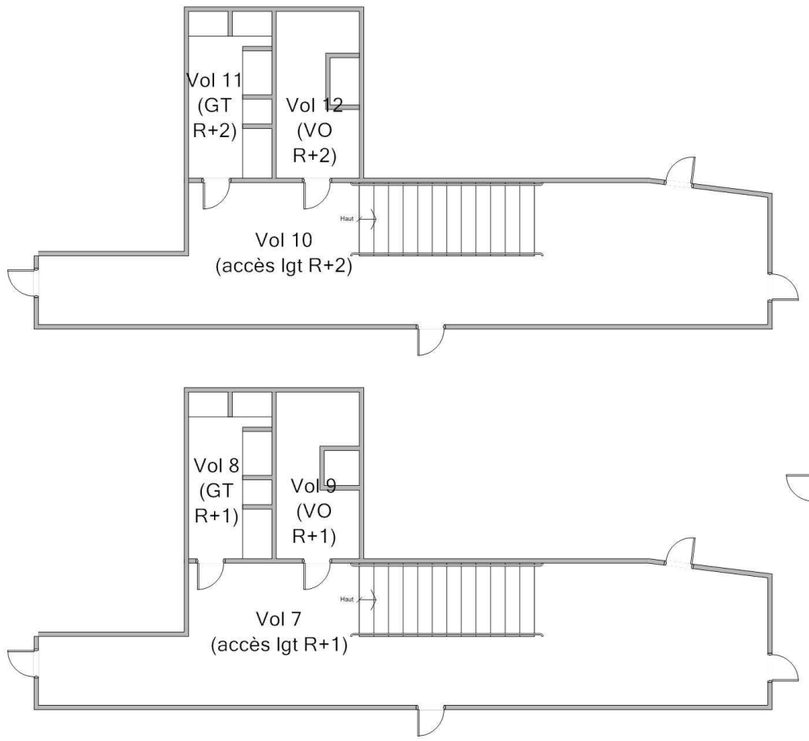

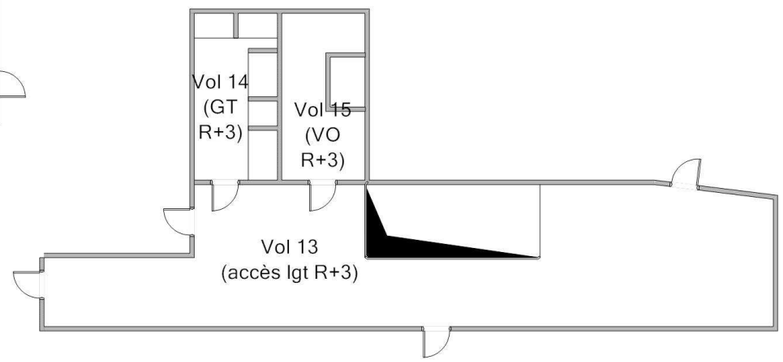

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

RDC 15 J-B COLBERT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001044

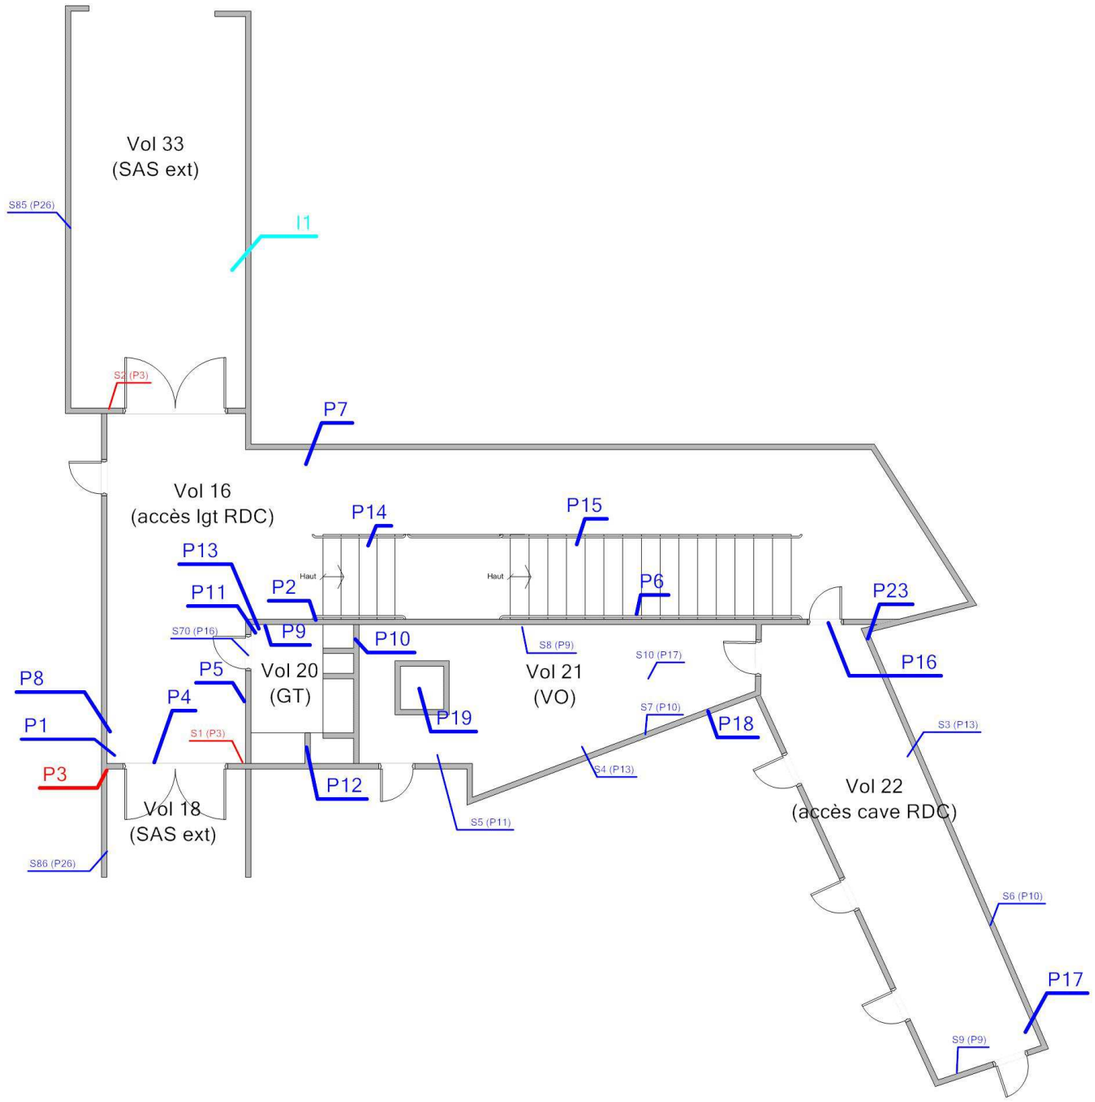

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

RDC 15 J-B COLBERT - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001044

Légende

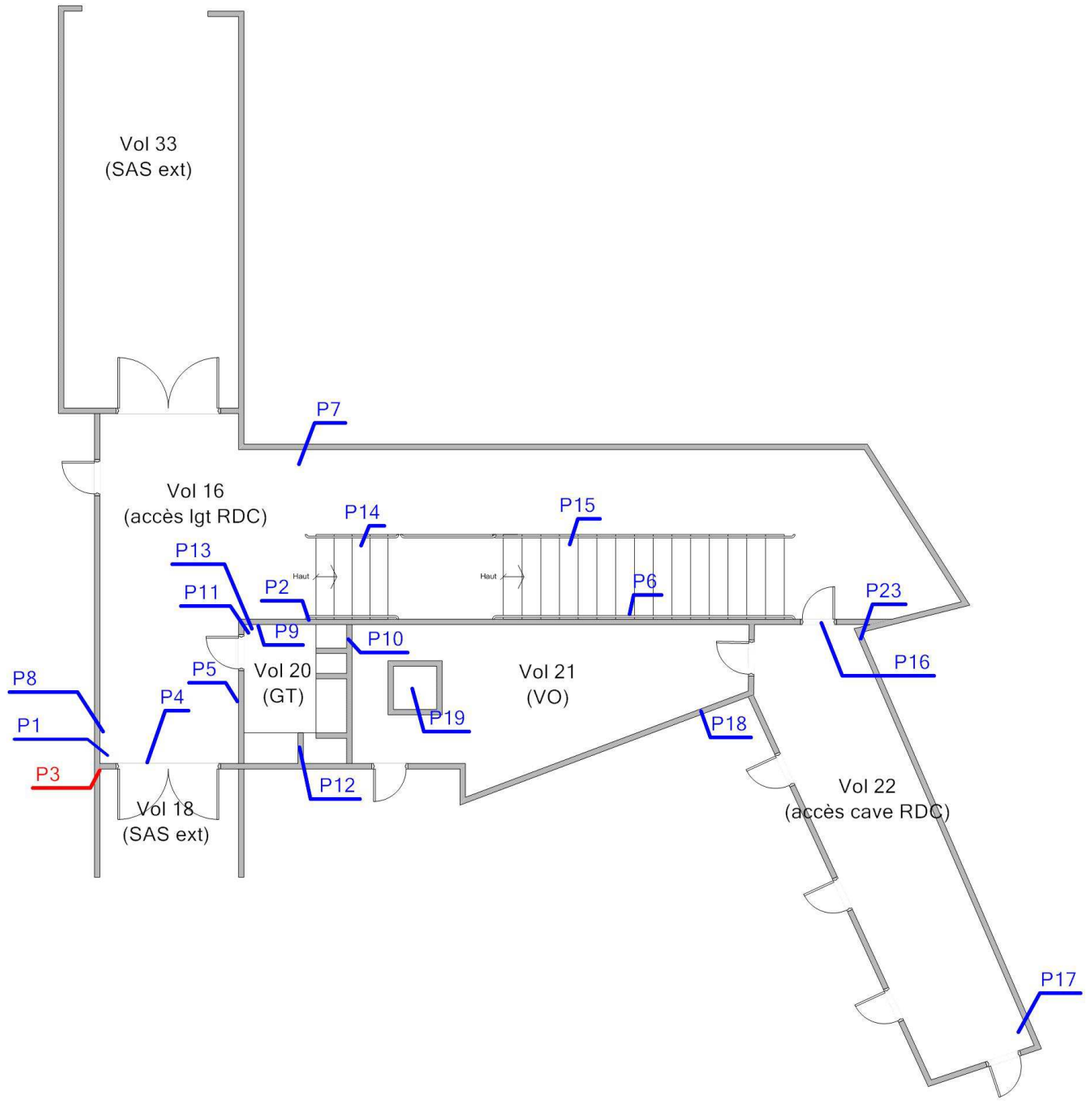

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

RDC 15 J-B COLBERT - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001044

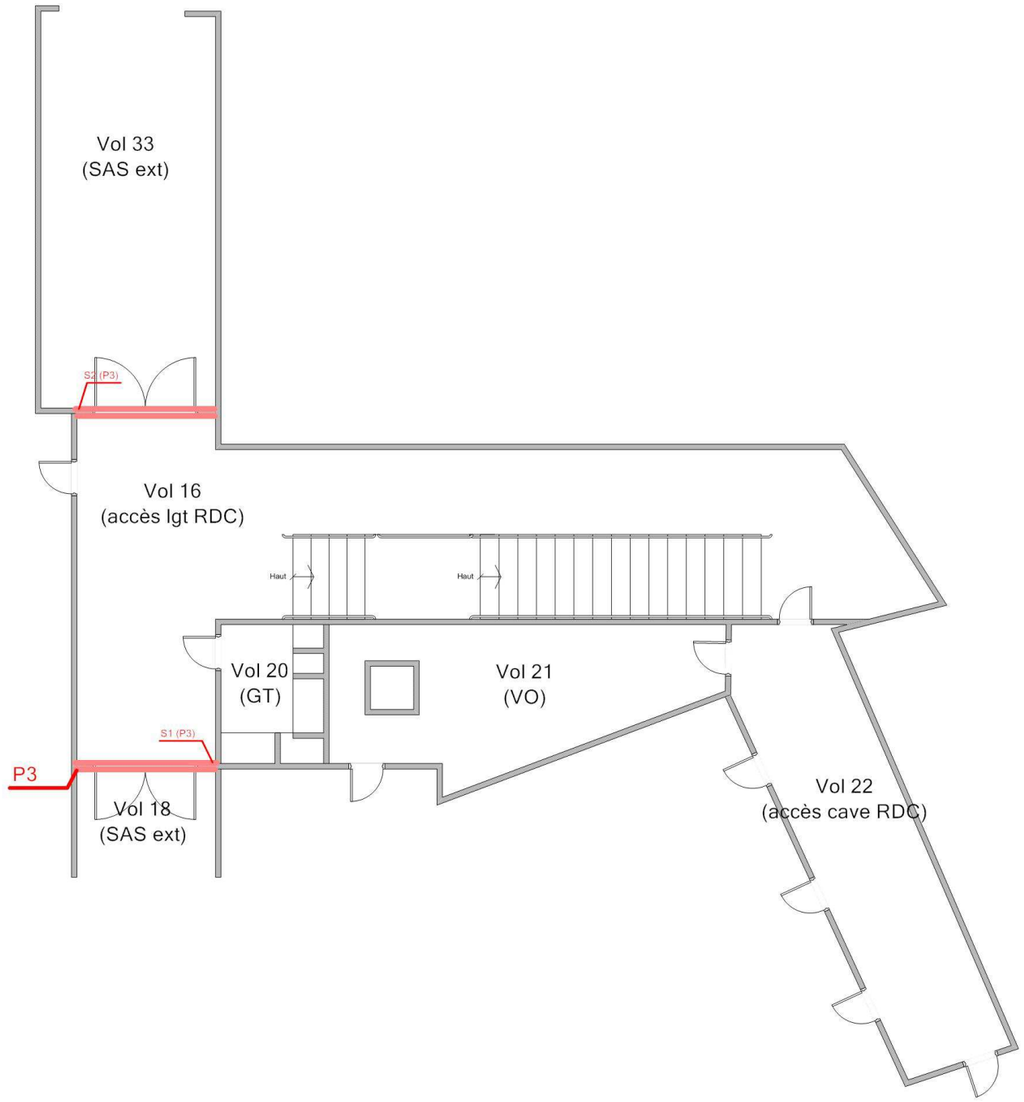

Légende

	P3 : Reprise détanchéité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

ETAGE 15 J-B COLBERT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001044

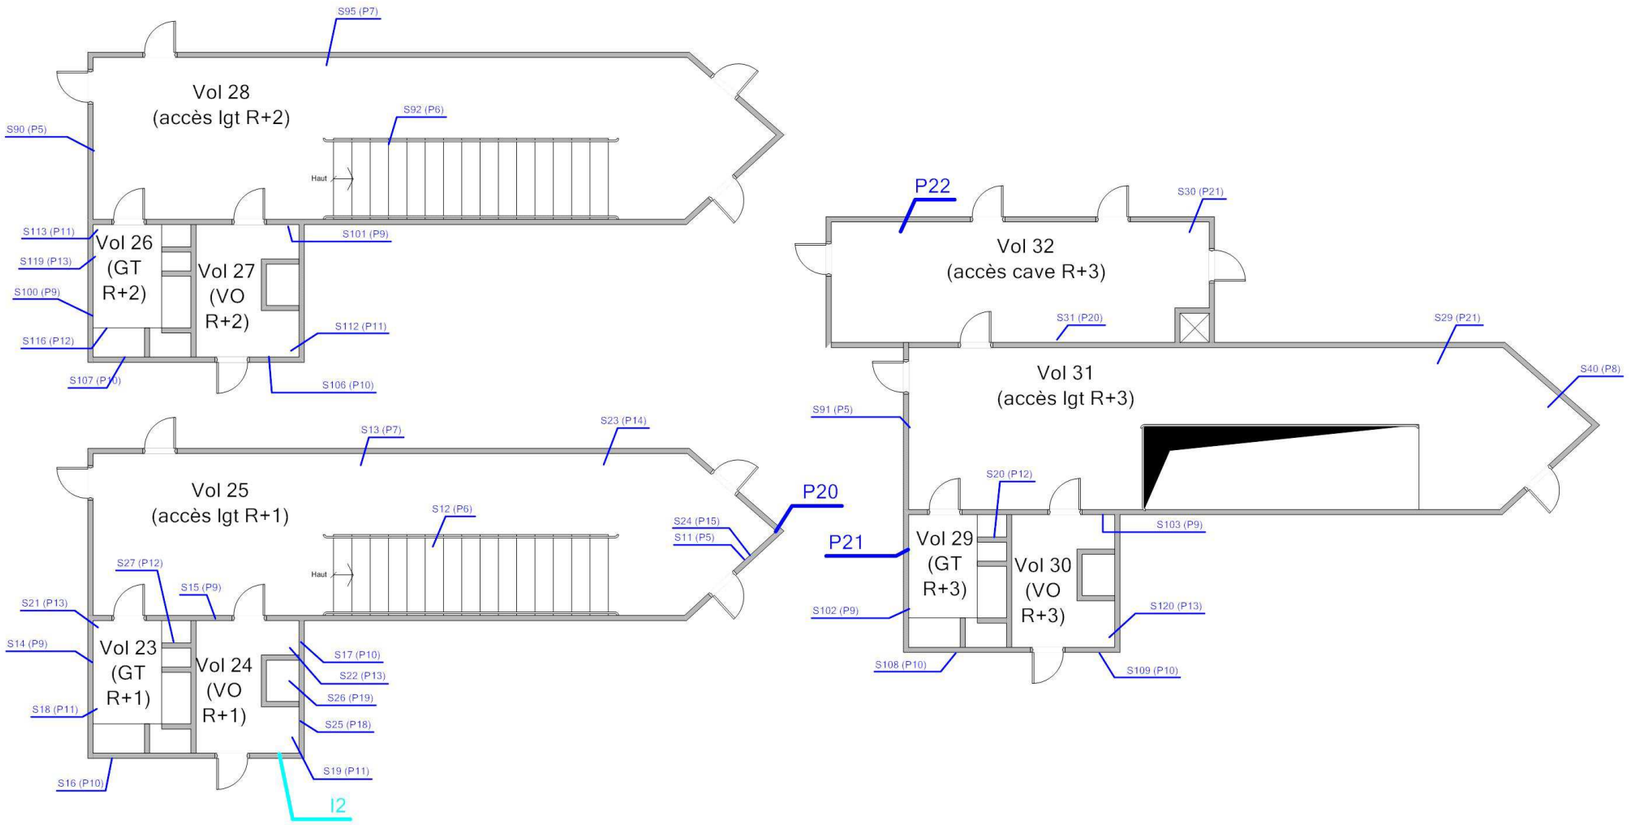

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

ETAGE 15 J-B COLBERT - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001044

Légende

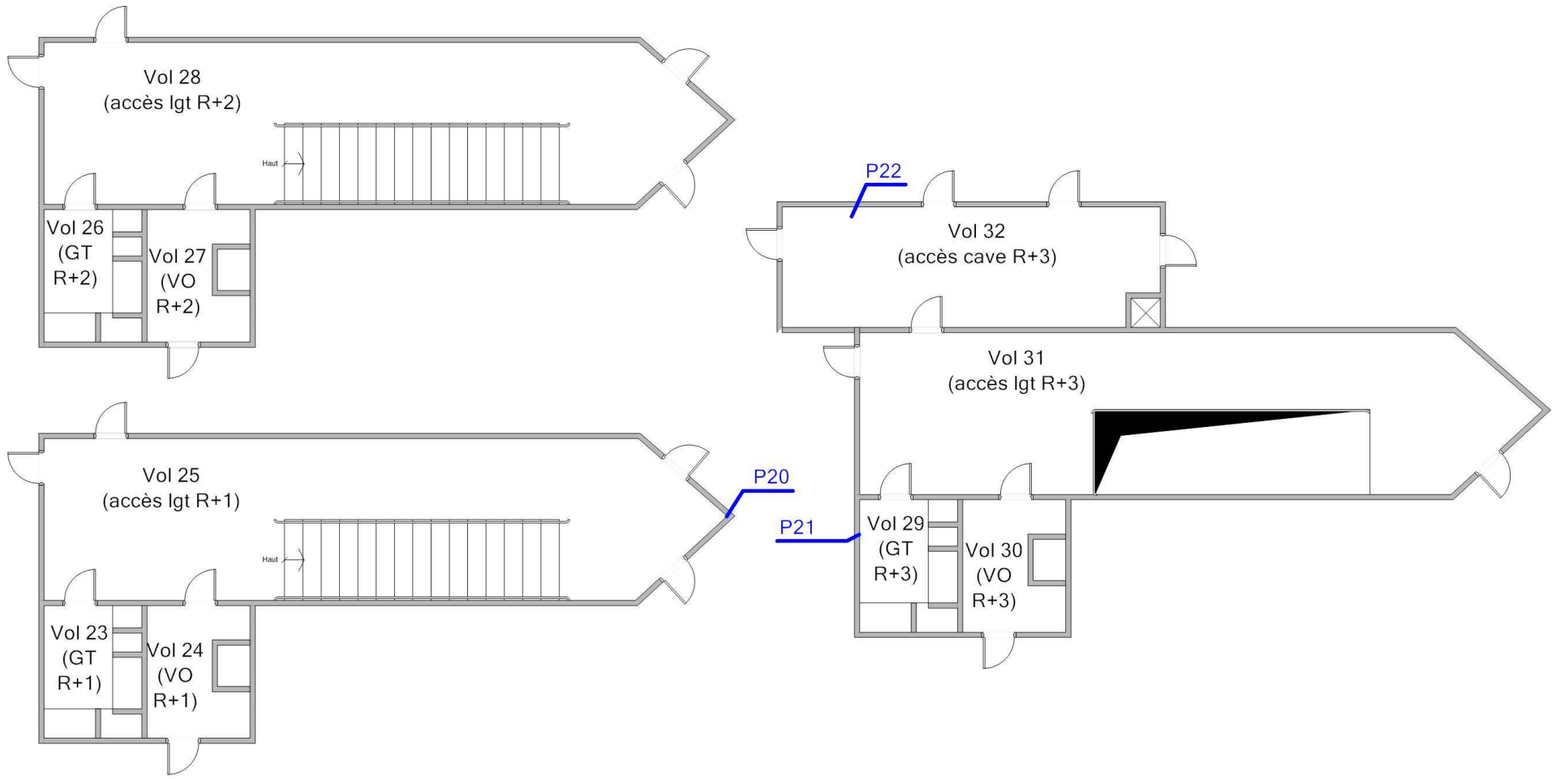

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

COMBLES 15 J-B COLBERT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001044

Légende

	Volume non visité

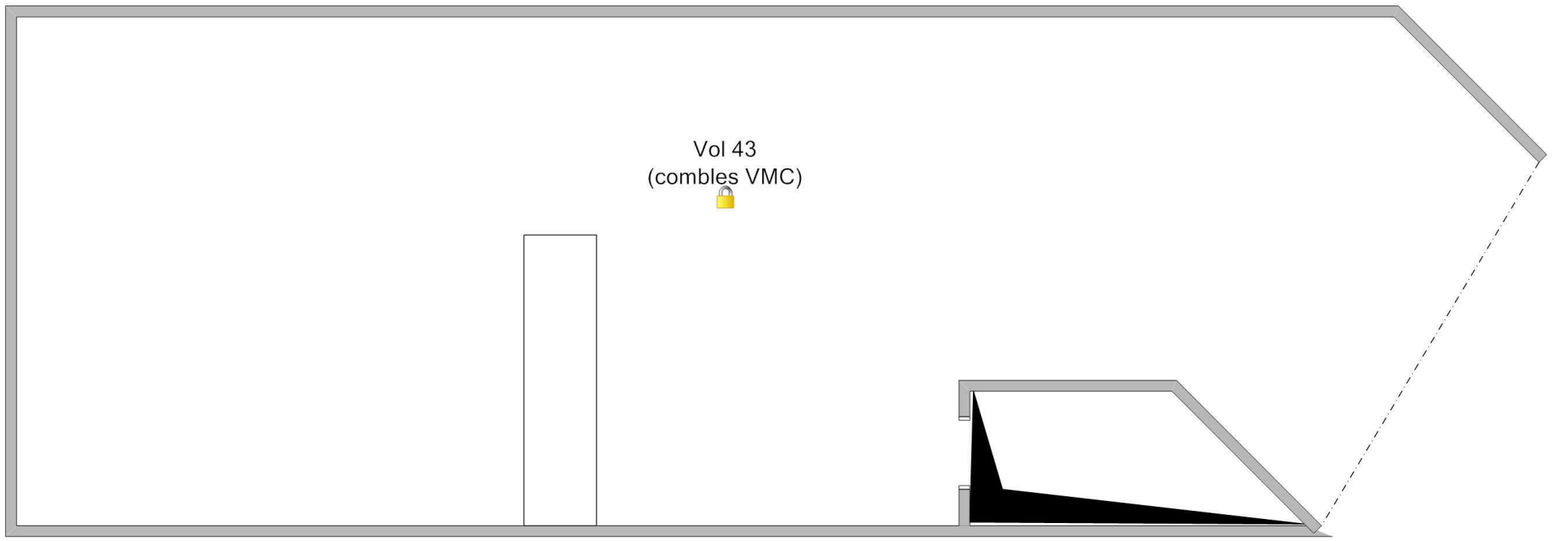

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

COMBLES 27 A.RALU - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001044

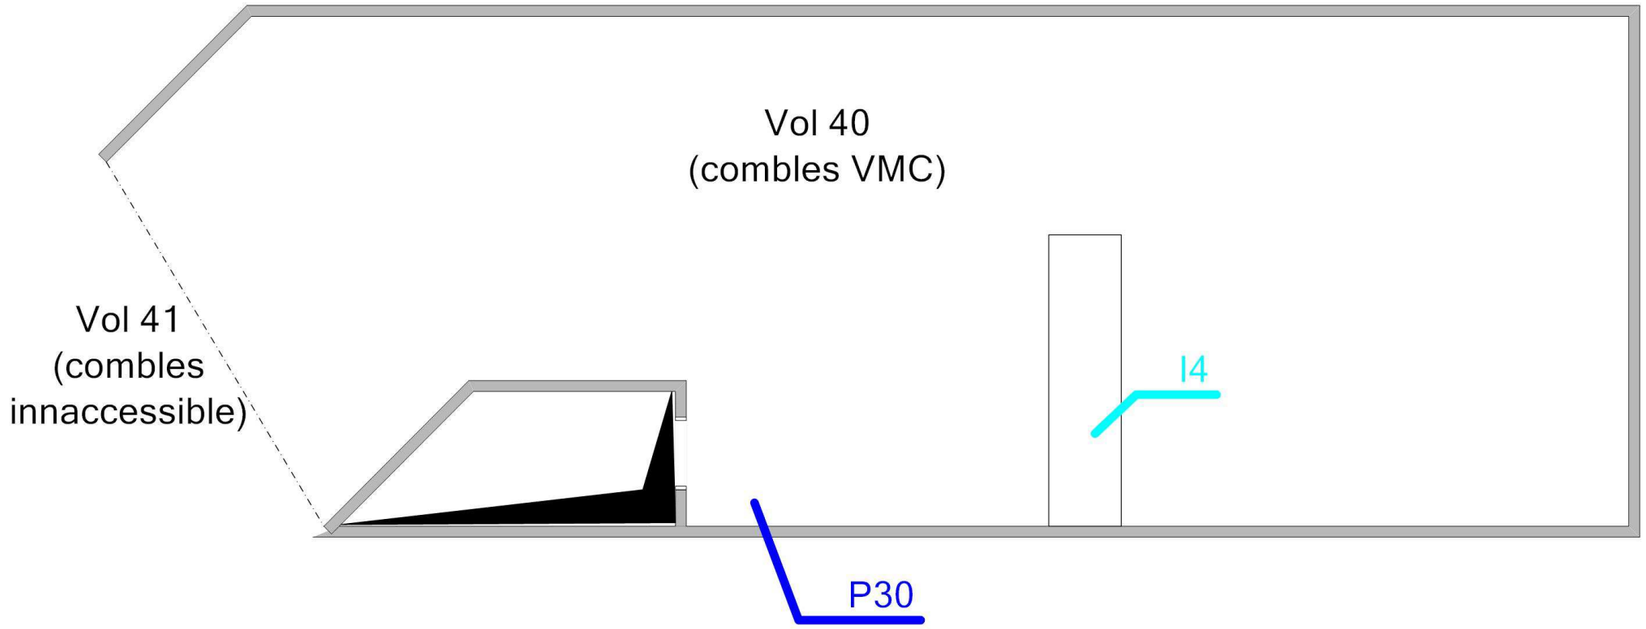

Légende	
P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001044

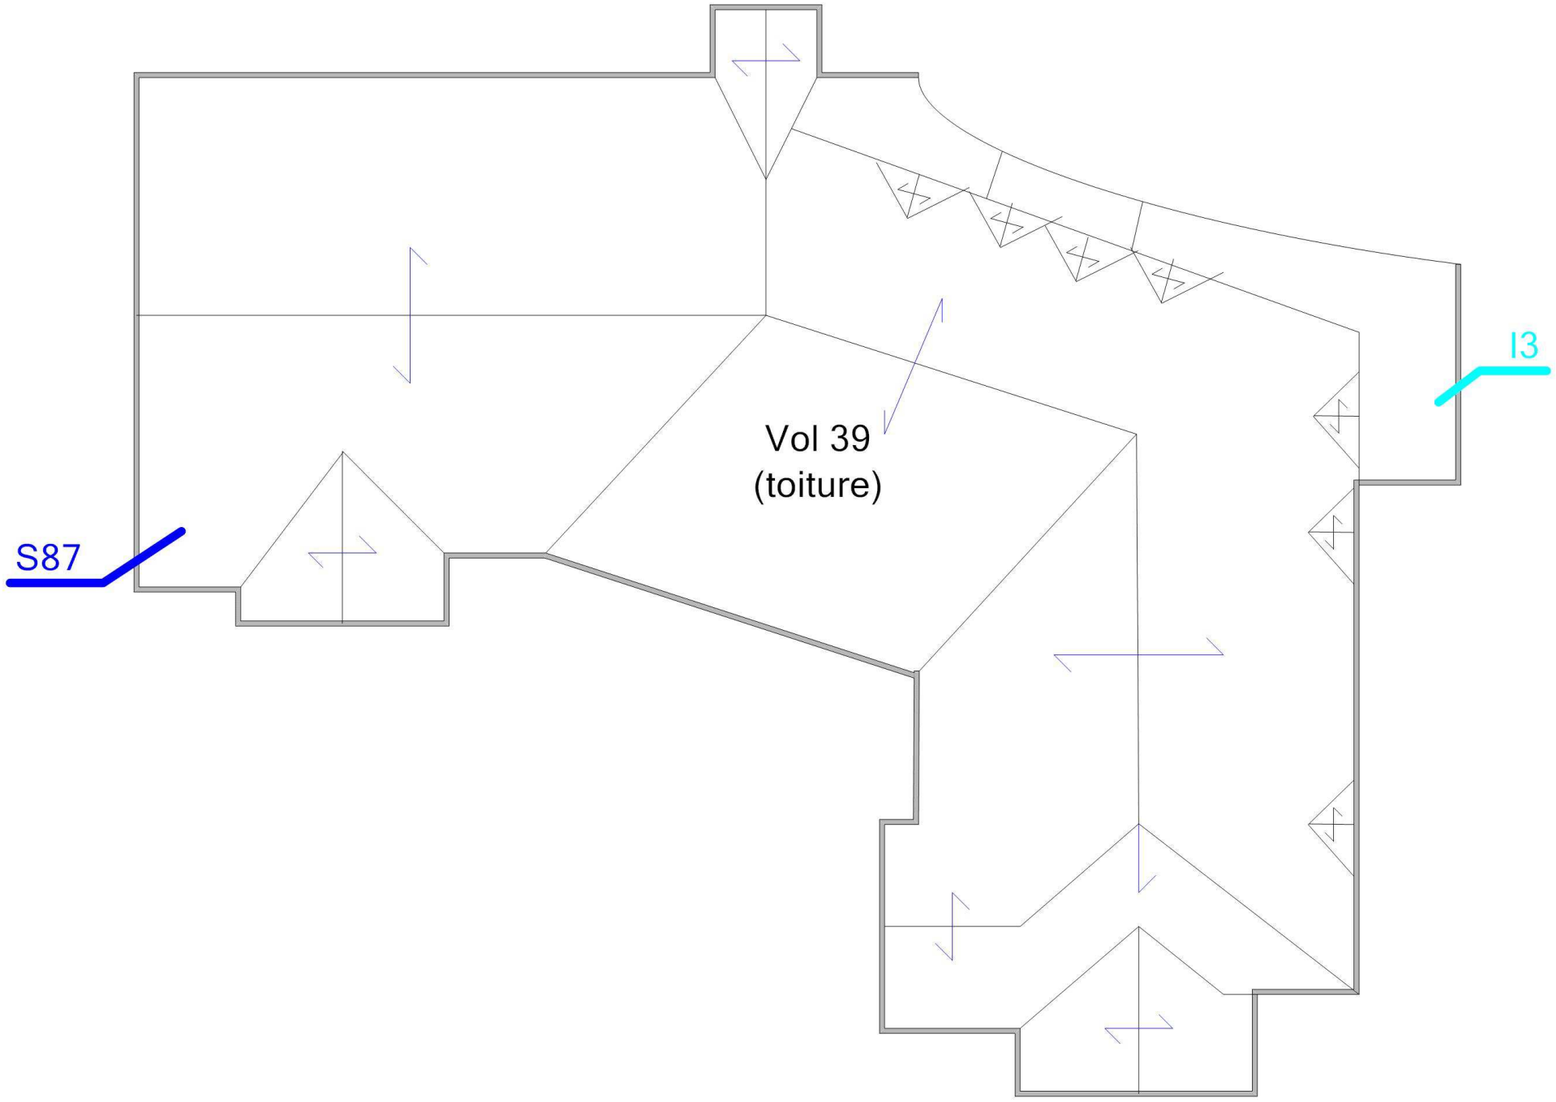

Légende

I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

PLAN MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001044

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

FAÇADE N°1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001044

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

FAÇADE N°2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001044

Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

FAÇADE N°3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001044

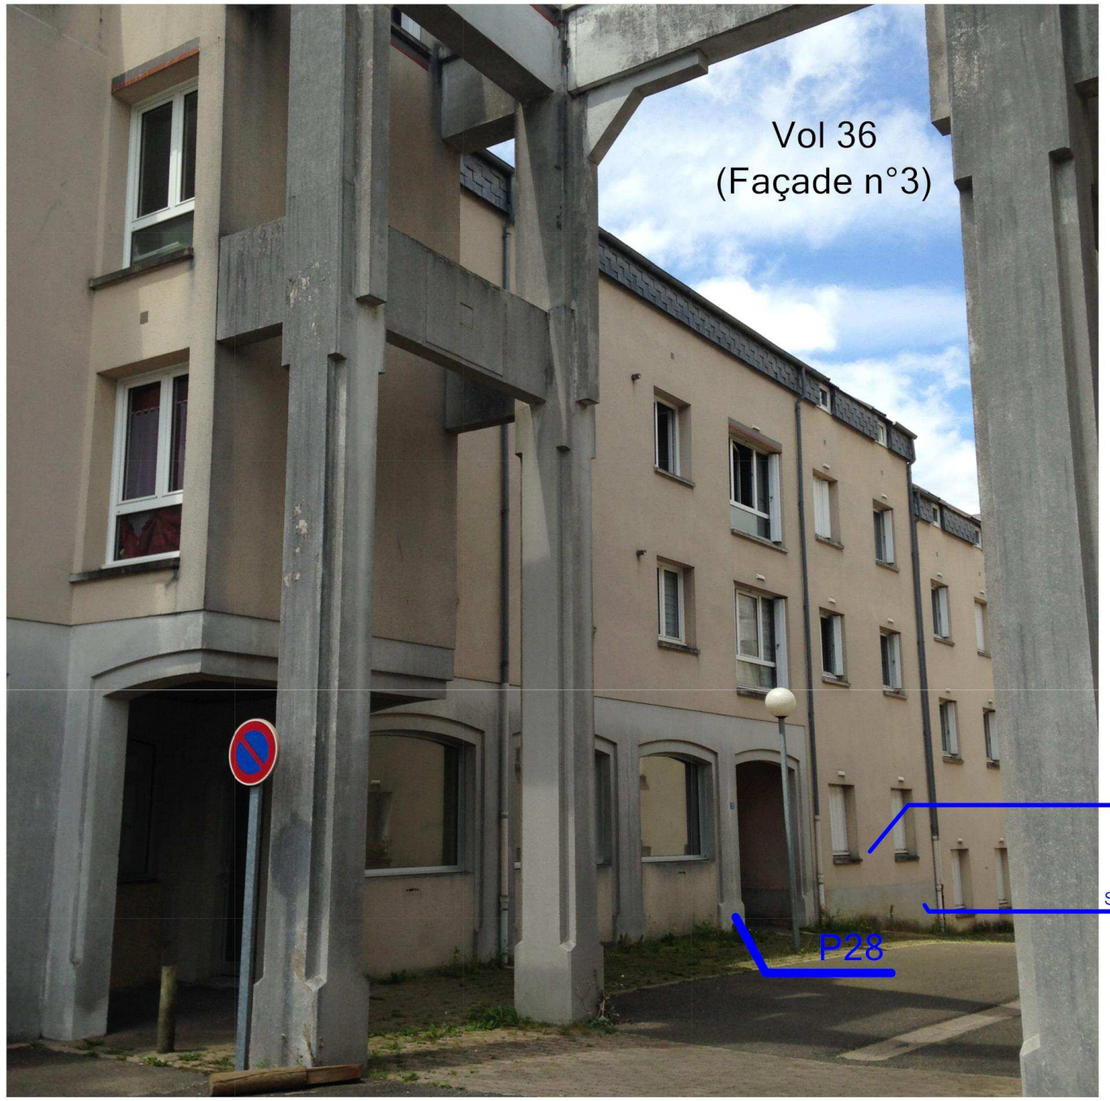

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

FAÇADE N°4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001044

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

FAÇADE N°5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001044

Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001044 n°20 - 2 (P20)	Etage 15 J-B COLBERT - Vol 25 (accès lgt R+1)	Prélevement négatif
002HD001044 n°20 - 1 (P20)	Etage 15 J-B COLBERT - Vol 25 (accès lgt R+1)	Prélevement négatif
002HD001044 n°21 - 2 (P21)	Etage 15 J-B COLBERT - Vol 29 (GT R+3)	Prélevement négatif
002HD001044 n°21 - 1 (P21)	Etage 15 J-B COLBERT - Vol 29 (GT R+3)	Prélevement négatif
002HD001044 n°22 - 1 (P22)	Etage 15 J-B COLBERT - Vol 32 (accès cave R+3)	Prélevement négatif
002HD001044 n°22 - 2 (P22)	Etage 15 J-B COLBERT - Vol 32 (accès cave R+3)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001044 n°29 - 2 (P29)	Façade n°2 - Vol 35 (Façade n°2)	Prélevement négatif
002HD001044 n°29 - 1 (P29)	Façade n°2 - Vol 35 (Façade n°2)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001044 n°28 - 1 (P28)	Façade n°3 - Vol 36 (Façade n°3)	Prélevement négatif
002HD001044 n°28 - 2 (P28)	Façade n°3 - Vol 36 (Façade n°3)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001044 n°26 - 1 (P26)	Façade n°5 - Vol 38 (Façade n°5)	Prélevement négatif
002HD001044 n°26 - 2 (P26)	Façade n°5 - Vol 38 (Façade n°5)	Prélevement négatif
002HD001044 n°27 - 1 (P27)	Façade n°5 - Vol 38 (Façade n°5)	Prélevement négatif
002HD001044 n°27 - 2 (P27)	Façade n°5 - Vol 38 (Façade n°5)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001044 n°1 - 1 (P1)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°1 - 2 (P1)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°2 - 1 (P2)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°2 - 2 (P2)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°3 - 1 (P3)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 18 (SAS ext)	Prélevement positif
002HD001044 n°3 - 2 (P3)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 18 (SAS ext)	Prélevement positif

Référence	Localisation	Action
002HD001044 n°4 - 1 (P4)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°4 - 2 (P4)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°5 - 1 (P5)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°5 - 2 (P5)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°6 - 3 (P6)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°6 - 1 (P6)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°6 - 2 (P6)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°7 - 1 (P7)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°8 - 1 (P8)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°8 - 2 (P8)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°9 - 1 (P9)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	Prélevement négatif
002HD001044 n°9 - 2 (P9)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	Prélevement négatif
002HD001044 n°10 - 2 (P10)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	Prélevement négatif
002HD001044 n°10 - 1 (P10)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	Prélevement négatif
002HD001044 n°11 - 1 (P11)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	Prélevement négatif
002HD001044 n°11 - 2 (P11)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	Prélevement négatif
002HD001044 n°12 - 1 (P12)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	Prélevement négatif
002HD001044 n°12 - 2 (P12)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	Prélevement négatif
002HD001044 n°13 - 1 (P13)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	Prélevement négatif
002HD001044 n°13 - 2 (P13)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	Prélevement négatif
002HD001044 n°14 - 1 (P14)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°14 - 2 (P14)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°15 - 2 (P15)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°15 - 1 (P15)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°16 - 1 (P16)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22 (accès cave RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°16 - 2 (P16)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22 (accès cave RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°17 - 1 (P17)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22 (accès cave RDC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001044 n°17 - 2 (P17)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22 (accès cave RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°18 - 1 (P18)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 21 (VO)	Prélevement négatif
002HD001044 n°18 - 2 (P18)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 21 (VO)	Prélevement négatif
002HD001044 n°19 - 1 (P19)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 21 (VO)	Prélevement négatif
002HD001044 n°19 - 2 (P19)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 21 (VO)	Prélevement négatif
002HD001044 n°23 - 2 (P23)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22 (accès cave RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°23 - 1 (P23)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22 (accès cave RDC)	Prélevement négatif
	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 33 (SAS ext)	I1

Référence	Localisation	Action
002HD001044 n°24 - 1 (P24)	RDC 27 A.RALU - Vol 2 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°24 - 2 (P24)	RDC 27 A.RALU - Vol 2 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°25 - 1 (P25)	RDC 27 A.RALU - Vol 2 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD001044 n°25 - 2 (P25)	RDC 27 A.RALU - Vol 2 (accès lgt RDC)	Prélevement négatif

002HD001044 n°1 - 1 (P1)

002HD001044 n°1 - 2 (P1)

002HD001044 n°2 - 1 (P2)

002HD001044 n°2 - 2 (P2)

002HD001044 n°3 - 1 (P3)

002HD001044 n°3 - 2 (P3)

002HD001044 n°4 - 1 (P4)

002HD001044 n°4 - 2 (P4)

002HD001044 n°5 - 1 (P5)

002HD001044 n°5 - 2 (P5)

002HD001044 n°6 - 3 (P6)

002HD001044 n°6 - 1 (P6)

002HD001044 n°6 - 2 (P6)

002HD001044 n°7 - 1 (P7)

002HD001044 n°8 - 1 (P8)

002HD001044 n°8 - 2 (P8)

002HD001044 n°9 - 1 (P9)

002HD001044 n°9 - 2 (P9)

002HD001044 n°10 - 2 (P10)

002HD001044 n°10 - 1 (P10)

002HD001044 n°11 - 1 (P11)

002HD001044 n°11 - 2 (P11)

002HD001044 n°12 - 1 (P12)

002HD001044 n°12 - 2 (P12)

002HD001044 n°13 - 1 (P13)

002HD001044 n°13 - 2 (P13)

002HD001044 n°14 - 1 (P14)

002HD001044 n°14 - 2 (P14)

002HD001044 n°15 - 2 (P15)

002HD001044 n°15 - 1 (P15)

002HD001044 n°16 - 1 (P16)

002HD001044 n°16 - 2 (P16)

002HD001044 n°17 - 1 (P17)

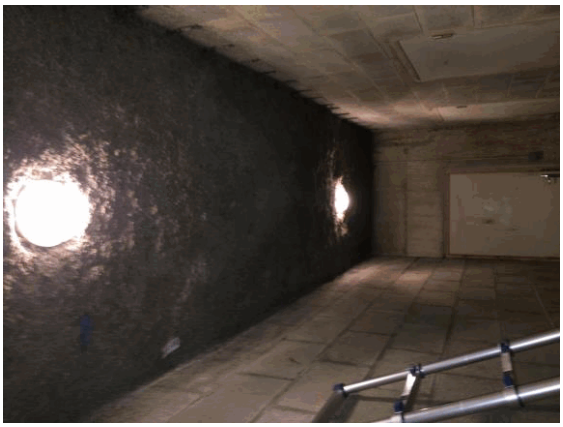

002HD001044 n°17 - 2 (P17)

002HD001044 n°18 - 1 (P18)

002HD001044 n°18 - 2 (P18)

002HD001044 n°19 - 1 (P19)

002HD001044 n°19 - 2 (P19)

002HD001044 n°20 - 2 (P20)

002HD001044 n°20 - 1 (P20)

002HD001044 n°21 - 2 (P21)

002HD001044 n°21 - 1 (P21)

002HD001044 n°22 - 1 (P22)

002HD001044 n°22 - 2 (P22)

002HD001044 n°23 - 2 (P23)

002HD001044 n°23 - 1 (P23)

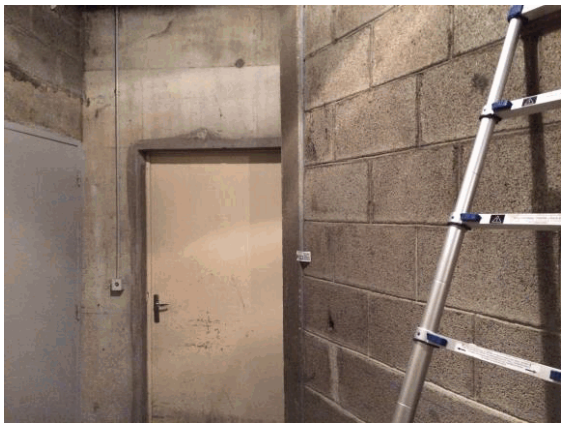

002HD001044 n°24 - 1 (P24)

002HD001044 n°24 - 2 (P24)

002HD001044 n°25 - 1 (P25)

002HD001044 n°25 - 2 (P25)

002HD001044 n°26 - 1 (P26)

002HD001044 n°26 - 2 (P26)

002HD001044 n°27 - 1 (P27)

002HD001044 n°27 - 2 (P27)

002HD001044 n°28 - 1 (P28)

002HD001044 n°28 - 2 (P28)

002HD001044 n°29 - 2 (P29)

002HD001044 n°29 - 1 (P29)

I1 - 1

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène - Grise (carreaux 30 X 30 Beige) -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + matériau gris en faible quantité non séparable - blanche (plinthes beiges) -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou gris + peinture non séparable - Semi dur grise et blanche (intérieure et extérieure) -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 18 (SAS ext)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre - Enduit platre + peinture gouttelé beige -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre - Sous face escalier -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre - Plafond dur droit (enduit gouttelé) -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Joints panneau / plaques - Plafond placoplatre -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment - Enduit débulage béton banché brut -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment - Joint d'assemblage des parpaings -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment - Enduit débulage plafond brut -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des carreaux de platres - -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment) - Grise -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + sous couche de ragréage grise non séparable + peinture non séparable - Rose -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige avec fibres + revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris - Lino marron + colle jaune -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - Rebouchage autour porte -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22 (accès cave RDC)	

P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux gris avec poussières - -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22 (accès cave RDC)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peinture - En partie basse du mur parpaings -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 21 (VO)	
P19	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Matériau compact gris + matériau gris hétérogène + peinture - Conduit extérieur et intérieur -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 21 (VO)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peintures multiples non séparable + carton non séparable - Doublage placoplatre + enduit gouttelé -	Etage 15 J-B COLBERT - Vol 25 (accès lgt R+1)	
P21	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable + carton non séparable - Plafond rampant + droit placoplatre -	Etage 15 J-B COLBERT - Vol 29 (GT R+3)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - gratté -	Etage 15 J-B COLBERT - Vol 32 (accès cave R+3)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau souple gris + matériau gris en faible quantité non séparable - -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22 (accès cave RDC)	
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable - Grise (carreaux 30 X 30 Gris) -	RDC 27 A.RALU - Vol 2 (accès lgt RDC)	
P25	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + matériau beige en faible quantité non séparable - Grise (plinthes grises) -	RDC 27 A.RALU - Vol 2 (accès lgt RDC)	
P26	Façades	Murs	Enduits projetés - Soubassement gris -	Façade n°5 - Vol 38 (Façade n°5)	
P27	Façades	Murs	Enduits projetés - beige gratté (enduit principal) -	Façade n°5 - Vol 38 (Façade n°5)	
P28	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène + peinture - Gris sur poteaux et arcade -	Façade n°3 - Vol 36 (Façade n°3)	
P29	Façades	Menuiseries	Matériau souple gris + peinture en faible quantité non séparable - Reprise d'étanchéité des menuiseries des locaux commerciaux au RDC -	Façade n°2 - Vol 35 (Façade n°2)	
P30	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec couche en papier et poussières - Laine de verre + pare vapeur -	Combles 27 A.RALU - Vol 40 (combles VMC)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46598 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46598
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_fcd27021-a07f-4a49-9bcc-a0ff847dc15b

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 16 (accès lgt RDC)

Description ITGA	Colle grise en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise en vrac hétérogène	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46599 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46599
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_11e02c47-338f-44be-9d18-1dcc315c4edf

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 16 (accès lgt RDC)

Description ITGA	Colle blanche / Matériau gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche + matériau gris en faible quantité non séparable	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46600 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46600
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_6843df9c-444c-4b51-b813-b0c8df1f2f3d

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044003 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté / Vol 18 (SAS ext)

Description ITGA	Matériau mou gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau mou gris + peinture non séparable	META le 25/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46601 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46601
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_8ce3caaa-c304-4cb9-8195-329bcdcf2b5d

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044004 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie / Vol 16 (accès lgt RDC)

Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir avec poussières	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46602 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46602
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_a085ffc4-6f54-4b46-ac3b-56d046351eaa

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 16 (accès lgt RDC)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46603 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46603
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_790aa434-43bd-4c86-bda2-7ad6c1528c79

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 16 (accès lgt RDC)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46604 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46604
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_f6556179-23e9-4e15-b871-b42c1d47cfca

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 16 (accès lgt RDC)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau beige en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46605 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46605
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_a2487d2b-0f40-4d7a-b247-71d41a7e267f

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044008 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 16 (accès lgt RDC)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Peintures multiples / Carton / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peintures multiples non séparable + carton non séparable + colle polymère jaune non séparable	META le 26/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46606 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46606
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_c9ba27dc-e589-4b3d-8dd2-3606d8b616f1

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 20 (GT)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peintures multiples	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46607 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46607
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_5c2972bc-0842-4dc8-b874-0f89b4f1b7d8

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 20 (GT)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46608 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46608
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_27469ea8-f927-4500-ae99-7e7820ed34ff

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 20 (GT)

Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau beige en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46609 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46609
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_13ace378-0914-43c9-b005-6baa47e56f0b

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint d'assemblage des carreaux de platres / Vol 20 (GT)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc + peinture avec poussières non séparable	META le 26/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46610 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46610
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_036b9e97-7e4b-4eb4-9b90-50e29b08d0f2

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 20 (GT)

Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META le 26/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46612 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46612
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_3558e3b7-5489-4e51-9291-5d856147d94d

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 16 (accès lgt RDC)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Sous couche de ragréage grise / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune + sous couche de ragréage grise non séparable + peinture non séparable	META le 26/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46613 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46613
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_50735451-bb69-4b19-9484-13d778bf219d

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 16 (accès lgt RDC)

Description ITGA	Revêtement souple beige avec fibres / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple beige avec fibres + revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	META le 26/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46614 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46614
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_2723ee7f-3087-4797-add4-b5833e3815e5

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 22 (accès cave RDC)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène	META le 26/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46615 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46615
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_6502adf3-a97d-47fc-b4b0-2427ab80a2cd

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 22 (accès cave RDC)

Description ITGA	Matériau cotonneux gris avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau cotonneux gris avec poussières	MOLP le 23/07/2016	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	3

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46616 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46616
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_22c35ec1-0d7b-48e0-b5d1-59884f5dcc4b

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 21 (VO)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peinture	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46617 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46617
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_8521be96-7335-4186-b57a-7c8d1b090
30d

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044019 / Conduits, canalisations et équipements / Vide ordure / Béton + ciment / Vol 21 (VO)

Description ITGA	Matériau compact gris / Matériau gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris + matériau gris hétérogène + peinture	META le 26/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46618 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46618
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_d4c88d0b-dcf7-411f-a967-345f6416b1b9

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044020 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 25 (accès lgt R+1)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Peintures multiples / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46619 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46619
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_bebfd2cb-b200-42ba-b989-b1434de4dc2b

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044021 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 29 (GT R+3)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable + carton non séparable	META le 26/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46620 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46620
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_8d5367c4-45a8-4ecf-bcda-a2a435196a19

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 32 (accès cave R+3)

Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46621 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46621
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_1b2e4c09-53ef-4f33-86a0-f0dc350962
3e

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint étanchéité semi dur violet / Vol 22 (accès cave RDC)

Description ITGA	Matériau souple gris / Matériau gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple gris + matériau gris en faible quantité non séparable	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46622 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46622
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_6ee5e7f6-61e9-4a15-afae-82666ce6c4
75

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (accès lgt RDC)

Description ITGA	Colle grise / Matériau blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46623 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46623
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_3a6b6cee-8670-4580-90cb-99a9ffe33de6

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044025 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 2 (accès lgt RDC)

Description ITGA	Colle blanche / Matériau beige en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche + matériau beige en faible quantité non séparable	META le 26/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46624 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46624
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_1c7f6dfc-252f-4a2b-b030-5c6b0074cb44

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044026 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 38 (Façade n°5)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 26/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46625 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46625
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_41dfc305-2fee-4391-bdb2-cf73c47bc96
1

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044027 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 38 (Façade n°5)

Description ITGA	Enduit plâtreux beige / Peinture / Matériau gris en faible quantité hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux beige + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46626 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46626
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_ac7a5736-8c11-4c16-a6ea-d1c6d5de8c7f

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044028 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 36 (Façade n°3)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peinture	META le 26/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46627 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46627
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_fd674c8e-d762-4443-bc35-ca51f5756157

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044029 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté / Vol 35 (Façade n°2)

Description ITGA	Matériau souple gris / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple gris + peinture en faible quantité non séparable	META le 22/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46628 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46628
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_03de1acc-cb11-48db-b70e-acf0c94be69f

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044030 / Toiture et étanchéité / Elément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 40 (combles VMC)

Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec couche en papier et poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux jaune avec couche en papier et poussières	MOLP le 22/07/2016	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
