Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RUE BIGNON/NORMANDIE
CP - Ville :	53410 GORRON
Référence client :	_0037700002_
Date du repérage :	27/03/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Présence d'amiante	Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs**	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0037700002_	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100
Date de repérage	27/03/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2

Délivré le : 03/04/2015

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 20/04/2017

A Riorges, le 20/04/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
PC RDC - Vol 1 (SAS ext)	PC RDC - Vol 2 (local vélo)
PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	PC RDC - Vol 4 (HALL)
PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Etages - Vol 6 (PC R+1)
Etages - Vol 7 (PC R+2)	Etages - Vol 8 (PC R+3)
Combles - Vol 9 (Combles)	Plan masse - Vol 10 (Plan masse)
Plan masse - Vol 11 (Toiture)	Façade avant - Vol 12 (Façade avant)
Façade droite - Vol 13 (Façade droite)	Façade arrière - Vol 14 (Façade arrière)
Façade gauche - Vol 15 (Façade gauche)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Façades	PC RDC	Vol 1 (SAS ext)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC RDC	Vol 1 (SAS ext) - Vol 2 (local vélo) - Vol 3 (local poubelle) - Vol 4 (HALL) - Vol 5 (PC RDC)	
Revêtement de sol	PC RDC	Vol 1 (SAS ext) - Vol 2 (local vélo) - Vol 3 (local poubelle) - Vol 5 (PC RDC)	
Plafond et faux-plafonds	PC RDC	Vol 2 (local vélo) - Vol 3 (local poubelle) - Vol 5 (PC RDC)	
Conduits, canalisations et équipements	PC RDC	Vol 5 (PC RDC)	
Conduits, canalisations et équipements	Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3)	
Parois verticales intérieures et enduits	Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3)	
Plafond et faux-plafonds	Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3)	
Revêtement de sol	Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3)	
Toiture et étanchéité	Combles	Vol 9 (Combles)	
Revêtement de sol	Plan masse	Vol 10 (Plan masse)	
Voies et réseaux divers	Plan masse	Vol 10 (Plan masse)	
Toiture et étanchéité	Plan masse	Vol 11 (Toiture)	
Façades	Façade avant	Vol 12 (Façade avant)	

Façades	Façade droite	Vol 13 (Façade droite)	
Façades	Façade arrière	Vol 14 (Façade arrière)	
Façades	Façade gauche	Vol 15 (Façade gauche)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P	Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 1 (SAS ext)	Lambris bois	Impossible de voir les matériaux présents sous le lambri sans dépose de celui-ci .
Vol 4 (HALL)	Lambris bois	Impossible de voir les matériaux présents sous le lambri sans dépose de celui-ci .
Vol 8 (PC R+3)		Aucun accès en partie haute de la cage escalier

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 4 (HALL)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou rouge avec poussières	P4
Vol 5 (PC RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	P16
Vol 6 (PC R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	P16
Vol 7 (PC R+2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	P16
Vol 8 (PC R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	P16
Vol 5 (PC RDC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable	P17
Vol 6 (PC R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable	P17
Vol 7 (PC R+2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable	P17
Vol 8 (PC R+3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable	P17

Vol 5 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	P20
Vol 6 (PC R+1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	P20
Vol 7 (PC R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	P20
Vol 8 (PC R+3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	P20

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.
Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :
Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.
Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.
Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.
Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.
Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.
Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées…)
Les matériaux présents sous la laine de verre dans les combles (impossible à voir sans retirer la laine de verre)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vide sanitaire - Vide sanitaire	Risque sanitaire ou physique avéré	Impossible d'ouvrir la trappe.

Note : Des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 5 (PC RDC)	Conduit eau	Calorifugeage	P21	Réalisation d'un prélevement	Mousse avec tresse platreuse	002HD001426 n°21 - 1 - 002HD001426 n°21 - 2	P21	Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3)	Conduit eau	Calorifugeage	S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Mousse avec tresse platreuse	002HD001426 n°21 - 1 - 002HD001426 n°21 - 2	P21	Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 1 (SAS ext)	Murs	Enduits projetés beiges	P1	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°1 - 1 - 002HD001426 n°1 - 2	P1	Enduit beige en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 1 (SAS ext)	Murs	Enduits projetés beiges	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001426 n°1 - 1 - 002HD001426 n°1 - 2	P1	Enduit beige en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 12 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés beiges	S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001426 n°1 - 1 - 002HD001426 n°1 - 2	P1	Enduit beige en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 13 (Façade droite)	Murs	Enduits projetés beiges	S50	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001426 n°1 - 1 - 002HD001426 n°1 - 2	P1	Enduit beige en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 14 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés beiges	S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001426 n°1 - 1 - 002HD001426 n°1 - 2	P1	Enduit beige en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade gauche	Vol 15 (Façade gauche)	Murs	Enduits projetés beiges	S52	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001426 n°1 - 1 - 002HD001426 n°1 - 2	P1	Enduit beige en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 13 (Façade droite)	Murs	Enduits projetés rose	P26	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°26 - 1 - 002HD001426 n°26 - 2	P26	Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 13 (Façade droite)	Murs	Enduits projetés rose	P26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002HD001426 n°26 - 1 - 002HD001426 n°26 - 2	P26	Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 12 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés rose	S46	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002HD001426 n°26 - 1 - 002HD001426 n°26 - 2	P26	Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 14 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés rose	S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002HD001426 n°26 - 1 - 002HD001426 n°26 - 2	P26	Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade gauche	Vol 15 (Façade gauche)	Murs	Enduits projetés rose	S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002HD001426 n°26 - 1 - 002HD001426 n°26 - 2	P26	Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 13 (Façade droite)	Murs	Enduit ciment	P27	Réalisation d'un prélevement	soubassement	002HD001426 n°27 - 1	P27	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 12 (Façade avant)	Murs	Enduit ciment	S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	soubassement	002HD001426 n°27 - 1	P27	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 14 (Façade arrière)	Murs	Enduit ciment	S44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	soubassement	002HD001426 n°27 - 1	P27	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade gauche	Vol 15 (Façade gauche)	Murs	Enduit ciment	S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	soubassement	002HD001426 n°27 - 1	P27	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 13 (Façade droite)	Murs	Enduits projetés balcons	P28	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°28 - 1 - 002HD001426 n°28 - 2	P28	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 13 (Façade droite)	Murs	Enduits projetés balcons	S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28		002HD001426 n°28 - 1 - 002HD001426 n°28 - 2	P28	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade gauche	Vol 15 (Façade gauche)	Murs	Enduits projetés balcons	S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28		002HD001426 n°28 - 1 - 002HD001426 n°28 - 2	P28	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 1 (SAS ext)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté noires	P2	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°2 - 1 - 002HD001426 n°2 - 2	P2	Matériau souple noir avec poussières + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 1 (SAS ext)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté noires	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001426 n°2 - 1 - 002HD001426 n°2 - 2	P2	Matériau souple noir avec poussières + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 4 (HALL)	Menuiseries	Mastic vitrier mou rouge	P4	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°4 - 1 - 002HD001426 n°4 - 2	P4	Matériau mou rouge avec poussières	Positif	Présence sur analyse
PC RDC	Vol 4 (HALL)	Menuiseries	Mastic vitrier mou rouge	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD001426 n°4 - 1 - 002HD001426 n°4 - 2	P4	Matériau mou rouge avec poussières	Positif	Présence sur analyse
PC RDC	Vol 4 (HALL)	Murs et cloisons	Enduit gouttelé blanc	P5	Réalisation d'un prélevement	Murs porteurs	002HD001426 n°5 - 1 - 002HD001426 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 4 (HALL) - Vol 5 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit gouttelé blanc	P5 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Murs porteurs	002HD001426 n°5 - 1 - 002HD001426 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 3 (local poubelle)	Murs et cloisons	Joint de scellement des parpaing	P6	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°6 - 1 - 002HD001426 n°6 - 2	P6	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 2 (local vélo)	Murs et cloisons	Joint de scellement des parpaing	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001426 n°6 - 1 - 002HD001426 n°6 - 2	P6	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 3 (local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélevement	Béton banché brut	002HD001426 n°8 - 1 - 002HD001426 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 3 (local poubelle) - Vol 2 (local vélo) - Vol 5 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1 - S6 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Béton banché brut	002HD001426 n°8 - 1 - 002HD001426 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Béton banché brut	002HD001426 n°8 - 1 - 002HD001426 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 3 (local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P9	Réalisation d'un prélevement	Gratté	002HD001426 n°9 - 1 - 002HD001426 n°9 - 2	P9	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 3 (local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage autour menuiseries	P10	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°10 - 1 - 002HD001426 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 3 (local poubelle) - Vol 2 (local vélo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage autour menuiseries	P10 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD001426 n°10 - 1 - 002HD001426 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 3 (local poubelle)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté souple grise	P11	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°11 - 1 - 002HD001426 n°11 - 2	P11	Matériau souple blanc avec poussières + matériau souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 3 (local poubelle)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	P12	Réalisation d'un prélevement	Joints souples noirs	002HD001426 n°12 - 1 - 002HD001426 n°12 - 2	P12	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 3 (local poubelle) - Vol 2 (local vélo)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	P12 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Joints souples noirs	002HD001426 n°12 - 1 - 002HD001426 n°12 - 2	P12	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 5 (PC RDC)	Murs et cloisons	Joint de scellement des carreaux de platre	P14	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°14 - 1 - 002HD001426 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (PC RDC)	Murs et cloisons	Joint de scellement des carreaux de platre	P14 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD001426 n°14 - 1 - 002HD001426 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 7 (PC R+2)	Murs et cloisons	Joint de scellement des carreaux de platre	S32 - S33 - S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD001426 n°14 - 1 - 002HD001426 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (PC RDC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P15	Réalisation d'un prélevement	doublage plaque plâtre	002HD001426 n°15 - 1 - 002HD001426 n°15 - 2	P15	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 8 (PC R+3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	doublage plaque plâtre	002HD001426 n°15 - 1 - 002HD001426 n°15 - 2	P15	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre gouttelé avec peinture blanche	P16	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°16 - 1 - 002HD001426 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
PC RDC	Vol 5 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre gouttelé avec peinture blanche	P16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001426 n°16 - 1 - 002HD001426 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 6 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre gouttelé avec peinture blanche	S27 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001426 n°16 - 1 - 002HD001426 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 7 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre gouttelé avec peinture blanche	S28 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001426 n°16 - 1 - 002HD001426 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 8 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre gouttelé avec peinture blanche	S29 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001426 n°16 - 1 - 002HD001426 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 8 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre gouttelé avec peinture blanche	S30 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001426 n°16 - 1 - 002HD001426 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 8 (PC R+3)	Murs et cloisons		I2							Aucun accès en partie haute de la cage escalier

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 1 (SAS ext)	Faux plafonds	Lambris bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous le lambri sans dépose de celui-ci .
PC RDC	Vol 4 (HALL)	Faux plafonds	Lambris bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous le lambri sans dépose de celui-ci .
PC RDC	Vol 3 (local poubelle)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P7	Réalisation d'un prélevement	Plafond plaque plâtre	002HD001426 n°7 - 1 - 002HD001426 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 2 (local vélo)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond plaque plâtre	002HD001426 n°7 - 1 - 002HD001426 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (PC RDC)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P13	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°13 - 1 - 002HD001426 n°13 - 2	P13	Matériau fibreux gris en vrac + peinture blanche	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre gouttelé	P20	Réalisation d'un prélevement	Sous face escalier + palier	002HD001426 n°20 - 1 - 002HD001426 n°20 - 2	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 6 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre gouttelé	S14 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Sous face escalier + palier	002HD001426 n°20 - 1 - 002HD001426 n°20 - 2	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 7 (PC R+2)	Plafonds	Enduit plâtre gouttelé	S15 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Sous face escalier + palier	002HD001426 n°20 - 1 - 002HD001426 n°20 - 2	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 8 (PC R+3)	Plafonds	Enduit plâtre gouttelé	S16 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Sous face escalier + palier	002HD001426 n°20 - 1 - 002HD001426 n°20 - 2	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 8 (PC R+3)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P22	Réalisation d'un prélevement	Plafond plaque plâtre	002HD001426 n°22 - 1	P22	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 1 (SAS ext)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P3	Réalisation d'un prélevement	Avec motifs et lissée	002HD001426 n°3 - 1 - 002HD001426 n°3 - 2	P3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 2 (local vélo) - Vol 3 (local poubelle)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Avec motifs et lissée	002HD001426 n°3 - 1 - 002HD001426 n°3 - 2	P3	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 5 (PC RDC)	Revêtement de sol	Lés plastiques beiges avec colle jaune	P17	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°17 - 1	P17	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+1)	Revêtement de sol	Lés plastiques beiges avec colle jaune	S24 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001426 n°17 - 1	P17	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 7 (PC R+2)	Revêtement de sol	Lés plastiques beiges avec colle jaune	S25 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001426 n°17 - 1	P17	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 8 (PC R+3)	Revêtement de sol	Lés plastiques beiges avec colle jaune	S26 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001426 n°17 - 1	P17	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 5 (PC RDC)	Revêtement de sol	Ragréage	P18	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°18 - 1 - 002HD001426 n°18 - 2	P18	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3)	Revêtement de sol	Ragréage	S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD001426 n°18 - 1 - 002HD001426 n°18 - 2	P18	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P19	Réalisation d'un prélevement	Gaine technique	002HD001426 n°19 - 1 - 002HD001426 n°19 - 2	P19	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Gaine technique	002HD001426 n°19 - 1 - 002HD001426 n°19 - 2	P19	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Gaine technique	002HD001426 n°19 - 1 - 002HD001426 n°19 - 2	P19	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 10 (Plan masse)	Revêtement de sol	Joint entre les bordures	P23	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°23 - 1	P23	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 10 (Plan masse)	Revêtement de sol	Joint entre les bordures	P23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD001426 n°23 - 1	P23	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 9 (Combles)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P29	Réalisation d'un prélevement	Laine avec pare vapeur	002HD001426 n°25 - 1	P25	Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau fibreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 11 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S41			S41 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 10 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P24	Réalisation d'un prélevement		002HD001426 n°24 - 1	P24	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 10 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002HD001426 n°24 - 1	P24	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	PC RDC	PC RDC - Plan de repérage - Actions menées
	PC RDC	PC RDC - Plan de prélèvements
	PC RDC	PC RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	PC RDC	PC RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	PC RDC	PC RDC - MPCA Plafond et faux-plafonds
	PC RDC	PC RDC - MPCA Revêtement de sol
	Etages	Etages - Plan de repérage - Actions menées
	Etages	Etages - Plan de prélèvements
	Etages	Etages - MPCA Toutes catégories confondues
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade droite	Façade droite - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade gauche	Façade gauche - Plan de repérage - Actions menées

PC RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001426

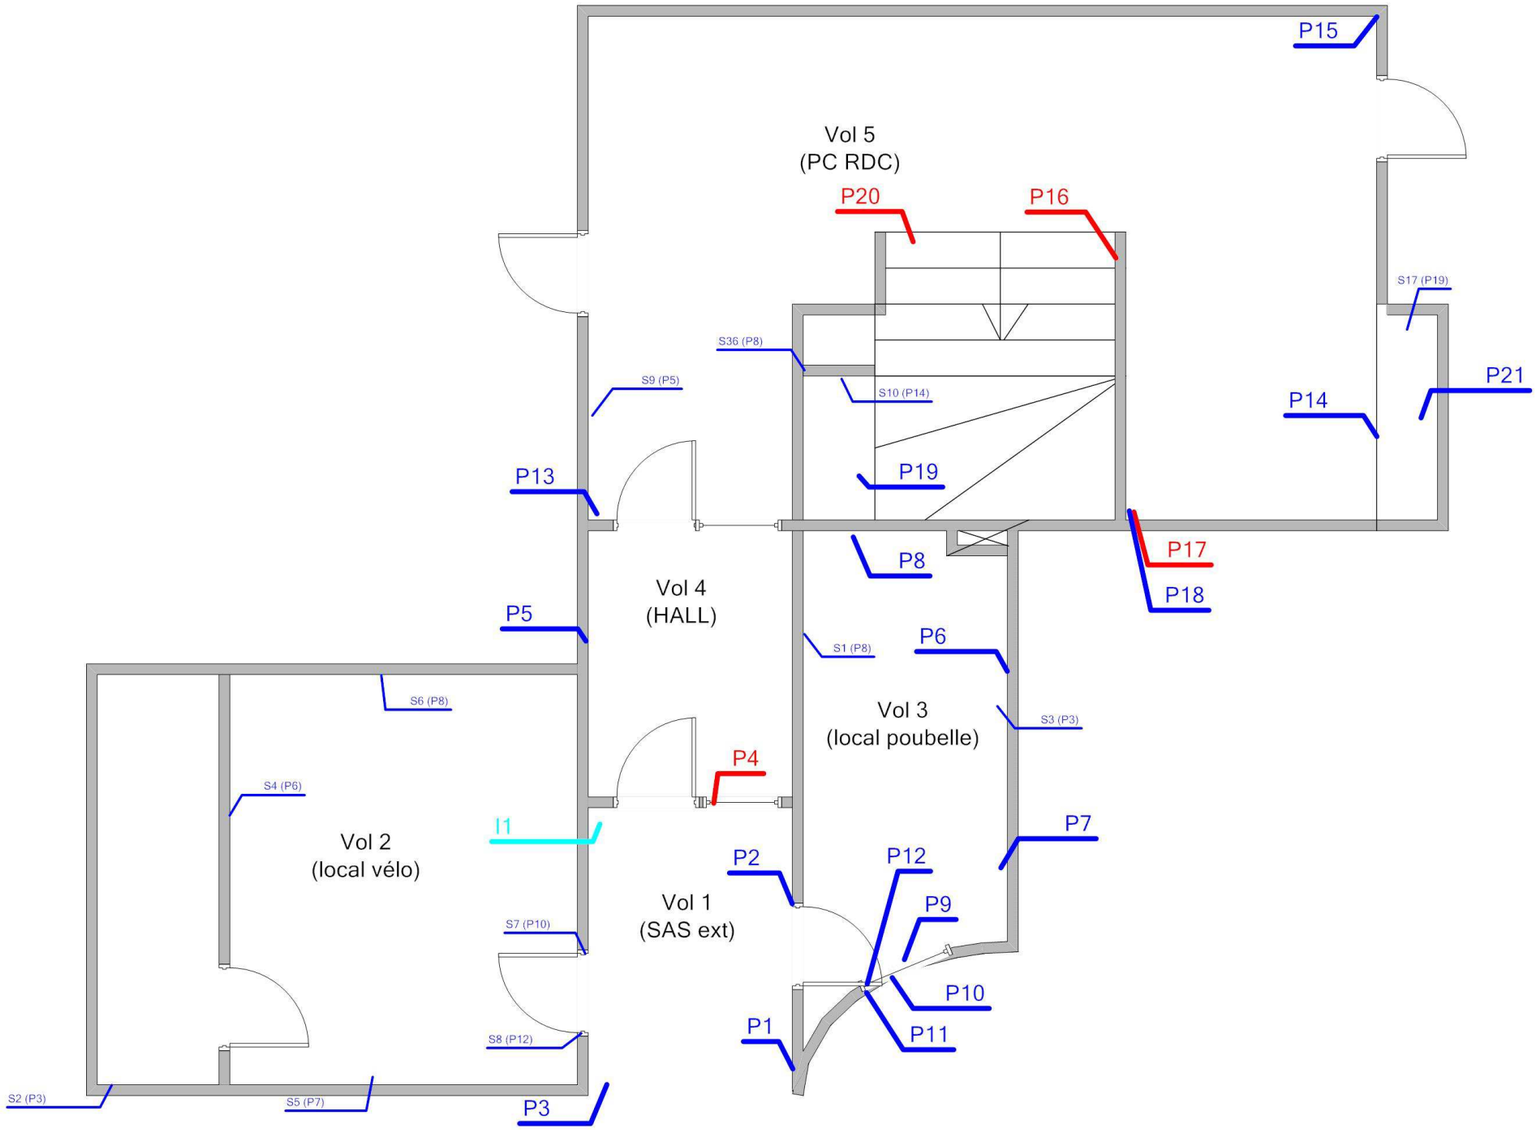

Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

PC RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001426

Légende

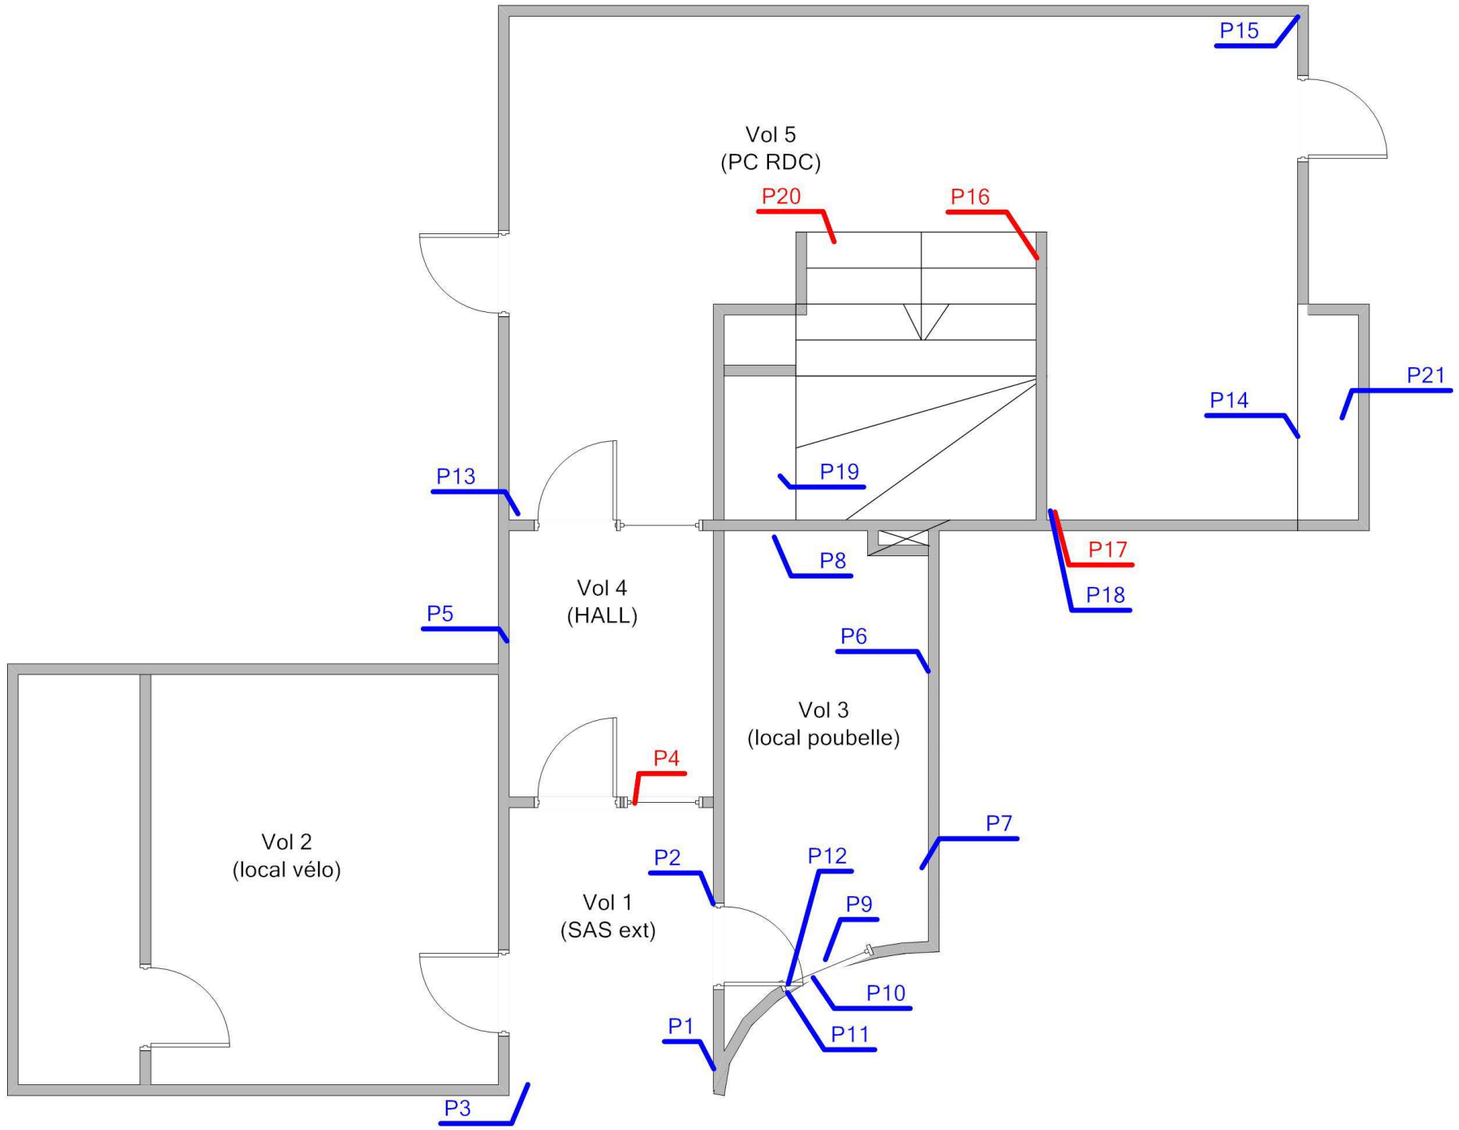

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001426

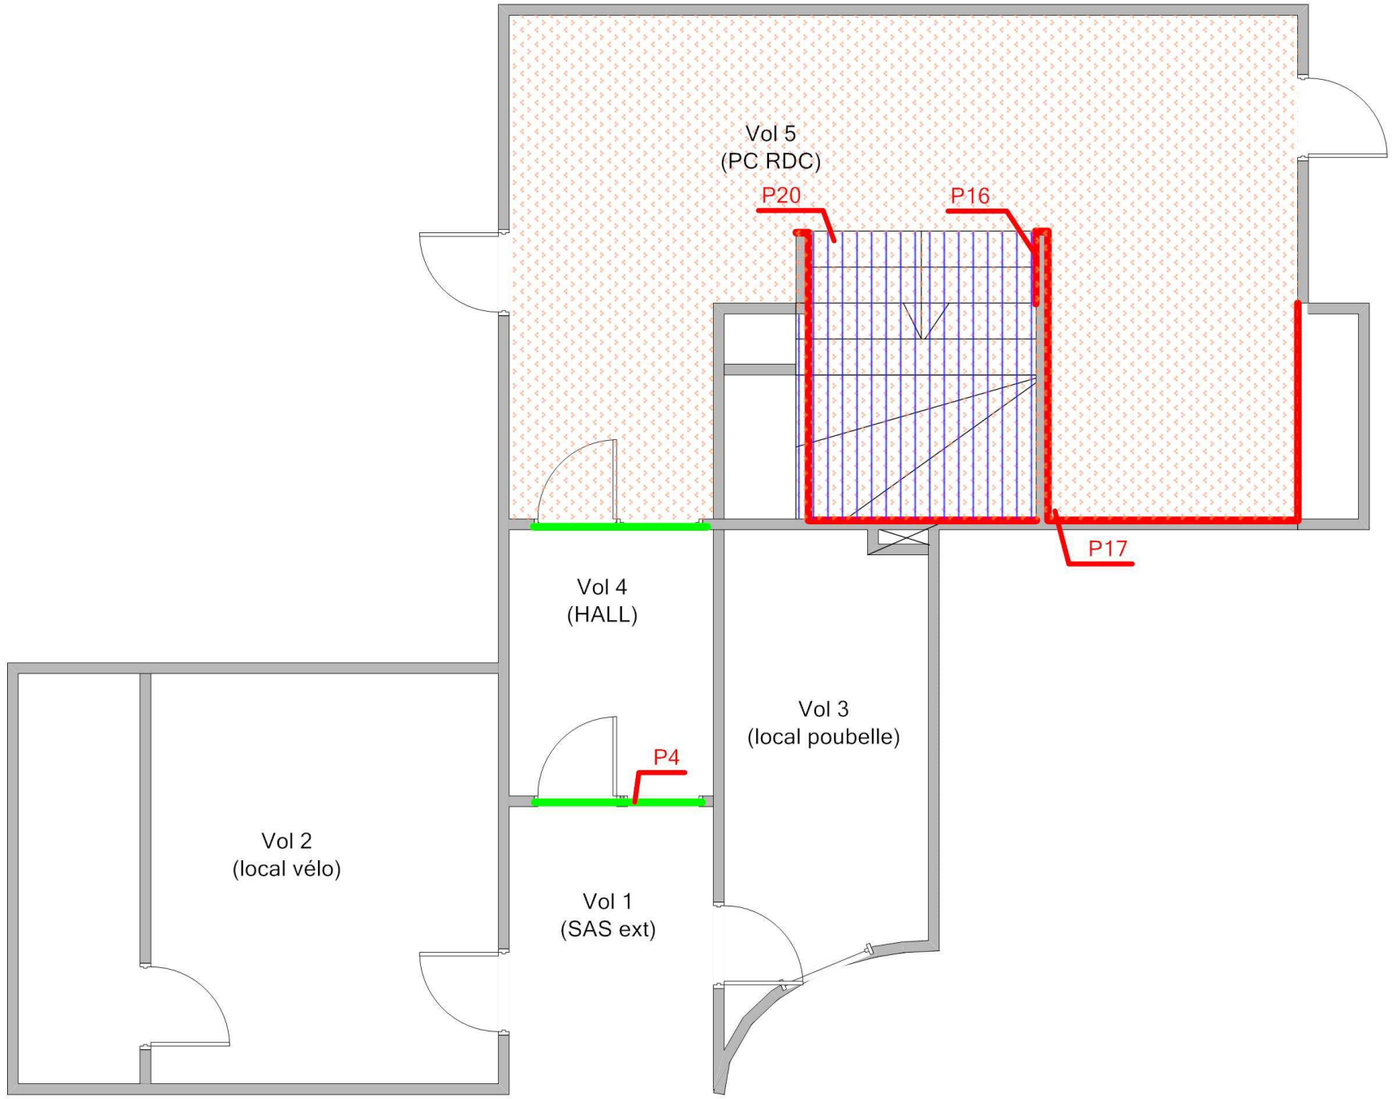

Légende

	P20 : Enduit plâtre gouttelé
	P16 : Enduit plâtre gouttelé avec peinture blanche (Murs porteurs)
	P4 : Mastic vitrier mou rouge
	P17 : Lés plastiques beiges avec colle jaune

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001426

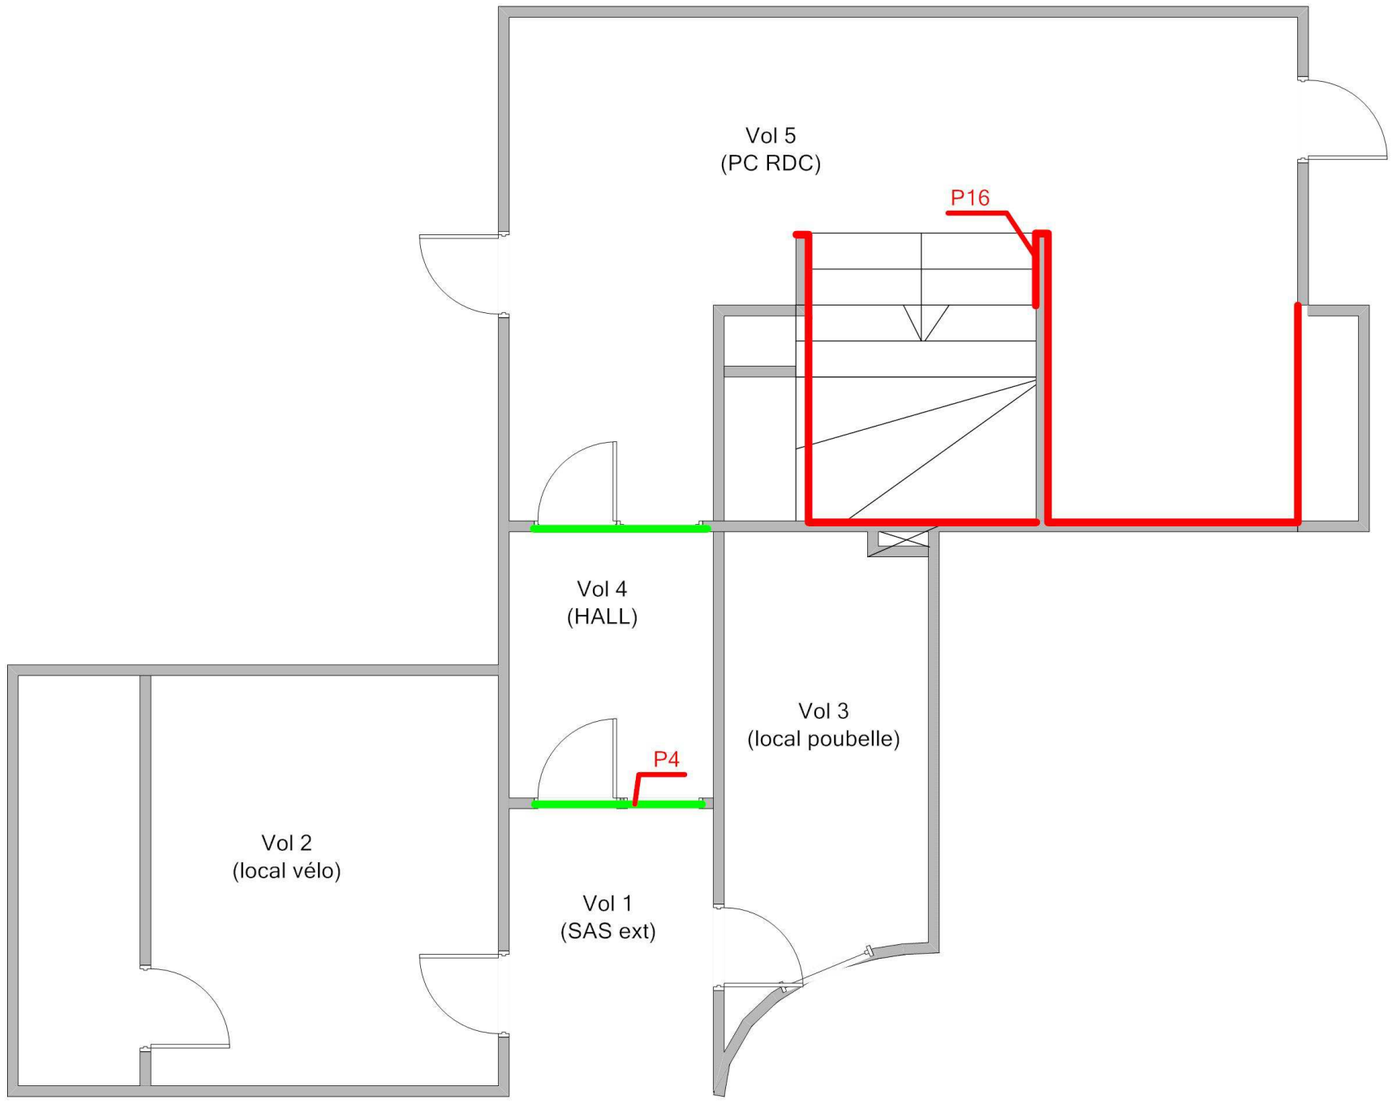

Légende	
	P16 : Enduit plâtre gouttelé avec peinture blanche (Murs porteurs)
	P4 : Mastic vitrier mou rouge

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001426

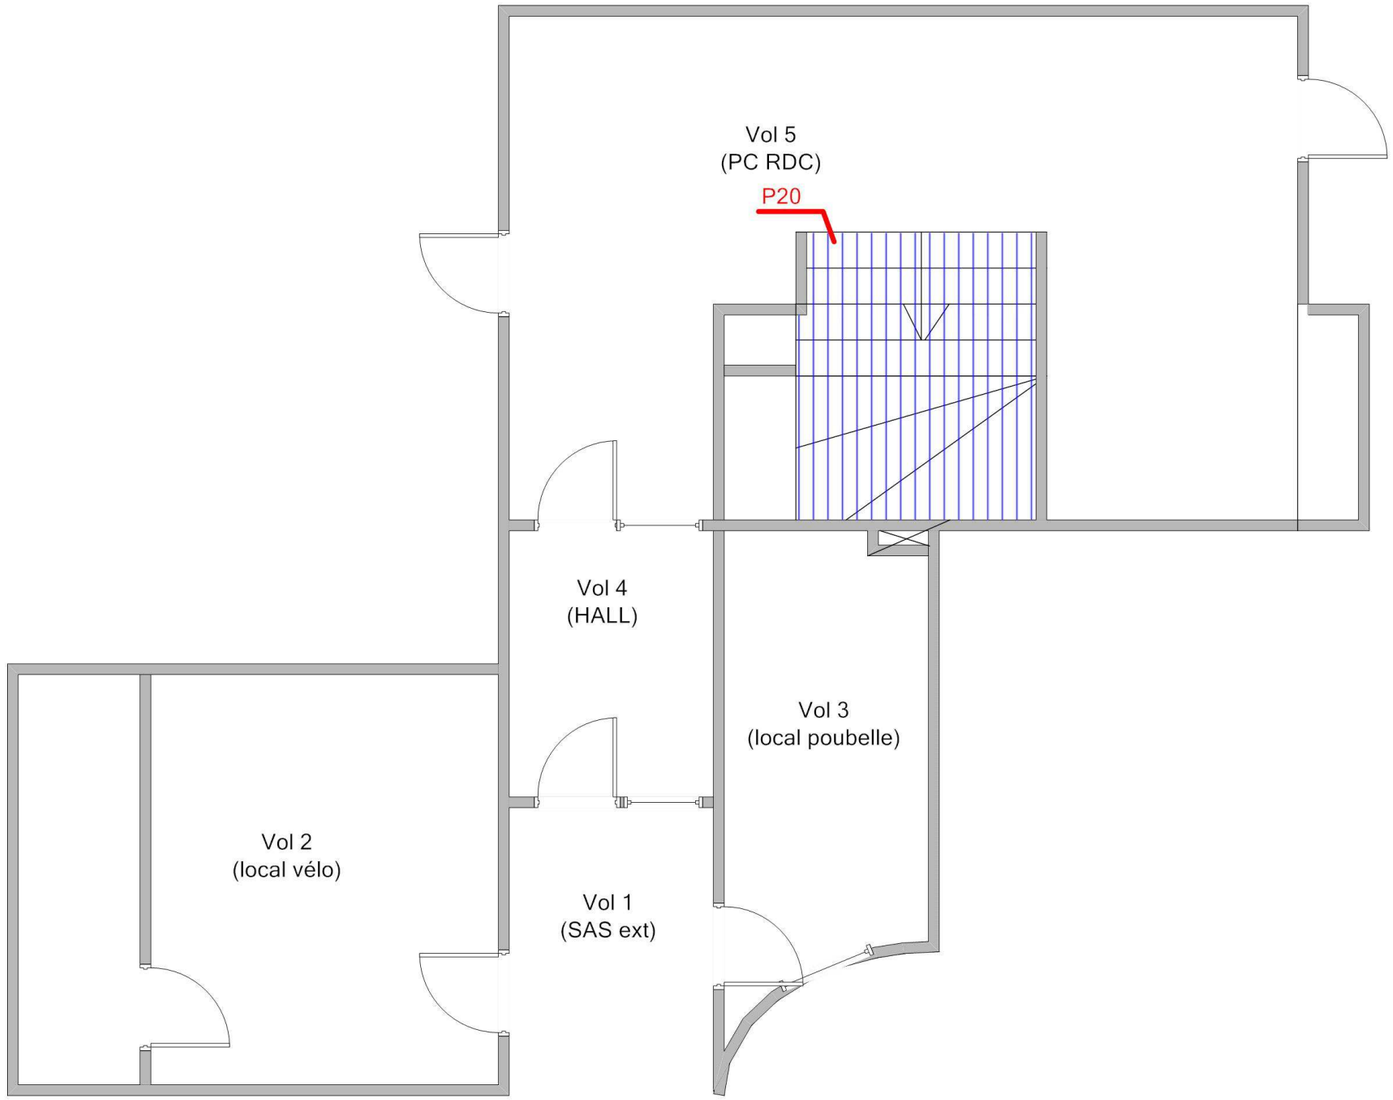

Légende	
	P20 : Enduit plâtre gouttelé (plafond)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001426

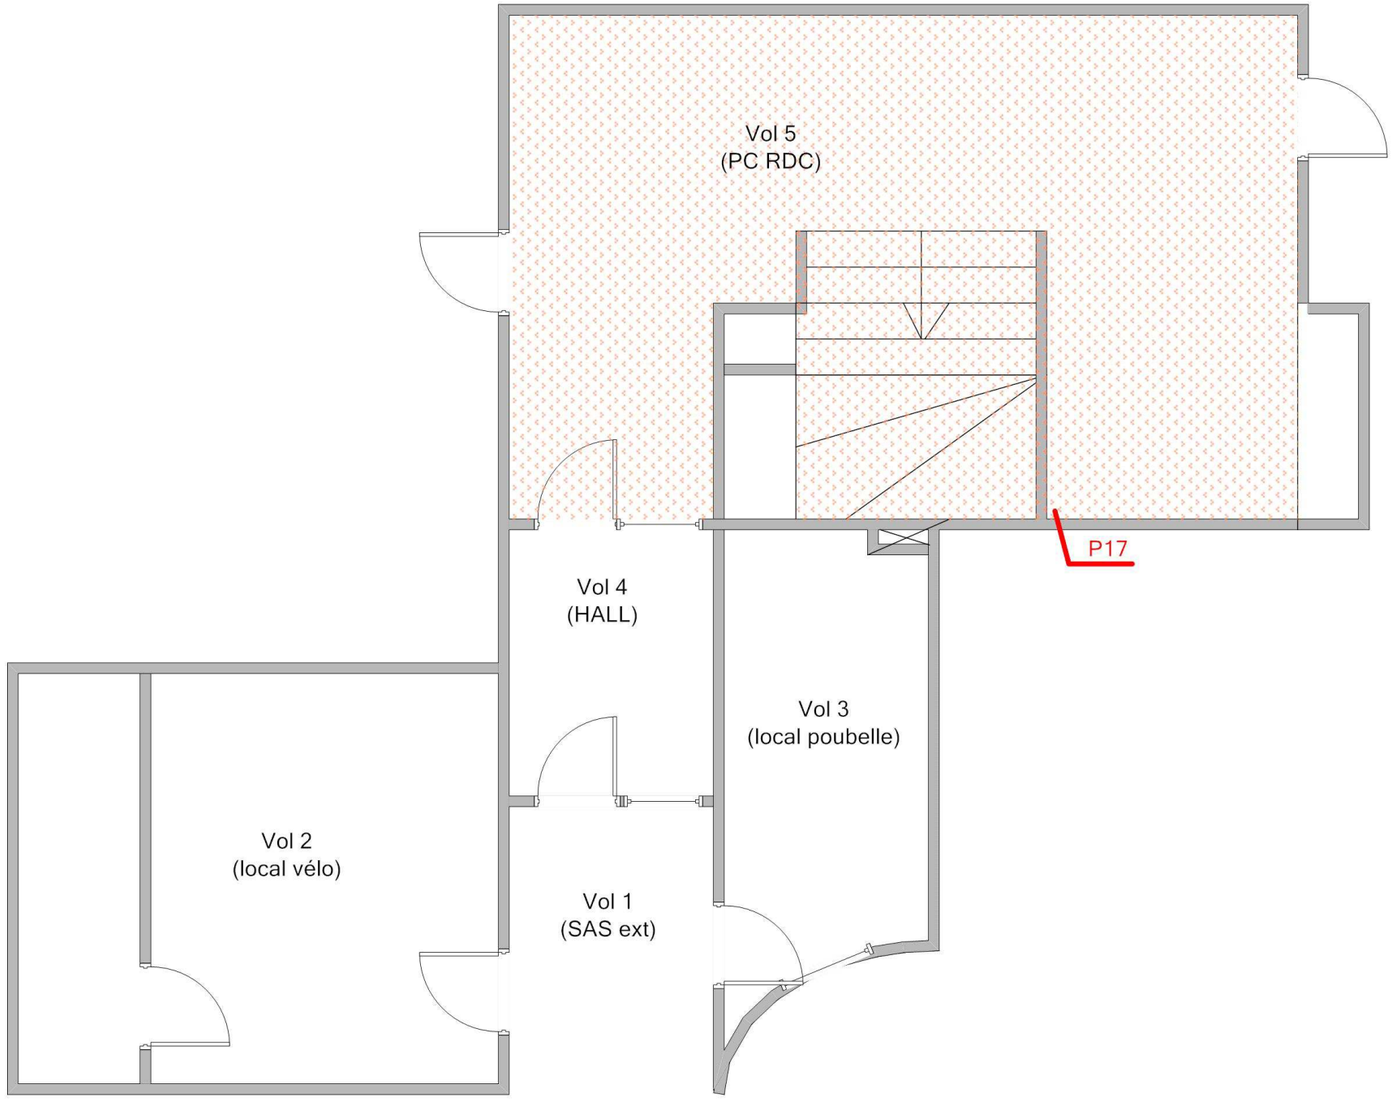

Légende	
	P17 : Lés plastiques beiges avec colle jaune

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001426

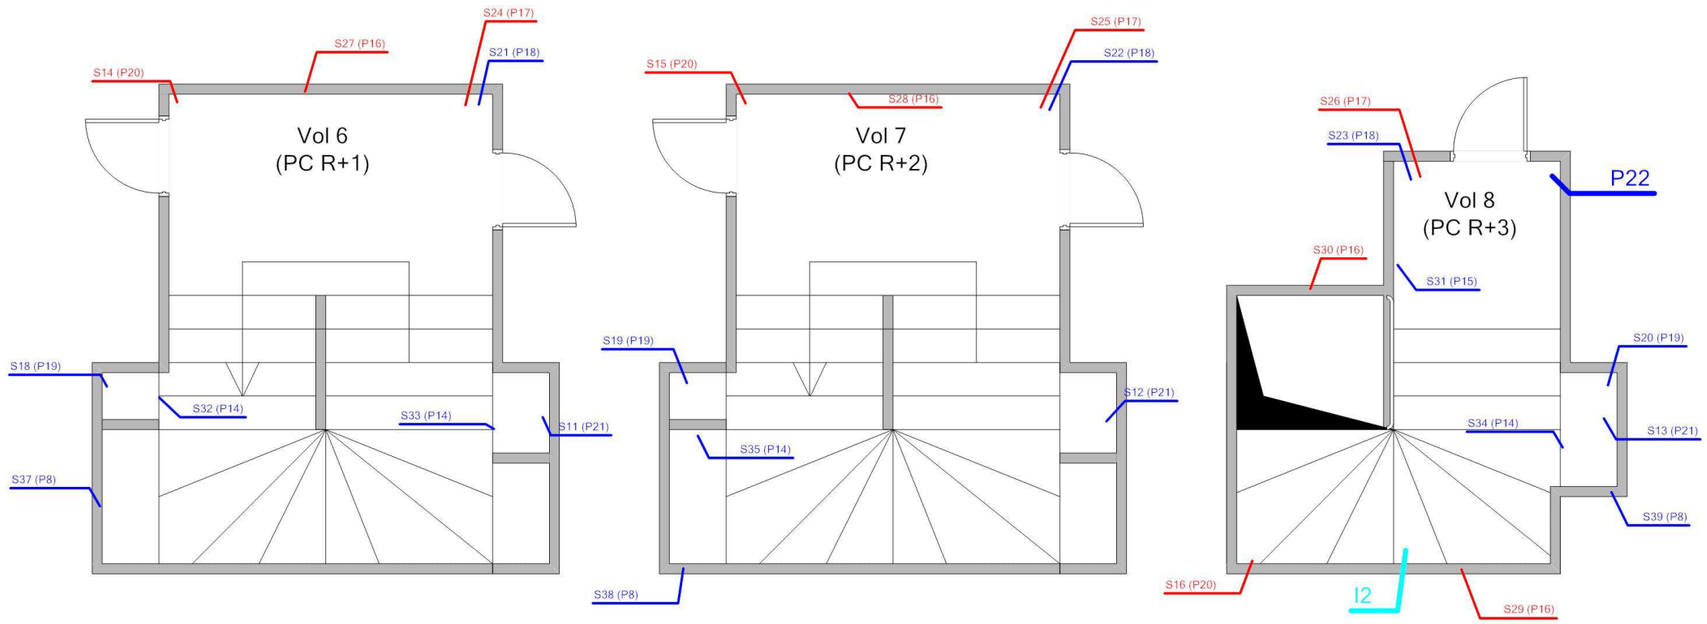

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

ETAGES - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001426

Légende

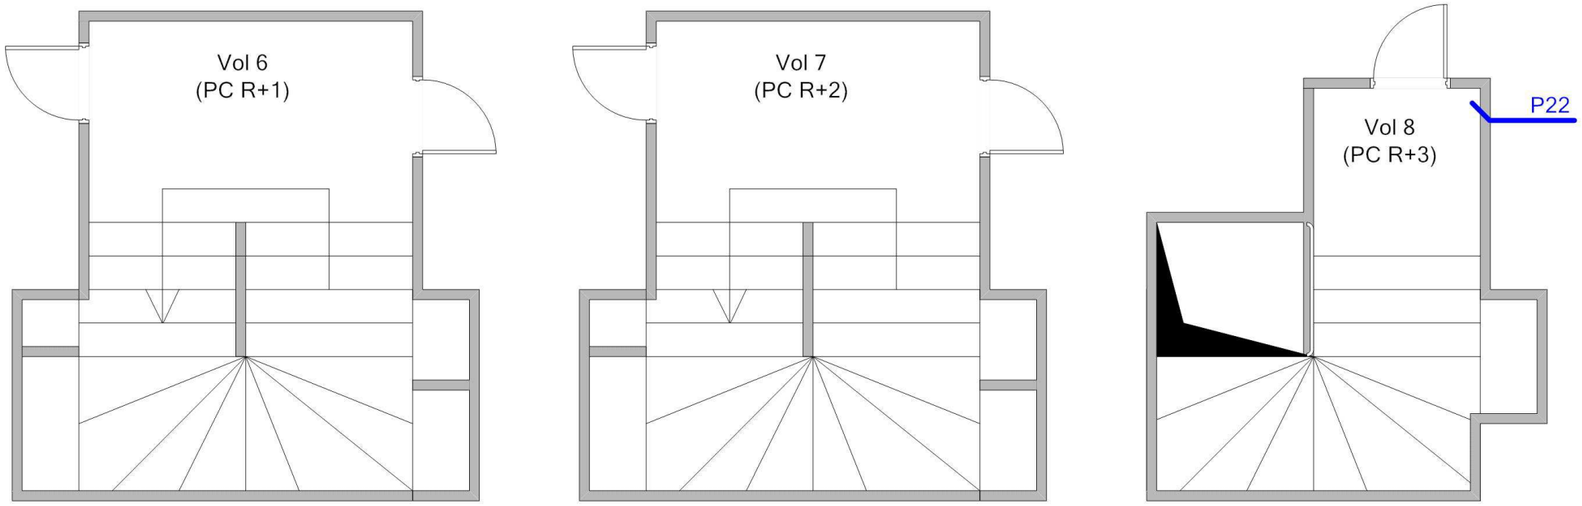

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

ETAGES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001426

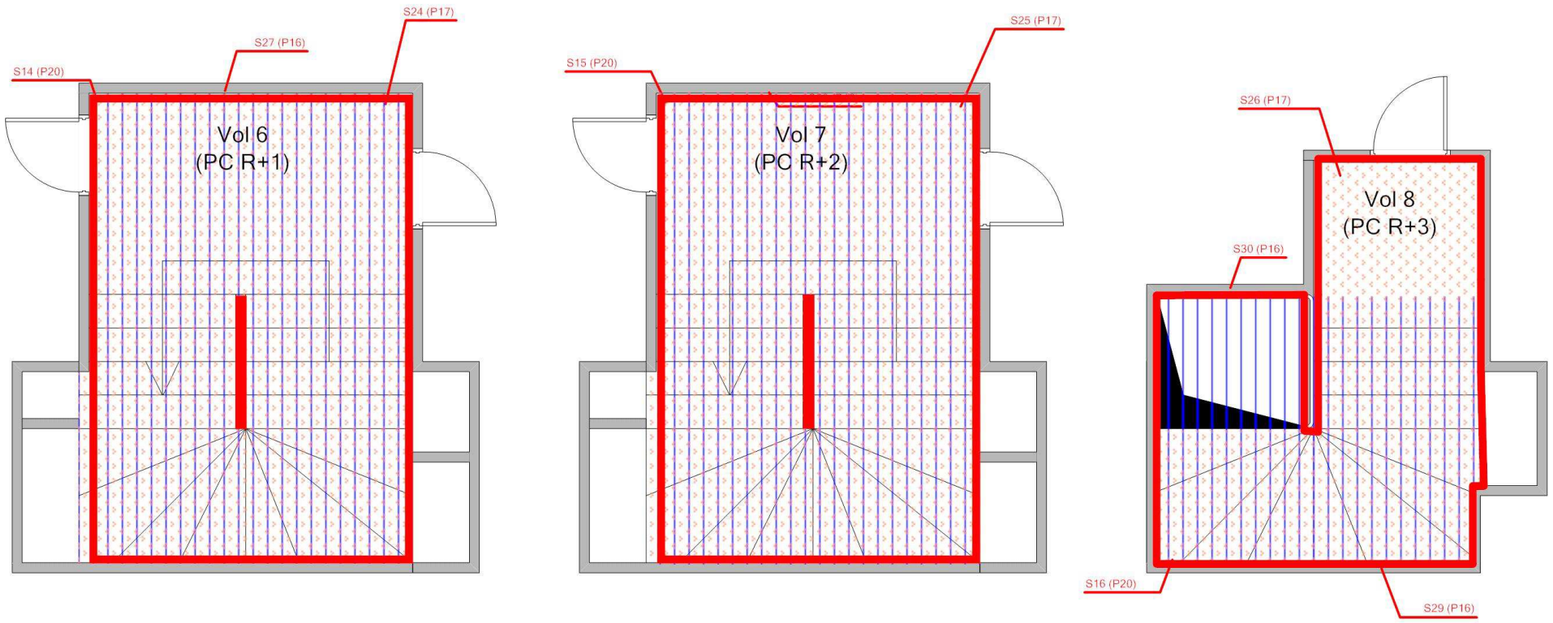

Légende	
	P20 : Enduit plâtre gouttelé (plafond)
	P16 : Enduit plâtre gouttelé avec peinture blanche (Murs porteurs)
	P17 : Lés plastiques beiges avec colle jaune

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001426

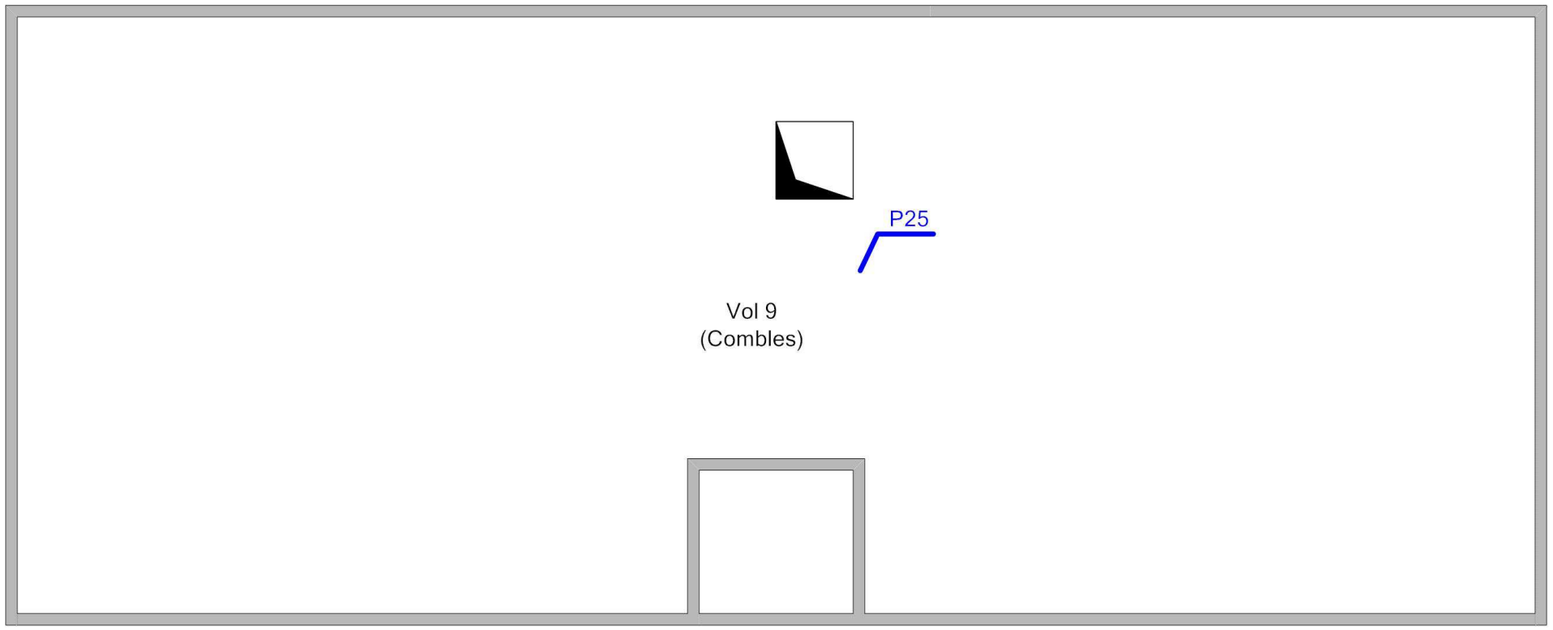

Légende	
P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

PLAN MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001426

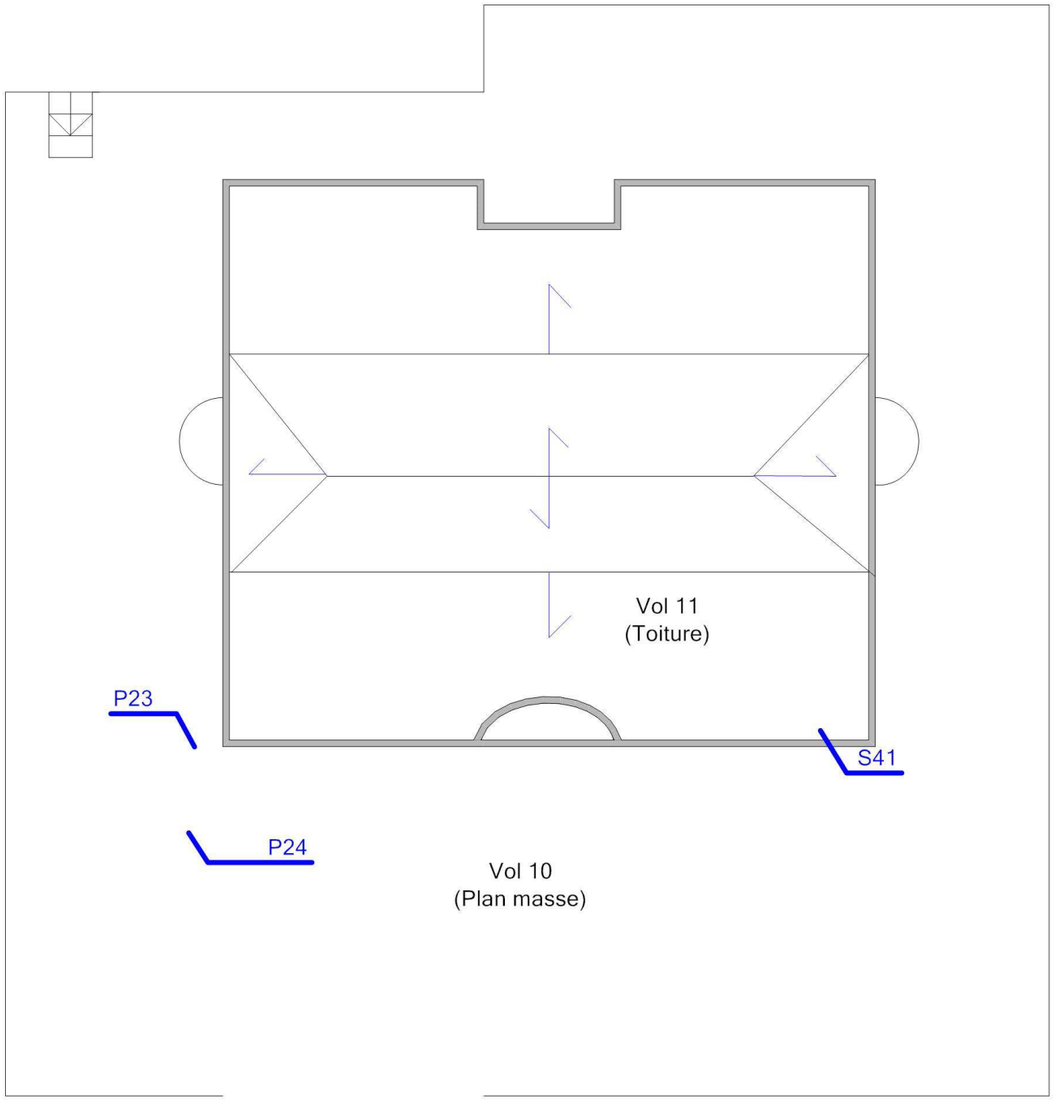

Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

FAÇADE AVANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001426

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
AC Environnement Diagnostics Immobiliers	RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

FAÇADE DROITE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001426

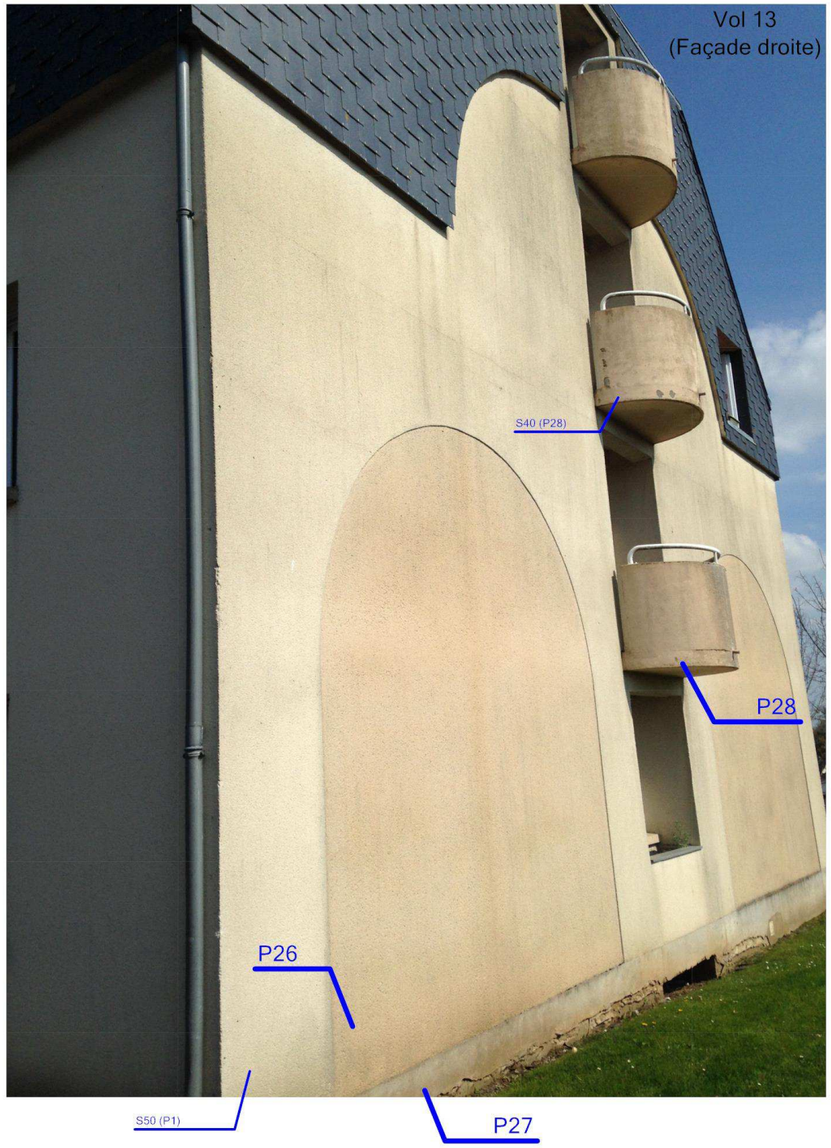

Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001426

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

FAÇADE GAUCHE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001426

Vol 15
(Façade gauche)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE BIGNON/NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/03/2017	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001426 n°25 - 1 (P25)	Combles - Vol 9 (Combles)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002HD001426 n°22 - 1 (P22)	Etages - Vol 8 (PC R+3)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002HD001426 n°26 - 1 (P26)	Façade droite - Vol 13 (Façade droite)	Prélevement
002HD001426 n°26 - 2 (P26)	Façade droite - Vol 13 (Façade droite)	Prélevement
002HD001426 n°27 - 1 (P27)	Façade droite - Vol 13 (Façade droite)	Prélevement
002HD001426 n°28 - 1 (P28)	Façade droite - Vol 13 (Façade droite)	Prélevement
002HD001426 n°28 - 2 (P28)	Façade droite - Vol 13 (Façade droite)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002HD001426 n°1 - 1 (P1)	PC RDC - Vol 1 (SAS ext)	Prélevement
002HD001426 n°1 - 2 (P1)	PC RDC - Vol 1 (SAS ext)	Prélevement
	PC RDC - Vol 1 (SAS ext)	I1
002HD001426 n°2 - 1 (P2)	PC RDC - Vol 1 (SAS ext)	Prélevement
002HD001426 n°2 - 2 (P2)	PC RDC - Vol 1 (SAS ext)	Prélevement
002HD001426 n°3 - 1 (P3)	PC RDC - Vol 1 (SAS ext)	Prélevement
002HD001426 n°3 - 2 (P3)	PC RDC - Vol 1 (SAS ext)	Prélevement
002HD001426 n°4 - 1 (P4)	PC RDC - Vol 4 (HALL)	Prélevement
002HD001426 n°4 - 2 (P4)	PC RDC - Vol 4 (HALL)	Prélevement
002HD001426 n°5 - 1 (P5)	PC RDC - Vol 4 (HALL)	Prélevement
002HD001426 n°5 - 2 (P5)	PC RDC - Vol 4 (HALL)	Prélevement
002HD001426 n°6 - 1 (P6)	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	Prélevement
002HD001426 n°6 - 2 (P6)	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	Prélevement
002HD001426 n°7 - 1 (P7)	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	Prélevement
002HD001426 n°7 - 2 (P7)	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	Prélevement
002HD001426 n°8 - 1 (P8)	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	Prélevement
002HD001426 n°8 - 2 (P8)	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	Prélevement
002HD001426 n°9 - 1 (P9)	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	Prélevement
002HD001426 n°9 - 2 (P9)	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	Prélevement
002HD001426 n°10 - 1 (P10)	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002HD001426 n°10 - 2 (P10)	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	Prélevement
002HD001426 n°11 - 1 (P11)	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	Prélevement
002HD001426 n°11 - 2 (P11)	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	Prélevement
002HD001426 n°12 - 1 (P12)	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	Prélevement
002HD001426 n°12 - 2 (P12)	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	Prélevement
002HD001426 n°13 - 1 (P13)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°13 - 2 (P13)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°14 - 1 (P14)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°14 - 2 (P14)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°15 - 1 (P15)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°15 - 2 (P15)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°16 - 1 (P16)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°16 - 2 (P16)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°17 - 1 (P17)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°18 - 1 (P18)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°18 - 2 (P18)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°19 - 1 (P19)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°19 - 2 (P19)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°20 - 1 (P20)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°20 - 2 (P20)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°21 - 1 (P21)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement
002HD001426 n°21 - 2 (P21)	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
S41 - 1 (A41)	Plan masse - Vol 11 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature
002HD001426 n°23 - 1 (P23)	Plan masse - Vol 10 (Plan masse)	Prélevement
002HD001426 n°24 - 1 (P24)	Plan masse - Vol 10 (Plan masse)	Prélevement

002HD001426 n°1 - 1 (P1)

002HD001426 n°1 - 2 (P1)

I1 - 1

002HD001426 n°2 - 1 (P2)

002HD001426 n°2 - 2 (P2)

002HD001426 n°3 - 1 (P3)

002HD001426 n°3 - 2 (P3)

002HD001426 n°4 - 1 (P4)

002HD001426 n°4 - 2 (P4)

002HD001426 n°5 - 1 (P5)

002HD001426 n°5 - 2 (P5)

002HD001426 n°6 - 1 (P6)

002HD001426 n°6 - 2 (P6)

002HD001426 n°7 - 1 (P7)

002HD001426 n°7 - 2 (P7)

002HD001426 n°8 - 1 (P8)

002HD001426 n°8 - 2 (P8)

002HD001426 n°9 - 1 (P9)

002HD001426 n°9 - 2 (P9)

002HD001426 n°10 - 1 (P10)

002HD001426 n°10 - 2 (P10)

002HD001426 n°11 - 1 (P11)

002HD001426 n°11 - 2 (P11)

002HD001426 n°12 - 1 (P12)

002HD001426 n°12 - 2 (P12)

002HD001426 n°13 - 1 (P13)

002HD001426 n°13 - 2 (P13)

002HD001426 n°14 - 1 (P14)

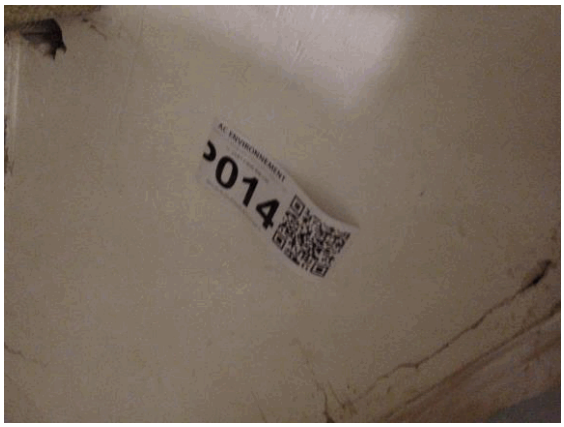

002HD001426 n°14 - 2 (P14)

002HD001426 n°15 - 1 (P15)

002HD001426 n°15 - 2 (P15)

002HD001426 n°16 - 1 (P16)

002HD001426 n°16 - 2 (P16)

002HD001426 n°17 - 1 (P17)

002HD001426 n°18 - 1 (P18)

002HD001426 n°18 - 2 (P18)

002HD001426 n°19 - 1 (P19)

002HD001426 n°19 - 2 (P19)

002HD001426 n°20 - 1 (P20)

002HD001426 n°20 - 2 (P20)

002HD001426 n°21 - 1 (P21)

002HD001426 n°21 - 2 (P21)

S41 - 1 (A41)

002HD001426 n°25 - 1 (P25)

002HD001426 n°22 - 1 (P22)

002HD001426 n°23 - 1 (P23)

002HD001426 n°24 - 1 (P24)

002HD001426 n°26 - 1 (P26)

002HD001426 n°26 - 2 (P26)

002HD001426 n°27 - 1 (P27)

002HD001426 n°28 - 1 (P28)

002HD001426 n°28 - 2 (P28)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Reférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Façades	Murs	Enduit beige en vrac avec poussières - -	PC RDC - Vol 1 (SAS ext)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + matériau gris en vrac non séparable - -	PC RDC - Vol 1 (SAS ext)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - Avec motifs et lissée -	PC RDC - Vol 1 (SAS ext)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou rouge avec poussières - -	PC RDC - Vol 4 (HALL)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Murs porteurs -	PC RDC - Vol 4 (HALL)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - -	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton - Plafond plaque plâtre -	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Béton banché brut -	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Gratté -	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - -	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières + matériau souple marron - -	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - Joints souples noirs -	PC RDC - Vol 3 (local poubelle)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux gris en vrac + peinture blanche - -	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton - doublage plaque plâtre -	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - -	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable - -	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	

P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + matériau compact beige - -	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac - Gaine technique -	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable - Sous face escalier + palier -	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	
P21	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée en vrac - Mousse avec tresse platreuse -	PC RDC - Vol 5 (PC RDC)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - Plafond plaque plâtre -	Etages - Vol 8 (PC R+3)	
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - -	Plan masse - Vol 10 (Plan masse)	
P24	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 - -	Plan masse - Vol 10 (Plan masse)	
P26	Façades	Murs	Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable - -	Façade droite - Vol 13 (Façade droite)	
P27	Façades	Murs	Enduit compact gris - soubassement -	Façade droite - Vol 13 (Façade droite)	
P28	Façades	Murs	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + matériau beige non séparable - -	Façade droite - Vol 13 (Façade droite)	
P25	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau fibreux blanc non séparable + papier non séparable - Laine avec pare vapeur -	Combles - Vol 9 (Combles)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28866 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28866
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426001 / Façades / Murs / Enduits projetés beiges / Vol 1 (SAS ext)

Description ITGA	Enduit beige en vrac avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit beige en vrac avec poussières	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28867 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28867
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426002 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté noires / Vol 1 (SAS ext)

Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir avec poussières + matériau gris en vrac non séparable	META le 18/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28868 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28868
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 1 (SAS ext)

Description ITGA	Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28869 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28869
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426004 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier mou rouge / Vol 4 (HALL)

Description ITGA	Matériau mou rouge avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau mou rouge avec poussières	META le 18/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28870 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28870
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit gouttelé blanc / Vol 4 (HALL)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 20/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28871 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28871
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement des parpaing / Vol 3 (local poubelle)

Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28872 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28872
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426007 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 3 (local poubelle)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28873 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28873
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (local poubelle)

Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28874 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28874
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (local poubelle)

Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28875 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28875
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage autour menuiseries / Vol 3 (local poubelle)

Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28876 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28876
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426011 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté souple grise / Vol 3 (local poubelle)

Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières / Matériau souple marron

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple blanc avec poussières + matériau souple marron	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28877 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28877
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426012 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie / Vol 3 (local poubelle)

Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28878 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28878
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426013 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 5 (PC RDC)

Description ITGA	Matériau fibreux gris en vrac / Peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux gris en vrac + peinture blanche	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28879 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28879
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement des carreaux de platre / Vol 5 (PC RDC)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28880 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28880
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426015 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (PC RDC)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28881 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28881
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre gouttelé avec peinture blanche / Vol 5 (PC RDC)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 19/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28882 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28882
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques beiges avec colle jaune / Vol 5 (PC RDC)

Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Peintures multiples / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable	META le 20/04/2017	Présence de fibres d'amiante (*)	Chrysotile	3

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28883 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28883
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 5 (PC RDC)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Matériau compact beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + matériau compact beige	META le 18/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28884 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28884
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 5 (PC RDC)

Description ITGA	Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28885 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28885
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426020 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre gouttelé / Vol 5 (PC RDC)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	META le 20/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28886 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28886
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426021 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 5 (PC RDC)

Description ITGA	Matériau noir en mousse / Toile blanche plâtrée en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée en vrac	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28887 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28887
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426022 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 8 (PC R+3)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28888 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28888
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint entre les bordures / Vol 10 (Plan masse)

Description ITGA	Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28889 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28889
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426024 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche supérieure / Vol 10 (Plan masse)

Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META le 18/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28891 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28891
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426026 / Façades / Murs / Enduits projetés rose / Vol 13 (Façade droite)

Description ITGA	Enduit beige en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28892 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28892
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426027 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 13 (Façade droite)

Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28893 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28893
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426028 / Façades / Murs / Enduits projetés balcons / Vol 13 (Façade droite)

Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture / Matériau beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + matériau beige non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28890 EN DATE DU 20/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34405
Echantillon ITGA : IT071704-28890
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001426
Dossier client	_0037700002_ RUE BIGNON/NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001426025 / Toiture et étanchéité / Elément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 9 (Combles)

Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau fibreux blanc / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau fibreux blanc non séparable + papier non séparable	MOLP le 18/04/2017	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
