Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	26 GRANDE RUE - GRANDE RUE
CP - Ville :	53150 BREE
Référence client :	_00549000010000100001_
Date du repérage :	26/07/2016
Désignation :	Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC

Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	26 GRANDE RUE - GRANDE RUE 53150 BREE
Référence client :	_00549000010000100001_
Désignation :	Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	GARDENAT Ludovic
Accompagnateur :	néant (néant)
Date de repérage	26/07/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 4002 V3
Délivré le : 23/06/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 05/08/2016
A Riorges, le 05/08/2016

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

RDC - Vol 1 (Cuisine)	RDC - Vol 2 (W.C)
RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	RDC - Vol 4 (Séjour)
r+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	r+1 - Vol 6 (Chambre 1)
r+1 - Vol 7 (Chambre 2)	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)
r+1 - Vol 9 (Débarras)	cave - Vol 10 (Cave)
combles - Vol 11 (Comble)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 4 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 4 (Séjour)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Dégagement 1)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 4 (Séjour)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 4 (Séjour)	
Parois verticales intérieures et enduits	r+1	Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (SDB/WC) - Vol 9 (Débarras)	
Plafond et faux-plafonds	r+1	Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (SDB/WC) - Vol 9 (Débarras)	
Revêtement de mur	r+1	Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 8 (SDB/WC) - Vol 9 (Débarras)	

Revêtement de sol	r+1	Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (SDB/WC) - Vol 9 (Débarras)	
Equipements divers et accessoires	r+1	Vol 8 (SDB/WC)	
Parois verticales intérieures et enduits	cave	Vol 10 (Cave)	
Plafond et faux-plafonds	cave	Vol 10 (Cave)	
Revêtement de sol	cave	Vol 10 (Cave)	
Toiture et étanchéité	combles	Vol 11 (Comble)	

K — Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L — Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M — Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 4 (Séjour)	Reprise d'étanchéïté/Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Dégagement 1)	Reprise d'étanchéïté/Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	Reprise d'étanchéïté/Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 1)	Reprise d'étanchéïté/Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	Reprise d'étanchéïté/Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (SDB/WC)	Reprise d'étanchéïté/Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Dégagement 2)	Reprise d'étanchéïté/Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (SDB/WC)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)
-les matériaux compris entre le mur extérieur et le doublage placoplatre des pièces

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (Séjour)	Conduit de fumée	Joint entre éléments	P3	Réalisation d'un prélevement	joint mousse orange - autour du doublage en placoplatre condamnant l'évacuation de ka cheminée	002OY000050 n°3 - 1 - 002OY000050 n°3 - 2	P3	Matériau souple de type joint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Séjour)	Conduit de fumée	Joint entre éléments	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	joint mousse orange - autour du doublage en placoplatre condamnant l'évacuation de ka cheminée	002OY000050 n°3 - 1 - 002OY000050 n°3 - 2	P3	Matériau souple de type joint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Baignoire	Tampon bitumineux	P15	Réalisation d'un prélevement	noire	002OY000050 n°15 - 1 - 002OY000050 n°15 - 2	P15	Matériau souple (transparent) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Baignoire	Tampon bitumineux	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	noire	002OY000050 n°15 - 1 - 002OY000050 n°15 - 2	P15	Matériau souple (transparent) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I3	blancs		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélevement	Enduit beige sur pierres	002OY000050 n°1 - 1 - 002OY000050 n°1 - 2	P1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Enduit beige sur pierres	002OY000050 n°1 - 1 - 002OY000050 n°1 - 2	P1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélevement	gris entre briquettes rouge	002OY000050 n°2 - 1 - 002OY000050 n°2 - 2	P2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries pvc	Reprise d'étanchéïté/Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
RDC	Vol 3 (Dégagement 1)	Menuiseries pvc	Reprise d'étanchéïté/Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
RDC	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries pvc	Reprise d'étanchéïté/Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
r+1	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries pvc	Reprise d'étanchéïté/Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
r+1	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries pvc	Reprise d'étanchéïté/Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Menuiseries pvc	Reprise d'étanchéïté/Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
r+1	Vol 5 (Dégagement 2)	Menuiseries pvc	Reprise d'étanchéïté/Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement	enduit entre briques de platre	002OY000050 n°14 - 1 - 002OY000050 n°14 - 2	P14	Matériau semi-dur de type plâtre (beige) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	enduit entre briques de platre	002OY000050 n°14 - 1 - 002OY000050 n°14 - 2	P14	Matériau semi-dur de type plâtre (beige) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 7 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P20	Réalisation d'un prélevement	Doublage pièces sèches	002OY000050 n°20 - 1 - 002OY000050 n°20 - 2	P20 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
r+1	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 9 (Débarras) - Vol 5 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Doublage pièces sèches	002OY000050 n°20 - 1 - 002OY000050 n°20 - 2	P20 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Séjour) - Vol 3 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Doublage pièces sèches	002OY000050 n°20 - 1 - 002OY000050 n°20 - 2	P20 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 7 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P20	Réalisation d'un prélevement	Doublage pièces sèches	002OY000050 n°20 - 1 - 002OY000050 n°20 - 2	P20 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 9 (Débarras) - Vol 5 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Doublage pièces sèches	002OY000050 n°20 - 1 - 002OY000050 n°20 - 2	P20 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Séjour) - Vol 3 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Doublage pièces sèches	002OY000050 n°20 - 1 - 002OY000050 n°20 - 2	P20 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P21	Réalisation d'un prélevement	Doublage pièces humides	002OY000050 n°21 - 1 - 002OY000050 n°21 - 2	P21 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Doublage pièces humides	002OY000050 n°21 - 1 - 002OY000050 n°21 - 2	P21 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P21	Réalisation d'un prélevement	Doublage pièces humides	002OY000050 n°21 - 1 - 002OY000050 n°21 - 2	P21 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Doublage pièces humides	002OY000050 n°21 - 1 - 002OY000050 n°21 - 2	P21 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P21	Réalisation d'un prélevement	Doublage pièces humides	002OY000050 n°21 - 1 - 002OY000050 n°21 - 2	P21 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Doublage pièces humides	002OY000050 n°21 - 1 - 002OY000050 n°21 - 2	P21 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
cave	Vol 10 (Cave)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23	Réalisation d'un prélevement	Doublage cage d'escalier - de 1m de hauteur jusqu'au plafond	002OY000050 n°23 - 1 - 002OY000050 n°23 - 2	P23 Phase 1	Matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
cave	Vol 10 (Cave)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23	Réalisation d'un prélevement	Doublage cage d'escalier - de 1m de hauteur jusqu'au plafond	002OY000050 n°23 - 1 - 002OY000050 n°23 - 2	P23 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
cave	Vol 10 (Cave)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P25	Réalisation d'un prélevement	gris/ beige friable	002OY000050 n°25 - 1 - 002OY000050 n°25 - 2	P25 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
cave	Vol 10 (Cave)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P25	Réalisation d'un prélevement	gris/ beige friable	002OY000050 n°25 - 1 - 002OY000050 n°25 - 2	P25 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
cave	Vol 10 (Cave)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P26	Réalisation d'un prélevement	beige entre les pièrre - jusqu'à 1m50 de haut environ	002OY000050 n°26 - 1 - 002OY000050 n°26 - 2	P26	Matériau semi-dur de type enduit (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement 1)	Porte de la cave	Joint	P28	Réalisation d'un prélevement	d'étanchéité noir	002OY000050 n°28 - 1 - 002OY000050 n°28 - 2	P28	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (Séjour)	Faux plafonds	Joints platre entre panneau / poutres	P4	Réalisation d'un prélevement	platreux blancs - entre placoplatre et poutres apparentes aux plafonds	002OY000050 n°4 - 1 - 002OY000050 n°4 - 2	P4 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 8 (SDB/WC) - Vol 7 (Chambre 2)	Faux plafonds	Joints platre entre panneau / poutres	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	platreux blancs - entre placoplatre et poutres apparentes aux plafonds	002OY000050 n°4 - 1 - 002OY000050 n°4 - 2	P4 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (Séjour)	Faux plafonds	Joints platre entre panneau / poutres	P4	Réalisation d'un prélevement	platreux blancs - entre placoplatre et poutres apparentes aux plafonds	002OY000050 n°4 - 1 - 002OY000050 n°4 - 2	P4 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 8 (SDB/WC) - Vol 7 (Chambre 2)	Faux plafonds	Joints platre entre panneau / poutres	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	platreux blancs - entre placoplatre et poutres apparentes aux plafonds	002OY000050 n°4 - 1 - 002OY000050 n°4 - 2	P4 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P8	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièces humides	002OY000050 n°8 - 1 - 002OY000050 n°8 - 2	P8 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (W.C)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond pièces humides	002OY000050 n°8 - 1 - 002OY000050 n°8 - 2	P8 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond pièces humides	002OY000050 n°8 - 1 - 002OY000050 n°8 - 2	P8 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P8	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièces humides	002OY000050 n°8 - 1 - 002OY000050 n°8 - 2	P8 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (W.C)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond pièces humides	002OY000050 n°8 - 1 - 002OY000050 n°8 - 2	P8 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond pièces humides	002OY000050 n°8 - 1 - 002OY000050 n°8 - 2	P8 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 5 (Dégagement 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P16	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièces sèches	002OY000050 n°16 - 1 - 002OY000050 n°16 - 2	P16 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
r+1	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 9 (Débarras)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Plafond pièces sèches	002OY000050 n°16 - 1 - 002OY000050 n°16 - 2	P16 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 4 (Séjour)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Plafond pièces sèches	002OY000050 n°16 - 1 - 002OY000050 n°16 - 2	P16 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 5 (Dégagement 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P16	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièces sèches	002OY000050 n°16 - 1 - 002OY000050 n°16 - 2	P16 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 9 (Débarras)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Plafond pièces sèches	002OY000050 n°16 - 1 - 002OY000050 n°16 - 2	P16 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 4 (Séjour)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Plafond pièces sèches	002OY000050 n°16 - 1 - 002OY000050 n°16 - 2	P16 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
r+1	Vol 5 (Dégagement 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P16	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièces sèches	002OY000050 n°16 - 1 - 002OY000050 n°16 - 2	P16 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 9 (Débarras)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Plafond pièces sèches	002OY000050 n°16 - 1 - 002OY000050 n°16 - 2	P16 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 4 (Séjour)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Plafond pièces sèches	002OY000050 n°16 - 1 - 002OY000050 n°16 - 2	P16 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
cave	Vol 10 (Cave)	Faux plafonds	Jonctions faux-plafond / structure	P24	Réalisation d'un prélevement	plafond cage d'escalier de la cave	002OY000050 n°24 - 1 - 002OY000050 n°24 - 2	P24	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (poudreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
cave	Vol 10 (Cave)	Plafonds	Enduit ciment	P27	Réalisation d'un prélevement	grise/ beige	002OY000050 n°27 - 1 - 002OY000050 n°27 - 2	P27	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P7	Réalisation d'un prélevement	beige faience 15*15 blanche	002OY000050 n°7 - 1 - 002OY000050 n°7 - 2	P7	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 5 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P10	Réalisation d'un prélevement	plinthes beiges 20*5 + colle beige	002OY000050 n°10 - 1 - 002OY000050 n°10 - 2	P10 Phase 1	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 5 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	plinthes beiges 20*5 + colle beige	002OY000050 n°10 - 1 - 002OY000050 n°10 - 2	P10 Phase 1	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	plinthes beiges 20*5 + colle beige	002OY000050 n°10 - 1 - 002OY000050 n°10 - 2	P10 Phase 1	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 5 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P10	Réalisation d'un prélevement	plinthes beiges 20*5 + colle beige	002OY000050 n°10 - 1 - 002OY000050 n°10 - 2	P10 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
r+1	Vol 5 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	plinthes beiges 20*5 + colle beige	002OY000050 n°10 - 1 - 002OY000050 n°10 - 2	P10 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	plinthes beiges 20*5 + colle beige	002OY000050 n°10 - 1 - 002OY000050 n°10 - 2	P10 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12	Réalisation d'un prélevement	plinthes grises foncées + colle beige	002OY000050 n°12 - 1 - 002OY000050 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 8 (SDB/WC) - Vol 9 (Débarras)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	plinthes grises foncées + colle beige	002OY000050 n°12 - 1 - 002OY000050 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12	Réalisation d'un prélevement	plinthes grises foncées + colle beige	002OY000050 n°12 - 1 - 002OY000050 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
r+1	Vol 8 (SDB/WC) - Vol 9 (Débarras)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	plinthes grises foncées + colle beige	002OY000050 n°12 - 1 - 002OY000050 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12	Réalisation d'un prélevement	plinthes grises foncées + colle beige	002OY000050 n°12 - 1 - 002OY000050 n°12 - 2	P12 Phase 3	Matériau dur de typeciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 8 (SDB/WC) - Vol 9 (Débarras)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	plinthes grises foncées + colle beige	002OY000050 n°12 - 1 - 002OY000050 n°12 - 2	P12 Phase 3	Matériau dur de typeciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P13	Réalisation d'un prélevement	faience blanche 15*15 +colle beige	002OY000050 n°13 - 1 - 002OY000050 n°13 - 2	P13	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	faience blanche 15*15 +colle beige	002OY000050 n°13 - 1 - 002OY000050 n°13 - 2	P13	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P5	Réalisation d'un prélevement	dallettes avec imprimés blancs /rouges/jaunes/ gris/vert	002OY000050 n°5 - 1 - 002OY000050 n°5 - 2	P5	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P6	Réalisation d'un prélevement	noire sous dalettes grises foncé	002OY000050 n°6 - 1 - 002OY000050 n°6 - 2	P6	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 5 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9	Réalisation d'un prélevement	carreaux 20*20 beiges	002OY000050 n°9 - 1 - 002OY000050 n°9 - 2	P9 Phase 1	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc) Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	carreaux 20*20 beiges	002OY000050 n°9 - 1 - 002OY000050 n°9 - 2	P9 Phase 1	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc) Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 5 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9	Réalisation d'un prélevement	carreaux 20*20 beiges	002OY000050 n°9 - 1 - 002OY000050 n°9 - 2	P9 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	carreaux 20*20 beiges	002OY000050 n°9 - 1 - 002OY000050 n°9 - 2	P9 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P11	Réalisation d'un prélevement	carreaux gris foncés 20*20	002OY000050 n°11 - 1 - 002OY000050 n°11 - 2	P11 Phase 1	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 9 (Débarras)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	carreaux gris foncés 20*20	002OY000050 n°11 - 1 - 002OY000050 n°11 - 2	P11 Phase 1	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 8 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P11	Réalisation d'un prélevement	carreaux gris foncés 20*20	002OY000050 n°11 - 1 - 002OY000050 n°11 - 2	P11 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 9 (Débarras)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	carreaux gris foncés 20*20	002OY000050 n°11 - 1 - 002OY000050 n°11 - 2	P11 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P17	Réalisation d'un prélevement	rose d'origine	002OY000050 n°17 - 1 - 002OY000050 n°17 - 2	P17	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
r+1	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	rose d'origine	002OY000050 n°17 - 1 - 002OY000050 n°17 - 2	P17	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélevement	linoléum gris clair d'origine + colle jaune - au-dessus ragréage rose d'origine	002OY000050 n°18 - 1 - 002OY000050 n°18 - 2	P18 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	linoléum gris clair d'origine + colle jaune - au-dessus ragréage rose d'origine	002OY000050 n°18 - 1 - 002OY000050 n°18 - 2	P18 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélevement	linoléum gris clair d'origine + colle jaune - au-dessus ragréage rose d'origine	002OY000050 n°18 - 1 - 002OY000050 n°18 - 2	P18 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
r+1	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	linoléum gris clair d'origine + colle jaune - au-dessus ragréage rose d'origine	002OY000050 n°18 - 1 - 002OY000050 n°18 - 2	P18 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
r+1	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	linoléum marron imitation parquets + colle translucide	couche supérieure visible au-dessus du linoléum gris d'origine	I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
cave	Vol 10 (Cave)	Revêtement de sol	marche d'escalier	P22	Réalisation d'un prélevement	enduit ciment gris	002OY000050 n°22 - 1 - 002OY000050 n°22 - 2	P22	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
combles	Vol 11 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P19	Réalisation d'un prélevement	laine de verres jaune	002OY000050 n°19 - 1 - 002OY000050 n°19 - 2	P19 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
combles	Vol 11 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	laine de verres jaune	002OY000050 n°19 - 1 - 002OY000050 n°19 - 2	P19 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
combles	Vol 11 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P19	Réalisation d'un prélevement	laine de verres jaune	002OY000050 n°19 - 1 - 002OY000050 n°19 - 2	P19 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
combles	Vol 11 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	laine de verres jaune	002OY000050 n°19 - 1 - 002OY000050 n°19 - 2	P19 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de prélèvements
	r+1	r+1 - Plan de repérage - Actions menées
	r+1	r+1 - Plan de prélèvements
	cave	cave - Plan de repérage - Actions menées
	combles	combles - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000050

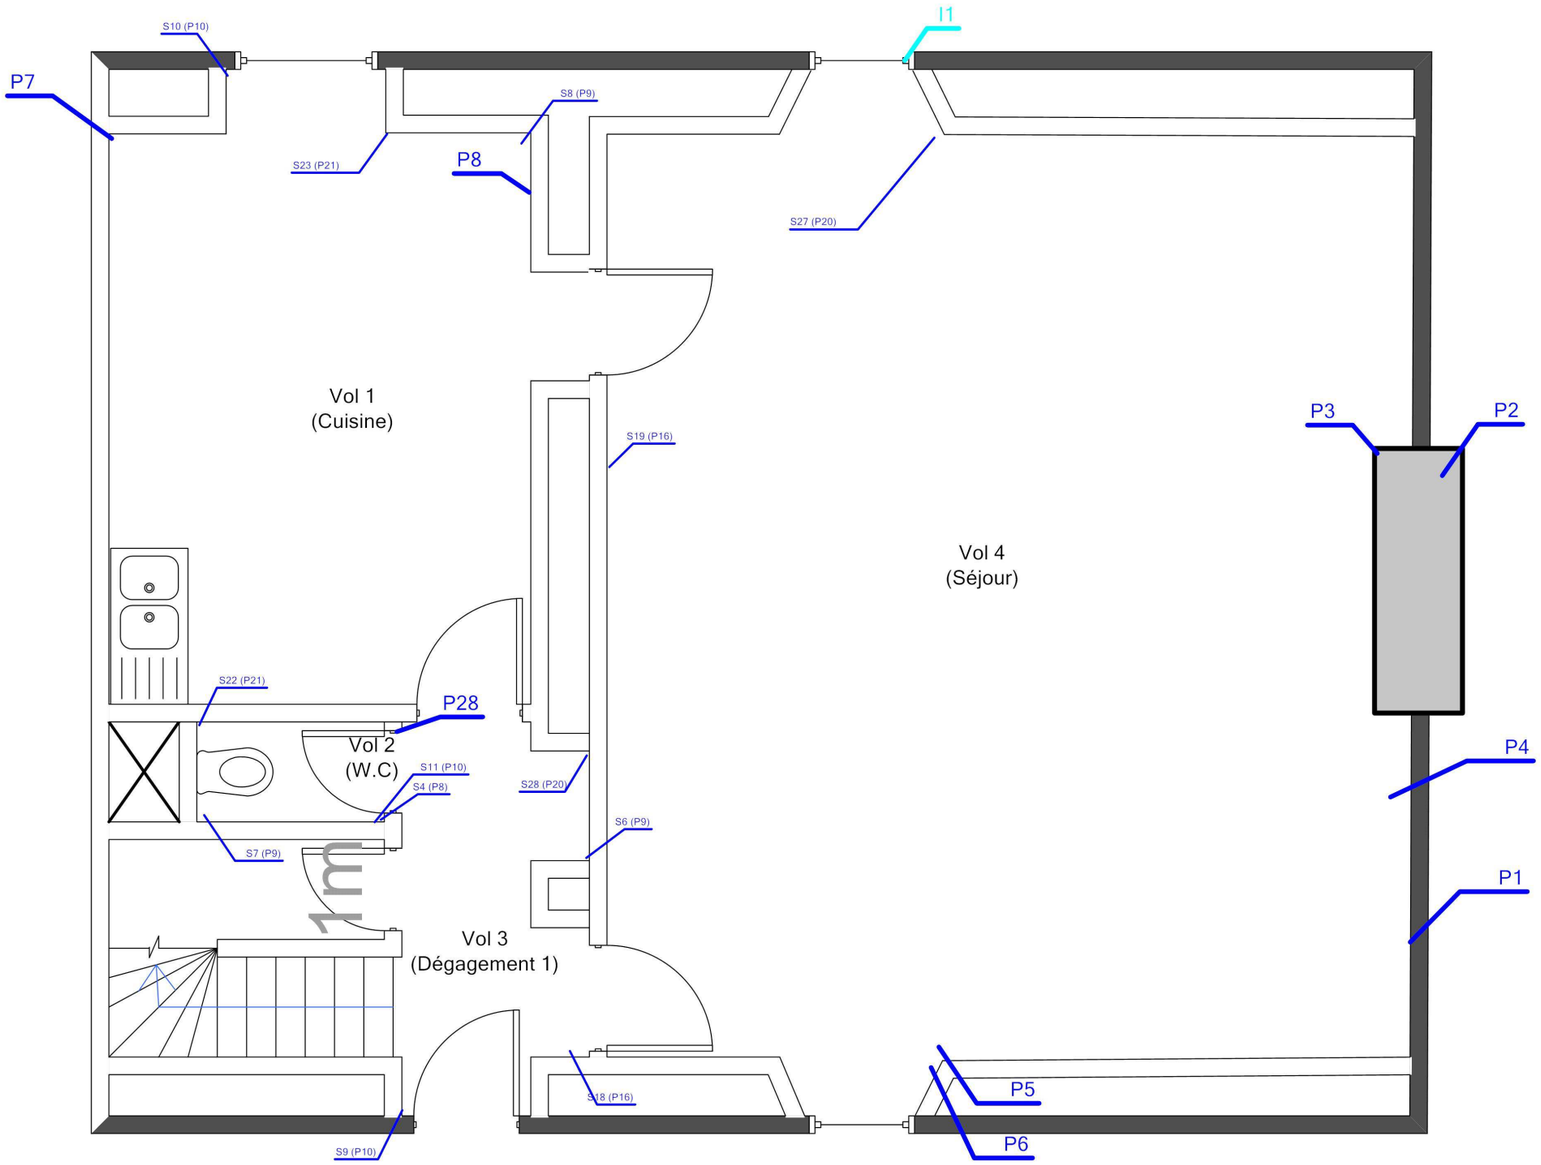

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
26 GRANDE RUE - GRANDE RUE 53150 BREE	Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC	26/07/2016	GARDENAT Ludovic

RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000050

Légende

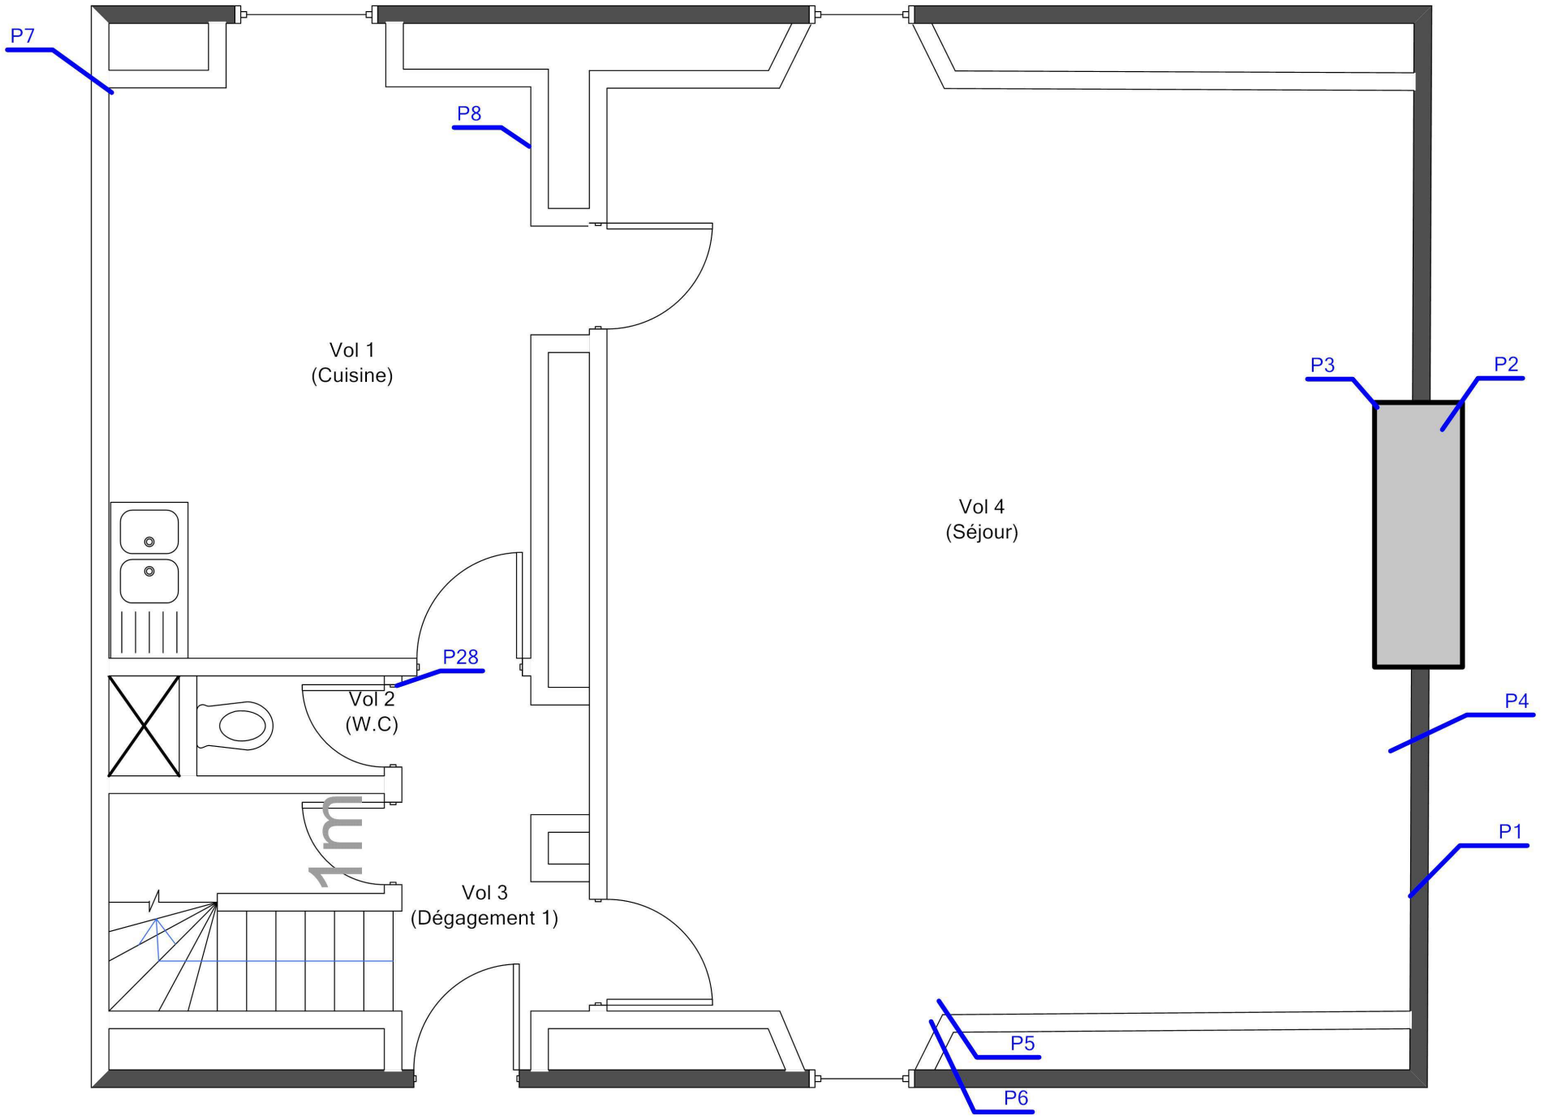

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
26 GRANDE RUE - GRANDE RUE 53150 BREE	Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC	26/07/2016	GARDENAT Ludovic

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000050

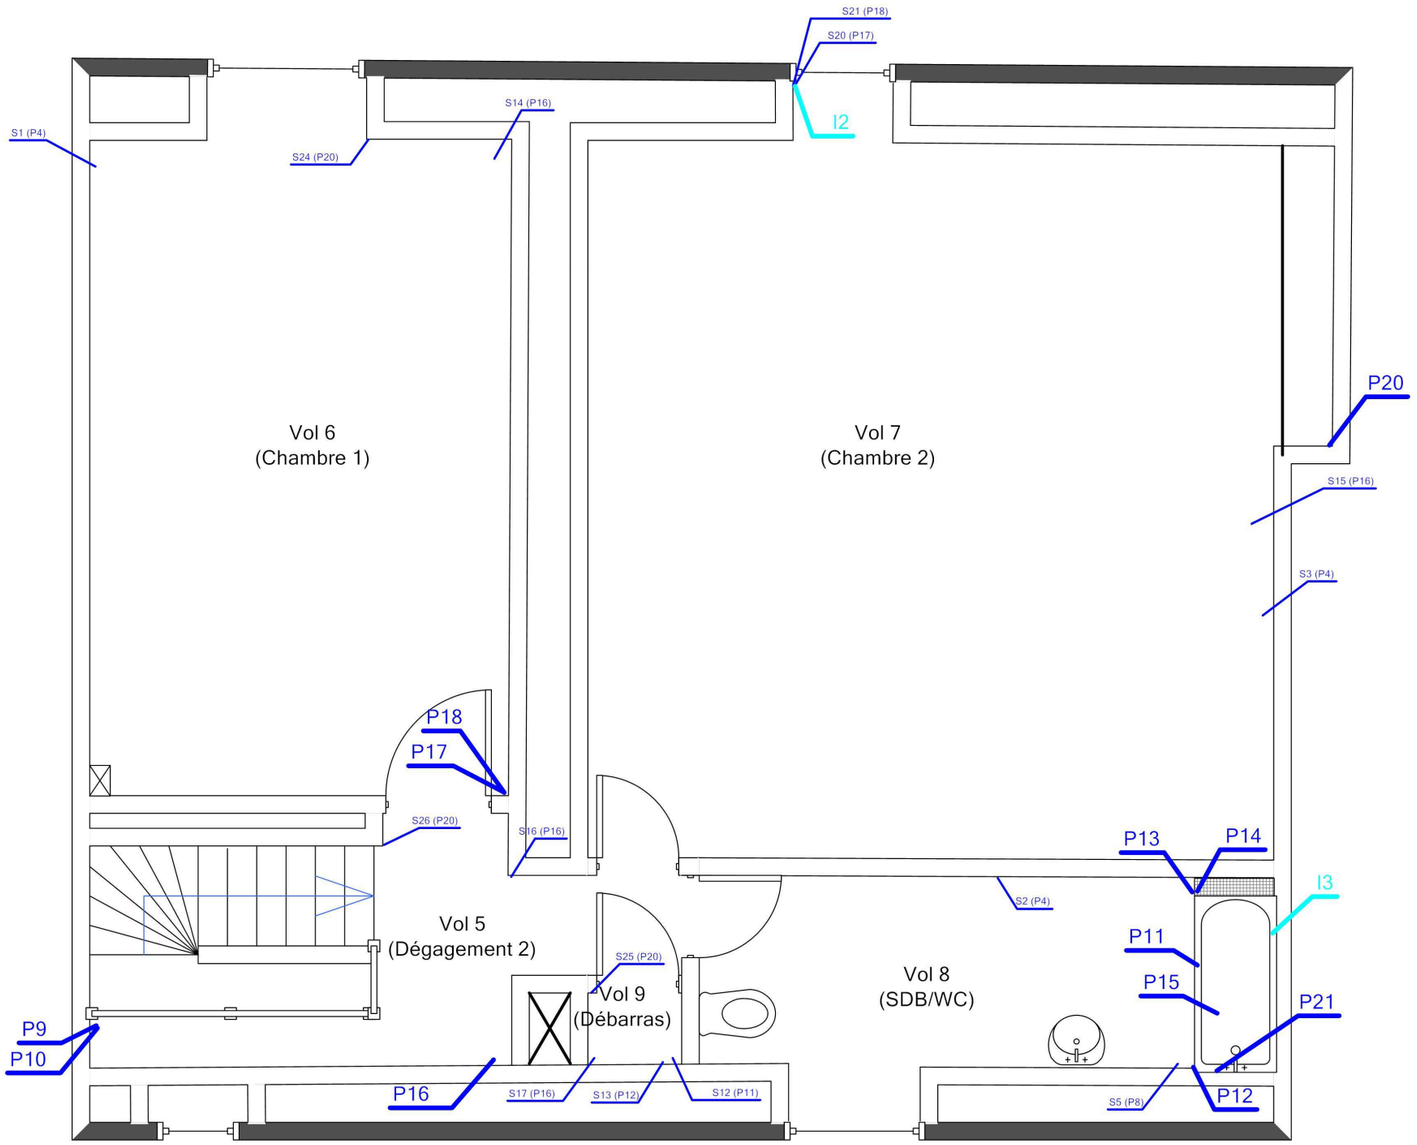

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
26 GRANDE RUE - GRANDE RUE 53150 BREE	Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC	26/07/2016	GARDENAT Ludovic

R+1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000050

Légende

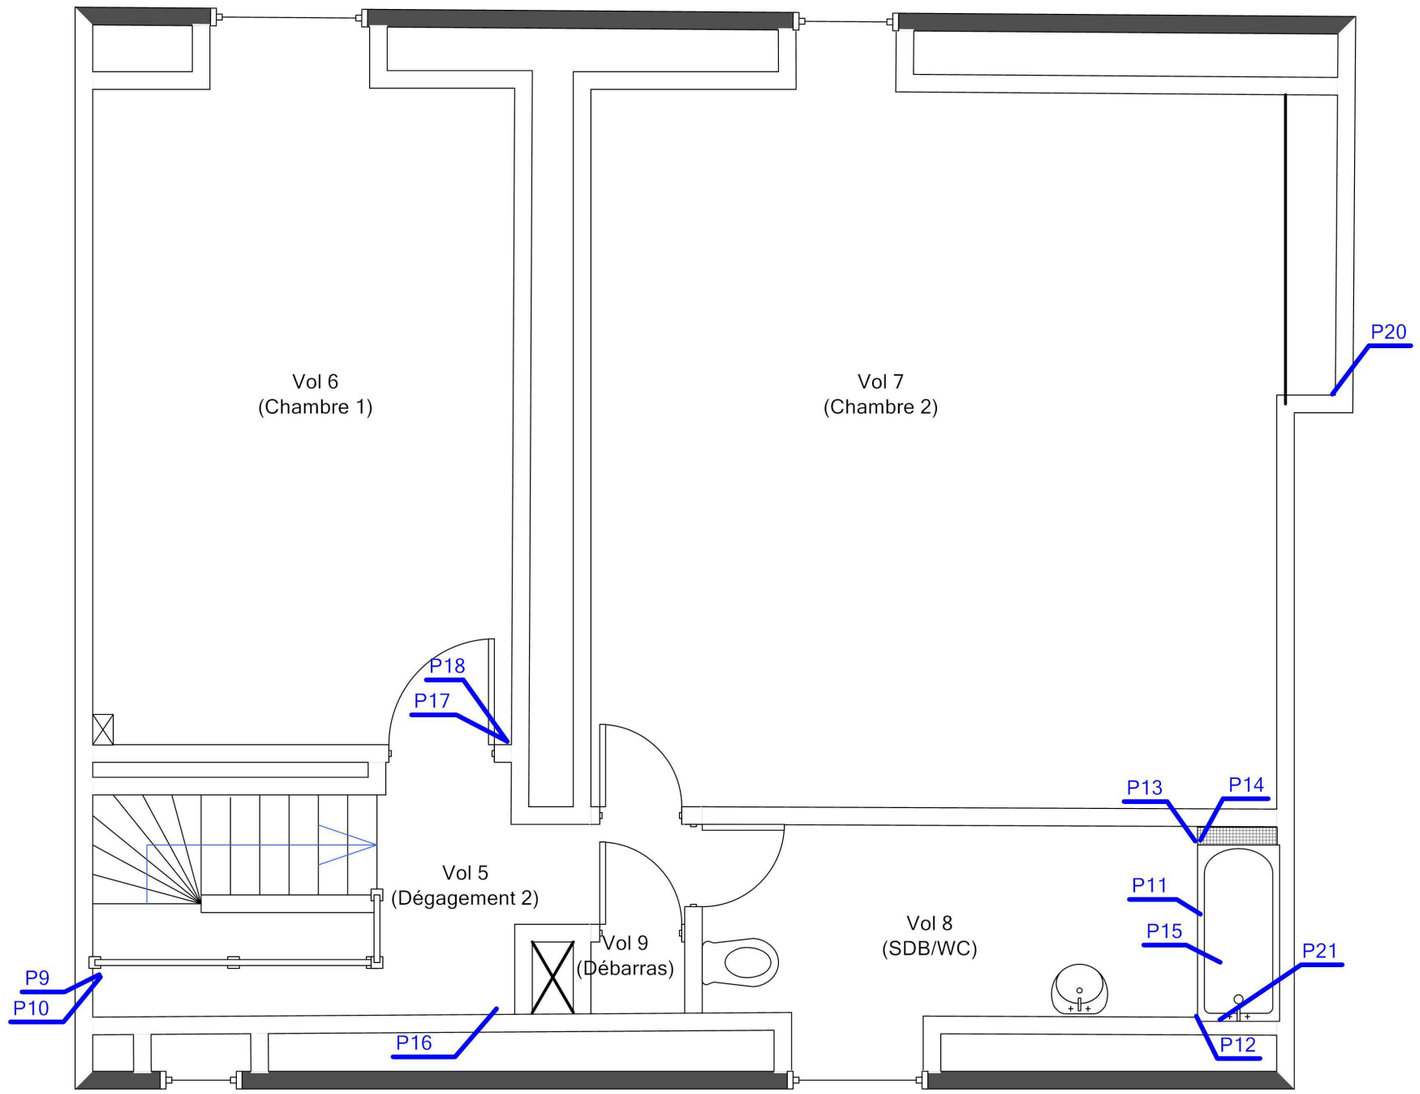

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
26 GRANDE RUE - GRANDE RUE 53150 BREE	Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC	26/07/2016	GARDENAT Ludovic

CAVE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000050

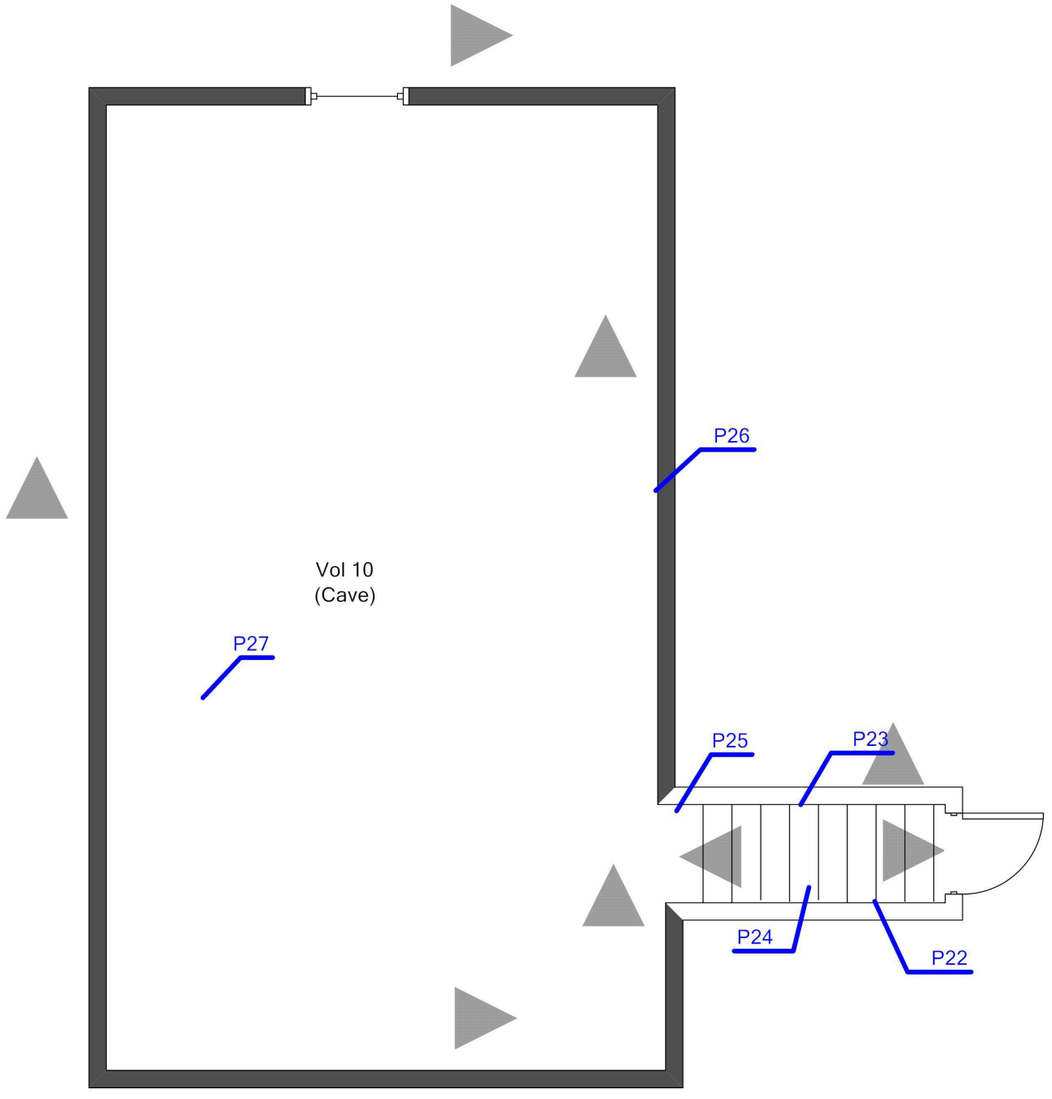

Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
26 GRANDE RUE - GRANDE RUE 53150 BREE	Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC	26/07/2016	GARDENAT Ludovic

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000050

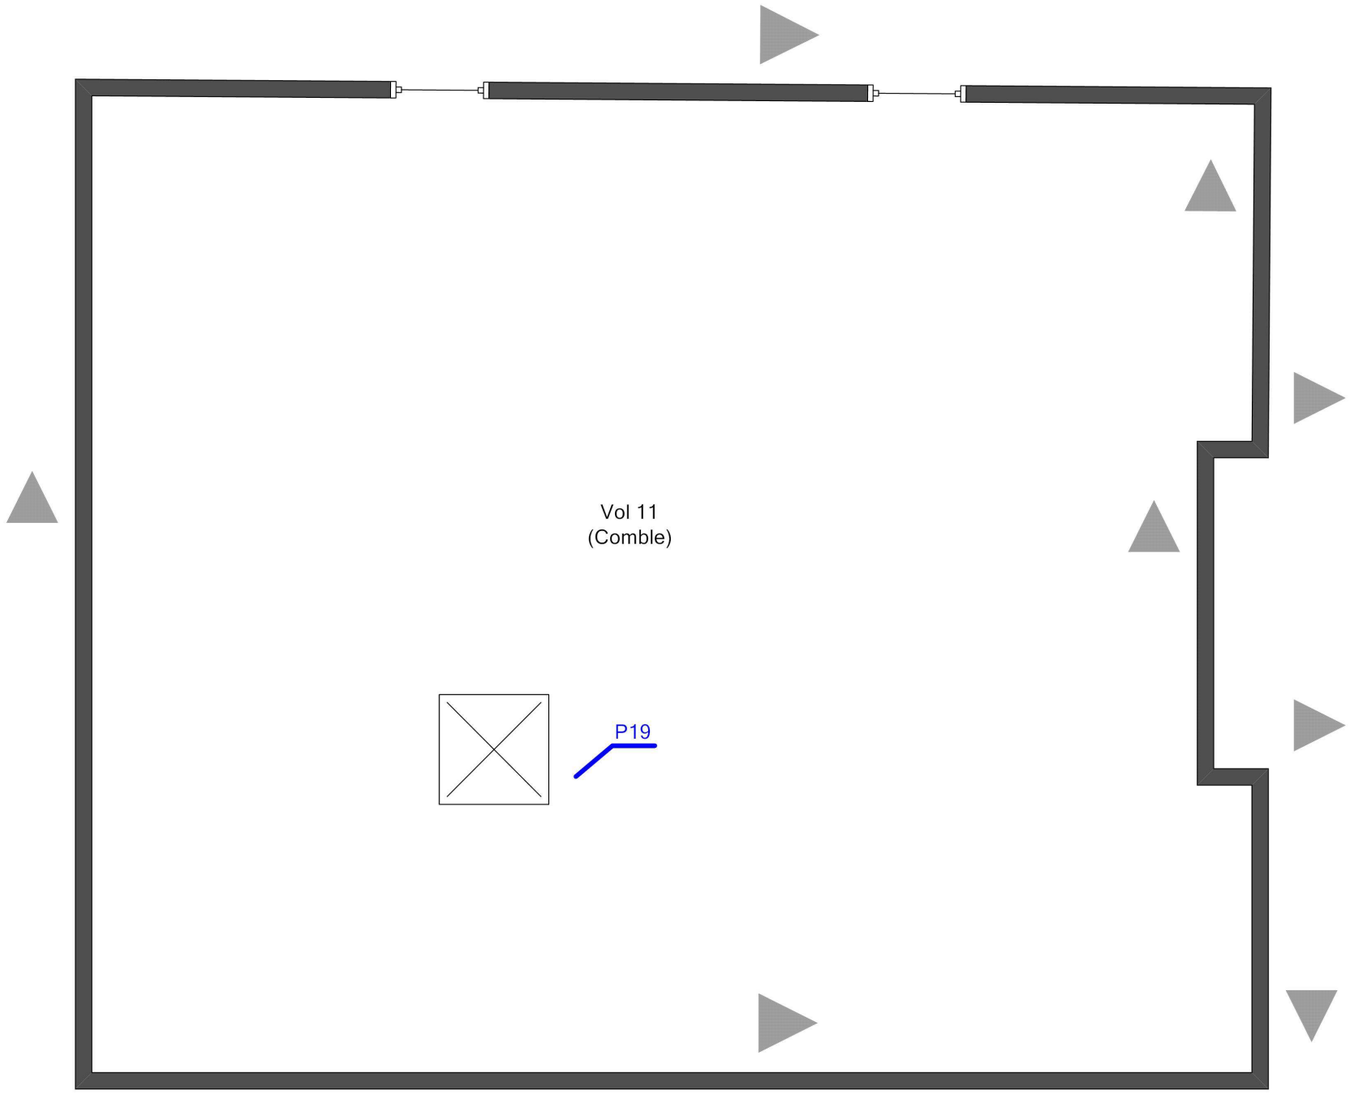

Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
26 GRANDE RUE - GRANDE RUE 53150 BREE	Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC	26/07/2016	GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000050 n°27 - 1 (P27)	cave - Vol 10 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000050 n°27 - 2 (P27)	cave - Vol 10 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000050 n°26 - 1 (P26)	cave - Vol 10 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000050 n°26 - 2 (P26)	cave - Vol 10 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000050 n°25 - 1 (P25)	cave - Vol 10 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000050 n°25 - 2 (P25)	cave - Vol 10 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000050 n°24 - 1 (P24)	cave - Vol 10 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000050 n°24 - 2 (P24)	cave - Vol 10 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000050 n°23 - 1 (P23)	cave - Vol 10 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000050 n°23 - 2 (P23)	cave - Vol 10 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000050 n°22 - 1 (P22)	cave - Vol 10 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000050 n°22 - 2 (P22)	cave - Vol 10 (Cave)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000050 n°19 - 1 (P19)	combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002OY000050 n°19 - 2 (P19)	combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000050 n°9 - 1 (P9)	r+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002OY000050 n°9 - 2 (P9)	r+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002OY000050 n°10 - 1 (P10)	r+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002OY000050 n°10 - 2 (P10)	r+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002OY000050 n°11 - 1 (P11)	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OY000050 n°11 - 2 (P11)	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OY000050 n°15 - 1 (P15)	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OY000050 n°15 - 2 (P15)	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OY000050 n°12 - 1 (P12)	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OY000050 n°12 - 2 (P12)	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OY000050 n°13 - 1 (P13)	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OY000050 n°13 - 2 (P13)	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OY000050 n°14 - 1 (P14)	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OY000050 n°14 - 2 (P14)	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000050 n°21 - 1 (P21)	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OY000050 n°21 - 2 (P21)	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OY000050 n°20 - 1 (P20)	r+1 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OY000050 n°20 - 2 (P20)	r+1 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OY000050 n°16 - 1 (P16)	r+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002OY000050 n°16 - 2 (P16)	r+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002OY000050 n°17 - 1 (P17)	r+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000050 n°17 - 2 (P17)	r+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000050 n°18 - 1 (P18)	r+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000050 n°18 - 2 (P18)	r+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
	r+1 - Vol 7 (Chambre 2)	I2
	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	I3

Référence	Localisation	Action
002OY000050 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000050 n°1 - 2 (P1)	RDC - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000050 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000050 n°2 - 2 (P2)	RDC - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000050 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000050 n°3 - 2 (P3)	RDC - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000050 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000050 n°4 - 2 (P4)	RDC - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000050 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000050 n°5 - 2 (P5)	RDC - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000050 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000050 n°6 - 2 (P6)	RDC - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000050 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000050 n°7 - 2 (P7)	RDC - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000050 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000050 n°8 - 2 (P8)	RDC - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000050 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002OY000050 n°28 - 2 (P28)	RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
	RDC - Vol 4 (Séjour)	I1

002OY000050 n°1 - 1 (P1)

002OY000050 n°1 - 2 (P1)

002OY000050 n°2 - 1 (P2)

002OY000050 n°2 - 2 (P2)

002OY000050 n°3 - 1 (P3)

002OY000050 n°3 - 2 (P3)

002OY000050 n°4 - 1 (P4)

002OY000050 n°4 - 2 (P4)

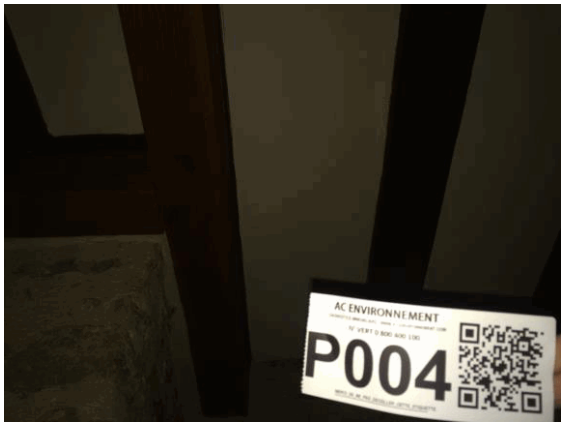

002OY000050 n°5 - 1 (P5)

002OY000050 n°5 - 2 (P5)

002OY000050 n°6 - 1 (P6)

002OY000050 n°6 - 2 (P6)

002OY000050 n°7 - 1 (P7)

002OY000050 n°7 - 2 (P7)

002OY000050 n°8 - 1 (P8)

002OY000050 n°8 - 2 (P8)

002OY000050 n°28 - 1 (P28)

002OY000050 n°28 - 2 (P28)

002OY000050 n°27 - 1 (P27)

002OY000050 n°27 - 2 (P27)

002OY000050 n°26 - 1 (P26)

002OY000050 n°26 - 2 (P26)

002OY000050 n°25 - 1 (P25)

002OY000050 n°25 - 2 (P25)

002OY000050 n°24 - 1 (P24)

002OY000050 n°24 - 2 (P24)

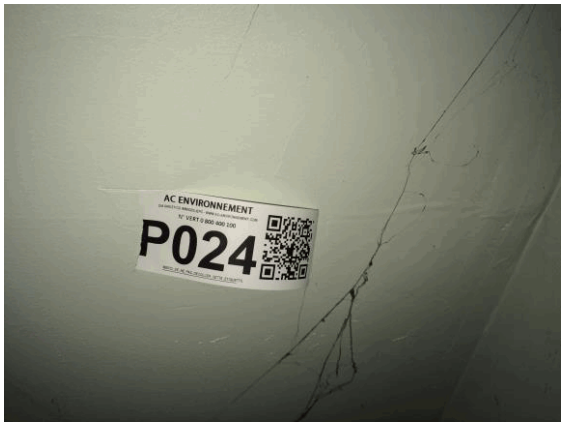

002OY000050 n°23 - 1 (P23)

002OY000050 n°23 - 2 (P23)

002OY000050 n°22 - 1 (P22)

002OY000050 n°22 - 2 (P22)

002OY000050 n°9 - 1 (P9)

002OY000050 n°9 - 2 (P9)

002OY000050 n°10 - 1 (P10)

002OY000050 n°10 - 2 (P10)

002OY000050 n°11 - 1 (P11)

002OY000050 n°11 - 2 (P11)

002OY000050 n°15 - 1 (P15)

002OY000050 n°15 - 2 (P15)

002OY000050 n°12 - 1 (P12)

002OY000050 n°12 - 2 (P12)

002OY000050 n°13 - 1 (P13)

002OY000050 n°13 - 2 (P13)

002OY000050 n°14 - 1 (P14)

002OY000050 n°14 - 2 (P14)

002OY000050 n°21 - 1 (P21)

002OY000050 n°21 - 2 (P21)

002OY000050 n°20 - 1 (P20)

002OY000050 n°20 - 2 (P20)

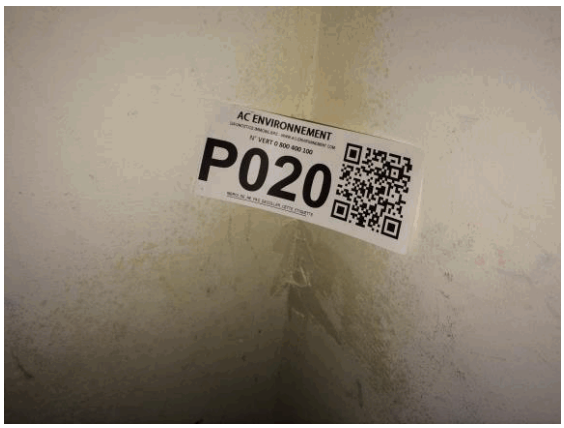

002OY000050 n°16 - 1 (P16)

002OY000050 n°16 - 2 (P16)

002OY000050 n°17 - 1 (P17)

002OY000050 n°17 - 2 (P17)

002OY000050 n°18 - 1 (P18)

002OY000050 n°18 - 2 (P18)

002OY000050 n°19 - 1 (P19)

002OY000050 n°19 - 2 (P19)

I1 - 1

I2 - 1

I3 - 1

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) - Enduit beige sur pierres -	RDC - Vol 4 (Séjour)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - gris entre briquettes rouge -	RDC - Vol 4 (Séjour)	
P3	Conduits, canalisations et équipements	Conduit de fumée	Matériau souple de type joint (orange) - joint mousse orange -	RDC - Vol 4 (Séjour)	
P4 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (beige) - platreux blancs -	RDC - Vol 4 (Séjour)	
P4 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose) - platreux blancs -	RDC - Vol 4 (Séjour)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) - dallettes avec imprimés blancs /rouges/jaunes/gris/vert -	RDC - Vol 4 (Séjour)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) - noire sous dalettes grises foncé -	RDC - Vol 4 (Séjour)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose) - beige faience 15*15 blanche -	RDC - Vol 1 (Cuisine)	
P8 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Plafond pièces humides -	RDC - Vol 1 (Cuisine)	
P8 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Plafond pièces humides -	RDC - Vol 1 (Cuisine)	

P9 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc) Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - carreaux 20*20 beiges -	r+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P9 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type ciment-colle (gris) - carreaux 20*20 beiges -	r+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P10 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (beige) - plinthes beiges 20*5 + colle beige -	r+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P10 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) - plinthes beiges 20*5 + colle beige -	r+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) - carreaux gris foncés 20*20 -	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	
P11 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) - carreaux gris foncés 20*20 -	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	
P12 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc) - plinthes grises foncées + colle beige -	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	
P12 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) - plinthes grises foncées + colle beige -	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	
P12 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de typeciment-colle (gris) - plinthes grises foncées + colle beige -	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (gris) - faience blanche 15*15 +colle beige -	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type plâtre (beige) + (blanc) - enduit entre briques de platre -	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	
P15	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Matériau souple (transparent) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) - noire -	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	

P16 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Plafond pièces sèches -	r+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P16 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Plafond pièces sèches -	r+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P16 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Plafond pièces sèches -	r+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - rose d'origine -	r+1 - Vol 6 (Chambre 1)	
P18 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) - linoléum gris clair d'origine + colle jaune -	r+1 - Vol 6 (Chambre 1)	
P18 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) - linoléum gris clair d'origine + colle jaune -	r+1 - Vol 6 (Chambre 1)	
P19 Phase 1	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) - laine de verres jaune -	combles - Vol 11 (Comble)	
P19 Phase 2	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) - laine de verres jaune -	combles - Vol 11 (Comble)	
P20 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Doublage pièces sèches -	r+1 - Vol 7 (Chambre 2)	
P20 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Doublage pièces sèches -	r+1 - Vol 7 (Chambre 2)	
P21 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Doublage pièces humides -	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	

P21 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc) - Doublage pièces humides -	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	
P21 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Doublage pièces humides -	r+1 - Vol 8 (SDB/WC)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - enduit ciment gris -	cave - Vol 10 (Cave)	
P23 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Doublage cage d'escalier -	cave - Vol 10 (Cave)	
P23 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Doublage cage d'escalier -	cave - Vol 10 (Cave)	
P24	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (poudreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (pulvérulent) (blanc) - plafond cage d'escalier de la cave -	cave - Vol 10 (Cave)	
P25 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) - gris/ beige friable -	cave - Vol 10 (Cave)	
P25 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) - gris/ beige friable -	cave - Vol 10 (Cave)	
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (marron) - beige entre les pièrre -	cave - Vol 10 (Cave)	
P27	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (beige) - grise/ beige -	cave - Vol 10 (Cave)	
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Porte de la cave	Matériau souple de type joint (noir) - d'étanchéité noir -	RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	

eurofins | Hygiène du Bâtiment

AC ENVIRONNEMENT
Ludovic GARDENAT
64 Rue Clément Ader
42153 RIORGES

Numéro de dossier : 16Y022440
Référence de dossier : N°COMMANDE : 0022OY00050
AFFAIRE : O.P.H MAYENNE HABITAT
SITE DE PRELEVEMENT : 26 GRANDE RUE - GRANDE - RUE 53150 BREE
DESIGNATION : APPARTENEMENT N°1 DE TYPE 3 SITUE AU RDC

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 16Y022440-001 - Référence *0020Y000050 n°1 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-002 - Référence *0020Y000050 n°2 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-003 - Référence *0020Y000050 n°3 Conduits, canalisations et équipements - Conduit de fumée - Joint entre éléments Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-004 - Référence *0020Y000050 n°4 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints plâtre entre panneau / poutres Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-005 - Référence *0020Y000050 n°5 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au Capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne 529 294 027 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

- N° 16Y022440-006 - Référence *0020Y000050 n°6 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-007 - Référence *0020Y000050 n°7 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 1*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-008 - Référence *0020Y000050 n°8 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques Volume n° 1*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-009 - Référence *0020Y000050 n°9 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage Volume n° 5*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-010 - Référence *0020Y000050 n°10 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) Volume n° 5*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-011 - Référence *0020Y000050 n°11 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage Volume n° 8*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-012 - Référence *0020Y000050 n°12 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) Volume n° 8*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-013 - Référence *0020Y000050 n°13 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 8*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-014 - Référence *0020Y000050 n°14 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre Volume n° 8*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-015 - Référence *0020Y000050 n°15 Equipements divers et accessoires - Baignoire - Tampon bitumineux Volume n° 8*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-016 - Référence *0020Y000050 n°16 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques Volume n° 5*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-017 - Référence *0020Y000050 n°17 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 6*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-018 - Référence *0020Y000050 n°18 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche Volume n° 6*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-019 - Référence *0020Y000050 n°19 Toiture et étanchéité - Elément sous toiture - Isolant sous toiture Volume n° 11*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-020 - Référence *0020Y000050 n°20 Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées -Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 7*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-021 - Référence *0020Y000050 n°21 Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées -Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 8*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-022 - Référence *0020Y000050 n°22 Revêtement de sol - Revêtement de sol - marche d'escalier Volume n° 10*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-023 - Référence *0020Y000050 n°23 Parois verticales Intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées -Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 10*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-024 - Référence *0020Y000050 n°24 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Jonctions faux-plafond / structure Volume n° 10*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-025 - Référence *0020Y000050 n°25 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre Volume n° 10*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-026 - Référence *0020Y000050 n°26 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 10*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-027 - Référence *0020Y000050 n°27 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit ciment Volume n° 10*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022440-028 - Référence *0020Y000050 n°28 Parois verticales intérieures et enduits - Porte de la cave - Joint Volume n° 3*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au Capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne 529 294 027 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

ACCREDITATION
N° AB 1609
Portée disponible sur
https://www.pca.gov.pl/

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001422-01 Version du : 05.08.2016 12:16
Dossier N° : 16RI001793 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022440 - N°COMMANDE : 0022OY00050AFFAIRE : O.P.H MAYENNE HABITATSITE DE PRELEVEMENT : 26 GRANDE RUE - GRANDE - RUE 53150 BREE DESIGNATION : APPARTENEMENT N °1 DE TYPE 3 SITUE AU RDC

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	16Y022440-001 - 0020Y000050 n°1 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 4	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	16Y022440-002 - 0020Y000050 n°2 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	16Y022440-003 - 0020Y000050 n°3 Conduits, canalisations et équipements - Conduit de fumée - Joint entre éléments Volume n° 4	Matériau souple de type joint (orange)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001422-01 Version du : 05.08.2016 12:16

Dossier N° : 16RI001793 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022440 - N°COMMANDE : 0022OY00050AFFAIRE : O.P.H MAYENNE HABITATSITE DE PRELEVEMENT : 26 GRANDE RUE - GRANDE - RUE 53150 BREE DESIGNATION : APPARTENEMENT N °1 DE TYPE 3 SITUE AU RDC

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
004	16Y022440-004 - 0020Y000050 n°4 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints plâtre entre panneau / poutres Volume n° 4	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	16Y022440-005 - 0020Y000050 n°5 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage Volume n° 4	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	16Y022440-006 - 0020Y000050 n°6 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage Volume n° 4	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	16Y022440-007 - 0020Y000050 n°7 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	16Y022440-008 - 0020Y000050 n°8 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques Volume n° 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
Tél: +48 797365102 - Fax: +48 797365102 - Site Web: www.eurofins.com

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001422-01 Version du : 05.08.2016 12:16 Page 3/9

Dossier N° : 16RI001793 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022440 - N°COMMANDE : 0022OY00050AFFAIRE : O.P.H MAYENNE HABITATSITE DE PRELEVEMENT : 26 GRANDE RUE - GRANDE - RUE 53150 BREE DESIGNATION : APPARTENEMENT N °1 DE TYPE 3 SITUE AU RDC

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	16Y022440-009 - 0020Y000050 n°9 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage Volume n° 5	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	16Y022440-010 - 0020Y000050 n°10 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) Volume n° 5	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (beige)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	16Y022440-011 - 0020Y000050 n°11 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage Volume n° 8	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001422-01 Version du : 05.08.2016 12:16 Page 4/9

Dossier N° : 16RI001793 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022440 - N°COMMANDE : 0022OY00050AFFAIRE : O.P.H MAYENNE HABITATSITE DE PRELEVEMENT : 26 GRANDE RUE - GRANDE - RUE 53150 BREE DESIGNATION : APPARTENEMENT N °1 DE TYPE 3 SITUE AU RDC

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
012	16Y022440-012 - 0020Y000050 n°12 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) Volume n° 8	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	16Y022440-013 - 0020Y000050 n°13 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 8	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	16Y022440-014 - 0020Y000050 n°14 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre Volume n° 8	Matériau semi-dur de type plâtre (beige) + (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	16Y022440-015 - 0020Y000050 n°15 Equipements divers et accessoires - Baignoire - Tampon bitumineux Volume n° 8	Matériau souple (transparent) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
Tél: +48 797365102 - Fax: +48 797365102 - Site Web: www.eurofins.com

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001422-01 Version du : 05.08.2016 12:16

Dossier N° : 16RI001793 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022440 - N°COMMANDE : 0022OY00050AFFAIRE : O.P.H MAYENNE HABITATSITE DE PRELEVEMENT : 26 GRANDE RUE - GRANDE - RUE 53150 BREE DESIGNATION : APPARTENEMENT N °1 DE TYPE 3 SITUE AU RDC

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
016	16Y022440-016 - 0020Y000050 n°16 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques Volume n° 5	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	16Y022440-017 - 0020Y000050 n°17 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 6	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	16Y022440-018 - 0020Y000050 n°18 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche Volume n° 6	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	16Y022440-019 - 0020Y000050 n°19 Toiture et étanchéité - Elément sous toiture - Isolant sous toiture Volume n° 11					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001422-01 Version du : 05.08.2016 12:16 Page 6/9

Dossier N° : 16RI001793 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022440 - N°COMMANDE : 0022OY00050AFFAIRE : O.P.H MAYENNE HABITATSITE DE PRELEVEMENT : 26 GRANDE RUE - GRANDE - RUE 53150 BREE DESIGNATION : APPARTENEMENT N °1 DE TYPE 3 SITUE AU RDC

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	16Y022440-020 - 0020Y000050 n°20 Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées -Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 7	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	16Y022440-021 - 0020Y000050 n°21 Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées -Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 8	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001422-01 Version du : 05.08.2016 12:16 Page 7/9

Dossier N° : 16RI001793 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022440 - N°COMMANDE : 0022OY00050AFFAIRE : O.P.H MAYENNE HABITATSITE DE PRELEVEMENT : 26 GRANDE RUE - GRANDE - RUE 53150 BREE DESIGNATION : APPARTENEMENT N °1 DE TYPE 3 SITUE AU RDC

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
022	16Y022440-022 - 0020Y000050 n°22 Revêtement de sol - Revêtement de sol - marche d''escalier Volume n° 10	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	16Y022440-023 - 0020Y000050 n°23 Parois verticales Intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées -Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 10	Matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	16Y022440-024 - 0020Y000050 n°24 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Jonctions faux-plafond / structure Volume n° 10	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (poudreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (pulvérulent) (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	16Y022440-025 - 0020Y000050 n°25 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre Volume n° 10	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001422-01 Version du : 05.08.2016 12:16

Dossier N° : 16RI001793 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022440 - N°COMMANDE : 0022OY00050AFFAIRE : O.P.H MAYENNE HABITATSITE DE PRELEVEMENT : 26 GRANDE RUE - GRANDE - RUE 53150 BREE DESIGNATION : APPARTENEMENT N °1 DE TYPE 3 SITUE AU RDC

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
026	16Y022440-026 - 0020Y000050 n°26 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 10	Matériau semi-dur de type enduit (marron)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	16Y022440-027 - 0020Y000050 n°27 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit ciment Volume n° 10	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	16Y022440-028 - 0020Y000050 n°28 Parois verticales intérieures et enduits - Porte de la cave - Joint Volume n° 3	Matériau souple de type joint (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (MET) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
Tél: +48 797365102 - Fax: +48 797365102 - Site Web: www.eurofins.com

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001422-01 Version du : 05.08.2016 12:16

Dossier N° : 16RI001793 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022440 - N°COMMANDE : 0022OY00050AFFAIRE : O.P.H MAYENNE HABITATSITE DE PRELEVEMENT : 26 GRANDE RUE - GRANDE - RUE 53150 BREE DESIGNATION : APPARTENEMENT N °1 DE TYPE 3 SITUE AU RDC

Validé et approuvé par :

Adrien Paliniewicz
Team Leader

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
Tél: +48 797365102 - Fax: +48 797365102 - Site Web: www.eurofins.com
